



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และคณะกรรมการพัฒนา ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามประเมินผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเสนอต่อสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอ ดู หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๓๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๒ หรือเปิดดูเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.kubua.go.th เมนู รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพจธนศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

คำนำ

การติดตามประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

สำหรับการติดตามและประเมินผลพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้มีการดำเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบร่วมด้วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินสามารถวัดผลความสำเร็จของโครงการและความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๖๓/๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา สภาท้องถิ่น ประชาชน รับทราบตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓/
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๑

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔	๑๒
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๖
๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๖๐
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)	
๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค	๖๑

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบค้ำประกันพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๖
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓/๓/
๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๔๐
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๔๒
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบค้ำประกันพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๔๕
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)	๔๘
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๔๙
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๙๑
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๙๓

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ต่อ)	
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม /สัมภาษณ์	๑๐๒
๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๑๐๕
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๑๑๐
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ	๑๑๑
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๑๑๓
๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑๔
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
๒.๑ ผลสรุปภาพรวม	๑๑๔
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	



ส่วนที่ ๑ บทนำ



ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง...

เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการกรรณการเล็กโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลคูบัว หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๖๓/๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑)สมาชิกสภา...

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ โครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ ขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลอง และปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

๓.๒.๓/ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว หรือ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตาม ความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุม รับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

ขั้นตอนการรายงานผล

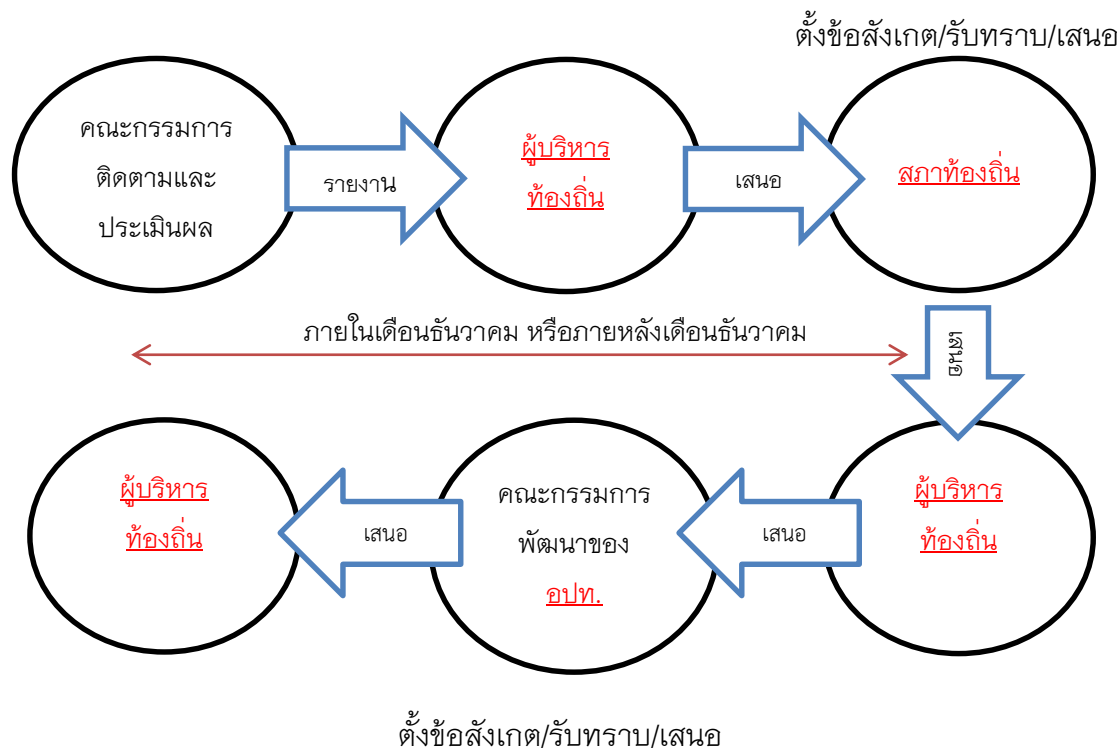

ประกาศ...

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลรับรู้ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควรใช้ ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบ สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควร กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของไตรมาส ที่ผ่านมาทุกครึ่ง ก่อนเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและ นำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีพึงพอใจเมื่อได้รับการให้บริการ



ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล



ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดราชบุรี แผนยุทธศาสตร์อำเภอเมืองราชบุรี และแผนชุมชนตำบลคูบัว

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลคูบัว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	พัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานทั้งปริมาณ และคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันและในอนาคต	กองช่าง สำนักงานปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการ จัดการด้านเศรษฐกิจ ประชาชน อยู่ดีมีสุข มีความรู้ และมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและ ยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างทั่วถึง และเศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนา อาชีพ ร่วมสามัคคี เกื้อกูล และ พึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกัน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักงานปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	ประชาชนได้รับการพัฒนาด้าน การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมี มาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา ท้องถิ่น การเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และประชาชนทุกส่วน ได้ร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น ให้โดดเด่นและ ยั่งยืน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔. ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิ ทัศน์ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ธรรมชาติในตำบล ได้รับการดูแล และพัฒนาทั่วถึง ประชาชนมีส่วน ร่วมในการบำรุงรักษา ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการป้องกัน เตรียมตัว และปรับตัว กับสภาวะการ เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศของโลก	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. ด้าน การพั ฒ นา การบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร	องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีสมรรถนะในด้านการเมือง และการปกครอง บุคลากรมีศักยภาพ การ ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ในการให้บริการประชาชน และ ประชาชนชนได้รับความพอใจและ ให้ความร่วมมือ พัฒนาท้องถิ่น อย่างสมัครใจ	สำนักงานปลัดฯ กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

ภารกิจหลัก

- (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
- (๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- (๕) การสาธารณสุข โภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๖) การสาธารณสุข โภค
- (๗) ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๘) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- (๙) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑๓) การสาธารณสุข...

- (๑๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
- (๑๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๑๕) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- (๑๖) การผังเมือง
- (๑๗) จัดให้มีที่จอดรถ
- (๑๘) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๙) การควบคุมอาคาร
- (๒๐) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- (๒๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

ภารกิจรอง

- (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
- (๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๔) ให้มีตลาด
- (๕) การท่องเที่ยว
- (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
- (๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน
- (๙) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๐) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- (๑๑) การจัดการศึกษา
- (๑๒) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- (๑๓) สนับสนุนสภาตำบลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม ความจำเป็นและสมควร
- (๑๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน
- (๑๖) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๑๗) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างขององค์การปกครอง-ส่วนท้องถิ่นอื่น

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- (๑) การดำเนินการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน
- (๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้มีความปลอดภัย มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้
- (๓) การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ทุกหมู่บ้าน มีจำนวน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง เพิ่มขึ้น และรองรับการใช้งาน
ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ในปัจจุบัน และในอนาคต
- (๔) การพัฒนาทางการศึกษา ทุกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
มีมาตรฐาน การศึกษา ในท้องถิ่นที่มีความทันสมัยเด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วถึง ประชาชนทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนา ปลูกฝัง จิตใจให้ประพฤติดีมีคุณธรรม และศีลธรรม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้สืบทอดและดำรงไว้ทั้ง
ในโรงเรียนและหมู่บ้าน ได้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
ในประชาชน กลุ่มต่าง ๆ
- (๕) การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ การดูแลปรับปรุงพัฒนา
พื้นที่ตามประเภทของ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อการอนุรักษ์ระบบ
สิ่งแวดล้อม คุณภาพของธรรมชาติในพื้นที่ให้สามารถเอื้ออำนวยต่อการ
ดำเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน สามารถเป็นฐานในการ รักษาระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความผาสุกได้ อย่างสมดุลและยั่งยืน
- (๖) หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการ บริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการ
ประชาชนการบริหาร จัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนประชาชนทุกหมู่บ้าน
มี ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มากที่สุด

๔)..แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น.....

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่
- (๓) ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
- (๔) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
- (๕) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP
- (๖) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ
- (๗) ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน
- (๘) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- (๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมด้านการแสดงออกด้าน ความคิด และมีนิสัยรักในการเรียน
- (๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรม นำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน
- (๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ
- (๑๒) ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนสถาบันครอบครัว
- (๑๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนโดยทั่วไป
- (๑๕) ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
- (๑๖) ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- (๑๗) ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬากายภาพกิจกรรมนันทนาการ
- (๑๘) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- (๑๙) ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

- (๒๐) พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
- (๒๑) พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- (๒๒) พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
- (๒๓) ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน
- (๒๔) พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
- (๒๕) ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
- (๒๖) จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
- (๒๗) ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและระบบประปา
- (๒๘) จัดทำผังเมืองและผังตำบล
- (๒๙) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- (๓๐) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๓๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน/หมู่บ้าน
- (๓๒) จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๓๓) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- (๓๔) ส่งเสริม ให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

๕) วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

๑.๒ โครงการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประเมินผลโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) กับ โครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)					รวมจำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (โครงการ)
	ประจำปี ๒๕๖๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓๖	๔	๔	๑๕	๐	๕๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๔๓	๑	๖	๑	๐	๕๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๓๑	๒	๒	๐	๐	๓๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๐	๐	๔	๐	๒๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๑๘	๐	๑	๔	๐	๒๓
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๒๐	๐	๓	๔	๔	๓๑
รวม	๑๖๖	๗	๑๖	๒๘	๔	๒๒๑

ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) กับงบประมาณตามแผนดำเนินการที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ					
	ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)					
	ประจำปี ๒๕๖๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔	รวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๒๔,๗๘๒,๖๐๐	๑๔,๔๒๘,๓๒๓	๓,๘๖๖,๑๐๐	๒๒,๑๔๑,๕๓/๓	๐	๖๕,๒๑๘,๖๐๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และ สังคม	๑๙,๔๙๑,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๓๗๑,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๕,๙๘๓,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๐	๗,๖๔๘,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗,๑๔๘,๓๐๐	๐	๐	๒๓๒,๐๐๐	๐	๗,๓๘๐,๓๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และ การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๒,๗๓๒,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	๐	๓,๗๔๒,๐๐๐
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๒,๗๒๔,๖๐๐	๐	๑,๒๒๕,๐๐๐	๒๓๐,๖๐๐	๒๖๖,๓๐๐	๔,๔๔๖,๕๐๐
รวม	๖๒,๘๖๑,๕๐๐	๑๖,๓๒๘,๓๒๓	๕,๖๐๖,๑๐๐	๒๓,๓๗๔,๑๓/๓	๒๖๖,๓๐๐	๑๐๘,๘๖๖,๕๐๔

ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒			รวมจำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการ)	รวมจำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
	แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒	แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จ. ๑	แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จ. ๒			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑๘	๑๖	๘	๔๒	๕๙	๓๑.๑๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๒๓	๑	๐	๒๔	๕๑	๔๓.๐๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๒๓	๐	๐	๒๓	๓๕	๖๕.๓๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓/	๐	๐	๓/	๒๒	๓๑.๘๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๑๒	๐	๑	๑๓	๒๓	๕๖.๕๒
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๓	๐	๖	๙	๓๑	๒๙.๐๓
รวม	๘๖	๑๗	๑๕	๑๑๘	๒๒๑	๕๓.๓๙

ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) กับงบประมาณตามแผนดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒			จำนวนงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
	แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒	แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ณ. ๑	แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ณ. ๒			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑๓,๘๘๕,๘๐๐	๓,๑๐๓,๐๐๐	๑,๙๓๕,๘๕๖.๘๙	๑๘,๙๒๔,๖๕๖.๘๙	๖๕,๒๑๘,๖๐๔	๒๙.๐๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๑๙,๘๘๑,๒๔๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๙,๙๑๑,๒๔๐	๒๐,๓๓๑,๐๐๐	๙๙.๙๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๕,๙๑๙,๐๔๐	๐	๐	๕,๙๑๙,๐๔๐	๓,๖๔๘,๐๐๐	๖๔.๓๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๔๓/๕,๐๐๐	๐	๐	๑,๔๓/๕,๐๐๐	๓,๓๘๐,๓๐๐	๑๙.๙๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๒,๕๘๔,๘๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๒,๗๓๔,๘๐๐	๓,๓/๔๒,๐๐๐	๙๓.๐๘
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๒๔,๓๐๐	๐	๑,๓๓/๓,๑๙๙.๑๐	๑,๔๐๑,๔๙๙.๑๐	๔,๔๔๖,๕๐๐	๓๑.๕๒
รวม	๔๒,๓/๓/๐,๑๘๐	๓,๑๓๓,๐๐๐	๓,๔๖๓,๐๕๕.๙๙	๔๙,๓๖๖,๒๓๕.๙๙	๑๐๘,๘๐๖,๔๐๔	๔๕.๓๓

สรุปสถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยกเลิกดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๒๖	๖๑.๙๑	๘	๑๙.๐๕	๔	๙.๕๒	๔	๙.๕๒	๔๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๑	๘๓.๕๐	๐	๐	๒	๘.๓๓	๑	๔.๑๓	๒๔	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๒๓	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๓	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓/๑.๔๓	๐	๐	๒	๒๘.๕๗	๐	๐	๓	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๑๐	๓๖.๙๒	๒	๑๕.๓๘	๑	๓.๖๙	๐	๐	๑๓	๑๐๐
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๕	๕๕.๕๖	๓	๓๓.๓๓	๑	๑๑.๑๑	๐	๐	๙	๑๐๐
รวม	๙๐	๓๖.๒๓	๑๓	๑๑.๐๒	๑๐	๘.๔๓	๕	๔.๒๔	๑๑๘	๑๐๐

สรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ %
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๖๕,๒๑๘,๖๐๔	๑๘,๙๒๔,๖๕๖.๘๙	๑๐,๙๓๖,๕๙๒.๔๔	๕๓.๓/๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๒๐,๓๓๑,๐๐๐	๑๙,๙๑๑,๒๔๐	๑๘,๒๔๓,๑๘๔.๙๔	๙๑.๖๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๓,๖๔๘,๐๐๐	๔,๙๑๙,๐๔๐	๔,๖๐๔,๙๕๓.๔๕	๙๓.๖๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓,๓๘๐,๓๐๐	๑,๔๓๕,๐๐๐	๑,๑๐๑,๔๔๑.๒๕	๓๒.๖๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๓,๓๔๒,๐๐๐	๒,๓๓๔,๘๐๐	๑,๐๐๔,๕๕๙.๕๒	๓๖.๓/๓
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๔,๔๔๖,๕๐๐	๑,๔๐๑,๔๙๙.๑๐	๒๒๒,๕๐๐	๑๕.๘๓
รวม	๑๐๘,๘๐๖,๔๐๔	๔๙,๓๖๖,๒๓๕.๙๙	๓๖,๑๑๓,๒๓๕.๖๐	๓/๓.๑๕

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. โครงการเกินศักยภาพ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

(๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ๘ ขวา แม่กลอง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปรับแผนปี งบประมาณ ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) อบจ. ราชบุรี (อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแผนของ อบจ.ราชบุรี เพื่อดำเนินการในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ***ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๒) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากห้วย ถึง หมู่ที่ ๑๕ บ้านไร่โรงเจ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีงบประมาณ ๔,๖๐๓,๐๐๐ บาท (ปรับแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) อบจ. ราชบุรี***ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(๓) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑,๑๕๑,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) อบจ. ราชบุรี ***ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๔) ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านปากห้วย – บ้านท่าช้าง บ้านโพธิ์ ไปทางตำบลอ่างทอง (หมู่ที่ ๙,๑๐,๑๑ ตำบลคูบัว (ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement – In Place Recycling) งบประมาณ ๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อยู่ในแผนดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของ อบต.คูบัว) ***ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(๕) ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ไปทางตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลคูบัว (ASPHALT CONCRETE .โดยวิธี Pavement – In Place Recycling) งบประมาณ ๕,๓๔๔,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อยู่ในแผนดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของ อบต.คูบัว) ***ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒. เป็นโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒)

จำนวน ๑๒ โครงการ ได้แก่

๒.๑ เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

(จากข้อบัญญัติ ๒๕๖๑) จำนวน ๑ โครงการ

แล้วเสร็จ ๑ โครงการ ยกเลิก - โครงการ

อยู่ระหว่างก่อกำหนดผู้กักพื้นที่ - โครงการ

๒.๒ เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

จำนวน ๑๑ โครงการ

แล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ ยกเลิก - โครงการ

อยู่ระหว่างก่อกำหนดผู้กักพื้นที่ - โครงการ

๓. เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จำนวน ๑๑๔ โครงการ ได้แก่

๓.๑ เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

(จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๒) จำนวน ๘๖ โครงการ

โครงการ (งบ อบต. ๘๔ โครงการ /งบอุดหนุน ๒ โครงการ)

แล้วเสร็จ ๗๔ โครงการ / ยกเลิก ๔ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ

๓.๒. เป็นโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๓ โครงการ

แล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ / ยกเลิก ๑ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ

๓.๓. โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๕ โครงการ

แล้วเสร็จ ๔ โครงการ / ยกเลิก ๐ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ

ข้อมูลตามแผนการดำเนินงาน ณ วันที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒)

๔. สรุป โครงการที่อนุมัติอยู่ในแผนดำเนินการ

๔. สรุป โครงการที่อนุมัติอยู่ในแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑๒ โครงการ

(๑) โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๑๒ โครงการ

๕. สรุป โครงการที่อนุมัติอยู่ในแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๑๑๘ โครงการ

(๑) โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๙๐ โครงการ

(๒) โครงการที่อยู่ระหว่างก่อกำหนดผู้กักกัน ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวน ๑๓ โครงการ

(๓) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

จำนวน ๑๐ โครงการ

(๔) โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ

จำนวน ๕ โครงการ

๖. สรุป โครงการเกินศักยภาพ จำนวน ๕ โครงการ

(๑) โครงการเกินศักยภาพยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

(๒) โครงการเกินศักยภาพดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ โครงการ

(อยู่ในแผนการดำเนินงานของ อบต. คูบัว ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ)

ในรอบติดตามประเมินผล เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย.๖๒) จำนวน
โครงการทั้งสิ้น ๑๓๓ โครงการ ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณ ๓๖.๒๓% ของ
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

การเบิกจ่ายงบประมาณ...

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โครงการที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๙๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. – มี.ย.๖๑	๒๐ ธ.ค.๖๑ – ๑๘ เม.ย.๖๒ ใช้ไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑ แผนดำเนินการ ปี ๒๕๖๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๐๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการเจาะวางท่อประปาที่ลอดถนน ๓๓๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	๙ มี.ค.๖๒ - ๑๑ เม.ย.๖๒ ใช้ไป ๖๐,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ. ๑
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	๒๑ พ.ย.๖๑ - ๔ ม.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ. ๑
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (จากคลองระบายน้ำทิ้งไปทางศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน)	๒๔๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	๒๖ ธ.ค.๖๑ - ๘ ก.พ.๖๒ ใช้ไป ๒๔๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ. ๑
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (จากจุดสิ้นสุดเดิมถึงสามแยกบ้านนายสุกฤษฎ)	๓๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑ (ขอเลื่อนแผน)	๑ พ.ค.๖๒ - ๓๐ พ.ค.๖๒ ใช้ไป ๓๖,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ. ๑
๕	โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ชอย ๓)	๑๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	๑๕ ธ.ค. ๖๑ - ๑๓ ม.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๓,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ. ๑
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๕๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	๒๐ ธ.ค.๖๑ - ๒ ก.พ.๖๒ ใช้ไป ๒๕๖,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ. ๑
๓/	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	๑ ธ.ค.๖๑ - ๑๔ ม.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ. ๑
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (จากบ้านนางจำปา ทองอยู่ ไปถึงทาง บ้านนางสวาท องค์เชษฐ)	๓๙๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	๒๑ พ.ย.๖๑ - ๒๐ ธ.ค.๖๑ ใช้ไป ๓๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ. ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๔๐๘,๐๐๐		ใช้ไป ๑,๔๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท	

ครุภัณฑ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. – ธ.ค.๖๑	ตามแผนฯ ใช้ไป ๙๑,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๑๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ฉ. ๑
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๑๓,๐๐๐	ต.ค. – ธ.ค.๖๑	ตามแผนฯ ใช้ไป ๑๖,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ฉ. ๑
๓	ซ่อมบำรุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๓/๓/๕๖ ราชบุรี	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. – ธ.ค.๖๑	ตามแบบฯ ใช้ไป ๒๒๒,๒๓๙ บาท คงเหลือ ๒๗,๗๖๑ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ฉ. ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๖๓,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๓๓๐,๙๓๙ บาท คงเหลือ ๓๒,๐๖๑ บาท	

*หมายเหตุ โครงการจำนวน ๑๒ โครงการ เป็นโครงการที่ต่างจากการติดตามในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน...๑๑๔...โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ...๔๙,๓๖๖,๒๓๕.๙๙ บาท งบประมาณได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว.....๓๖,๑๑๓,๒๓๕.....บาท โดยได้มีการก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดท้าวสดชื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒	พ.ย.๖๑ – ก.ย.๖๒ ใช้ไป ๑๖๑,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๓๘,๓๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (สายเลียบบคันคลองชลประทานทางบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านไร่)	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๑ – ก.พ.๖๒	๓๐ มี.ค.๖๒ – ๑๓ พ.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๖๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ก่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีเริ่มจากคลองน้ำทิ้งเลียบบถนนสาย ๓๓๓๔ เข้ามาถึงศาลาเอนกประสงค์ ในหมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.๖๒	๓ มี.ย. ๖๒ – ๖ ส.ค. ๖๒ ใช้ไป ๒๔๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณสายเลียบบคลองชลประทาน จากศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ไปทางศาลาปูหมื่น	๑๑๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.๖๒	(ยกเลิก) คงเหลือ ๑๑๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณจากบ้านผู้พันสมวงศ์ พิบูลแถว ไปทางคลองราชินี	๒๒๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๒	๘ มิ.ย. – ๒๒ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๒๐,๐๐๐ บาท	(กันเงินรายได้กรณีก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณถ่ายโอนฯ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณบ้านนางจ๋า สวัสดิ์ดีไปทางบ้านนางประภา ศรีนวล	๒๒๕,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค.๖๒	๑๘ พ.ค.๖๒ – ๑ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๒๕,๐๐๐ บาท	(กันเงินรายได้ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณถ่ายโอนฯ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓/	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จากบ้านนายถวิล แสงใส ถึงบ้านนางสุชาลี สุขเกษม	๙๓,๖๐๐	เม.ย. – มิ.ย.๖๒	๓๐ เม.ย.๖๒ – ๓๐ พ.ค.๖๒ ใช้ไป ๙๓,๖๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณบ้านนางบังอร ทับประเสริฐ	๓๑,๒๐๐	เม.ย. – มิ.ย.๖๒	๑ พ.ค.๖๒ – ๓๐ พ.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๒,๒๓๓.๐๕ บาท คงเหลือ ๘,๙๖๗.๙๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๙	โครงการก่อสร้างปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟ และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณจากริมคลองชลประทานข้างวงเวียนไปทางบ้าน นางอุไร บัวไสว	๒๒๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.๖๒	๑๕ ธ.ค. ๖๑ – ๑๓ ม.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๒๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่สองฟากถนนถึงบ้านนายเพลินศรีจันทร์เพื่อ (ริมถนนสาย ๓๓๓๙ ไปลงคลองระบายน้ำ ร.๑ ขวา คูบัว)	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย.๖๒	(ยกเลิก) คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสาธารณะ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จากบ้านนางเจียน วงกลม ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนามพุดดอ	๙๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๒	(ยกเลิก) คงเหลือ ๙๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณจุดเริ่มต้น บ้านนายสวิง ไปทางบ้านนางกลม ฝอยทอง	๒๒๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๒	๑๓/ พ.ค.๖๒ – ๑ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๒๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม ภายในหมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณ บ้านทุ่งนา ไปทางบ้านนายมนตรี	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๒	๓๐ มี.ค.๖๒ – ๒๔ เม.ย.๖๒ ใช้ไป ๑๘๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณจุดสิ้นสุด เดิมไปทางประปา	๒๕๔,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค.๖๒	๓๐ มี.ค.๖๒ – ๒๔ เม.ย.๖๒ ใช้ไป ๒๔๖,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑,๕๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑๕	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านปากห้วย – บ้านท่าช้าง บ้านโพธิ์ ไปทางตำบลอ่างทอง (หมู่ที่ ๙,๑๐,๑๑ ตำบลคูบัว (ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement – In Place Recycling)	๕,๖๙๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๒	๒๕ เม.ย. – ๒๓ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๖	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ไปทางตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลคูบัว (ASPHALT CONCRETE .โดยวิธี Pavement – In Place Recycling)	๕,๓๘๘,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๒	๒๕ เม.ย. – ๒๓ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๓,๘๓๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๗	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ฝาท่อระบายน้ำ ฝาทะแกรงเหล็ก วางระบายน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	๒๘ สค.-๒๓ ก.ย.๖๒ ใช้ไป ๘๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๓,๑๗๘,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๙,๕๒๒,๐๓๘.๐๕ บาท คงเหลือ ๓,๖๕๖,๙๖๑.๙๕ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๔๓,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๒๐ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๔๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๔๖,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๑๓ ส.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๔๖,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๕๙,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๑๓ ส.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๕๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๖๓,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินงาน คงเหลือ ๒๖๓,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๕	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๔๖๔,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินงาน คงเหลือ ๔๖๔,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๖๑,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	(ยกเลิก) คงเหลือ ๒๖๑,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๗	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑๒๘,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๒๐ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๒๘,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๙๕,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินงาน คงเหลือ ๒๙๕,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๙	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑๒๘,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๒๒ ส.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๒๘,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง ราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑๓๓,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๒๐ ก.ย.๖๒ ใช้ไป ๑๓๓,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๑๑	โครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๕๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๑๙ ก.ย. ๖๒ ใช้ไป ๕๐,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๑๒	โครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี	๓๒,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๘ ส.ค.๖๒ ใช้ไป ๓๒,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑๓๔,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๒๐ ก.ย. ๖๒ ใช้ไป ๑๓๔,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑
๑๔	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๒๙๙,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ คงเหลือ ๒๙๙,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น. ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๓๘,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๒๐ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๓๘,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉ. ๑
๑๖	โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๓๘,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	๒๑ ส.ค.๖๒ ใช้ไป ๓๘,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉ. ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓,๑๐๓,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๑,๕๐๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๕๙๔,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบำบัดน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ทางแยกบ้านป่าเงิน วงพรม ผ่านบ้านนายอรุณ ไข่มุกข์ ไปสิ้นสุดบ้าน นางมณี วงษ์วิจิตรต์ เชื่อมต่อ ท่อระบายน้ำเดิม ในซอยและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๘,๐๐๐	ก.ย.๖๒	ต.ค. – ธ.ค.๖๒ คงเหลือ ๓๐๘,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม (ก้นเงิน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉ. ๒
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลองชลประทานสาธารณะ บริเวณหัวนา นางวรรณา กำลังหาญ หมู่ที่ ๒	๒๔๕,๐๐๐	ก.ย.๖๒	ต.ค. – ธ.ค.๖๒ คงเหลือ ๒๔๕,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม (ก้นเงิน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉ. ๒
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนางจำ สวัสดิ์ ไปทางบ้านคุณประภา ศรีนวล หมู่ที่ ๙	๓๔๕,๐๐๐	ก.ย.๖๒	ต.ค. – ธ.ค.๖๒ คงเหลือ ๓๔๕,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม (ก้นเงิน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉ. ๒
๔	โครงการก่อสร้าง วางท่อ คสล.พร้อมบ่อบำบัดน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บริเวณบ้านนางสาวอรุณี หีบทอง ถึงบ้าน นายสงค์ ศิลภมร	๓๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๒	ต.ค. – ธ.ค. ๖๒ คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	จ่ายขาดเงินสะสม (ก้นเงิน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉ. ๒
๕	โครงการขยายท่อเมนประปา ต่อจากหมู่ที่ ๔ ไปหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖	๒๓๓,๐๐๐	ก.ย.๖๒	ต.ค. – ธ.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๓๓,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (ก้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉ. ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสาย รบ ๔๑๒๔ สะพานหมู่ที่ ๙ ไปทางรางรถไฟ หมู่ที่ ๒	๙๕,๐๐๐	ก.ย.๖๒	๔ ก.ย.๖๒ ใช้ไป ๙๕,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ณ. ๒
๓/	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บริเวณจากบ้านนายสมาน ค้ากองแก้ว และหลังบ้าน ส.อบต.สุทิน เทียนวงศ์	๕๙,๘๕๖.๘๙	ก.ย.๖๒	พ.ค. – ก.ย.๖๒ ใช้ไป ๕๙,๘๕๖.๘๙ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ณ. ๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๕๔๕,๘๕๖.๘๙ บาท		ใช้ไป ๓๘๓,๘๕๖.๘๙ บาท คงเหลือ ๑,๑๖๒,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียง เสียงไร้สายอัตโนมัติ (ลูกย้อย) ภายในตำบลคูบัว (หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๔,๑๕ รวม ๖ ชุด)	๓๕๐,๐๐๐	ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๓๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กันเงินรายการกรณีก่อหนี้ผูกพัน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ณ. ๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๕๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๓๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการบำรุงรักษา/หรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ของกิจการประปา อบต.คูบัว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย.๖๒	ตค. – ก.ย. ๖๒ ใช้ไป ๑๙๕,๖๖๓.๕๐ บาท คงเหลือ ๔,๓๓๖.๕๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๐๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๑๙๕,๖๖๓.๕๐ บาท คงเหลือ ๔,๓๓๖.๕๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. – มิ.ย. ๖๒ (ปรับแผน ก.ค. – ส.ค.๖๒)	๒๓ ก.ค. ๖๒ ใช้ไป ๒๔,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๑๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส พิการ ผู้ยากไร้ ในตำบลคูบัว (หลังละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/หลัง)	๙๐,๐๐๐	มี.ค. – ส.ค. ๖๒ (ปรับแผน ม.ค. – ส.ค.๖๒)	ใช้ไป ๑๗,๗๕๔.๗๔ บาท คงเหลือ ๗๒,๒๔๕.๒๖ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๒๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๔๒,๖๕๔.๗๔ บาท คงเหลือ ๗๗,๓๔๕.๒๖ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๒ (ปรับแผนเป็น มิ.ย. – ก.ค.๖๒)	๖ ธ.ค.๖๑ (อบรม) ๓- ๔ ก.ค.๖๒ (ดูงาน) ใช้ไป ๑๔๒,๘๑๓ บาท คงเหลือ ๓,๑๘๓ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ตำบลคูบัว	๔๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๒	๒๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๒ ใช้ไป ๔๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค.๖๒ (ปรับแผนเป็น มิ.ย. – ก.ค. ๖๒)	๒๙/ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๒ (ปรับแผนเป็น ก.พ. – เม.ย.๖๒)	๑ – ๒ เม.ย.๖๒ ใช้ไป ๒๘๔,๙๔๕ บาท คงเหลือ ๑๕,๐๕๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๒ (ปรับแผนเป็น ส.ค.๖๒)	๑๙ ส.ค. ๖๒ ใช้ไป ๒๘,๙๓๒ บาท คงเหลือ ๑,๐๖๘ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๒	๒๖ มี.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๘,๖๒๐ บาทคงเหลือ ๑,๓๘๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๕๘๐,๐๐๐		ใช้ไป ๕๕๔,๓๒๔ บาท คงเหลือ ๒๕,๖๗๖ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ในเขตตำบลคูบัว	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ และ เม.ย.๖๒	ใช้ไป ๒๖,๙๒๐ บาท คงเหลือ ๒๓,๐๘๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๒	ใช้ไป ๘,๓๓๒ บาท คงเหลือ ๒๑,๖๖๘ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการบำรุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ งานป้องกันฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๒๓,๗๓๐ บาท คงเหลือ ๖,๒๗๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๑๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๕๘,๙๘๒ บาท คงเหลือ ๕๑,๐๑๘ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๒	๑ ส.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๓,๑๓/๕ บาท คงเหลือ ๖,๘๖๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อคุณภาพเพื่อการบริโภค	๓๐,๐๐๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๒	****ไม่ได้ดำเนินการอุดหนุน (ยกเลิก) คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๖๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๒๓,๑๓/๕ บาท คงเหลือ ๓๖,๘๖๕ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรประเภทข้าว	๓๐,๐๐๐	ก.ย.๖๒	๓-๔ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๑,๒๕๒ บาท คงเหลือ ๘,๗๔๘ บาท	ตั้งจ่ายรายใหม่ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ณ. ๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๒๑,๒๕๒ บาท คงเหลือ ๘,๗๔๘ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๑๑๔,๔๖๔ บาท คงเหลือ ๑๘๕,๕๓๖ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๑๓,๕๖๑,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๔๓๘,๒๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ	๓,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๓,๐๖๕,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๒๓๔,๔๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๘๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๕	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูบัว (ประจำปี ๒๕๖๒)	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค. – ก.ย. ๖๒	***ไม่ได้เบิกจ่ายคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๖	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๑	ใช้ไป ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๘,๐๔๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๑๓,๐๓๕,๘๖๔ บาท คงเหลือ ๙๖๔,๑๓๖ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ / ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาด ต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย)	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๕๔,๐๐๓.๒๐ บาท คงเหลือ ๕,๙๙๖.๘๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๕๑,๒๔๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	***ไม่ได้ดำเนินงาน คงเหลือ ๑๕๑,๒๔๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้าน สาธารณสุข ตำบลคูบัว	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๒ (ปรับแผน เม.ย. – มิ.ย.๖๒)	๓, ๓- ๘ พ.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๔๐,๐๓๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๙๗๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๔	โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. คูบัว	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๒๓๒,๘๕๖ บาท คงเหลือ ๑๔๗,๑๔๔ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๙๙๑,๒๔๐.-		ใช้ไป ๔๖๖,๙๓๓.๒๐ บาท คงเหลือ ๕๒๔,๓๐๖.๘๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน สื่อการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว	๙๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๑ – มี.ค.๖๒ และ พ.ค. – ก.ย.๖๒	ระยะเวลาตามแผนฯ ใช้ไป ๙๕๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๒	๗ มี.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๘,๔๑๕ บาท คงเหลือ ๒๑,๕๘๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว	๑๕,๐๐๐	มี.ค.๖๒	๒๗ มี.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๒,๖๘๒ บาท คงเหลือ ๒,๓๑๘ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๔	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย เรียนของ อบต.คูบัว สำหรับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล – ป. ๖ โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	๑,๐๒๑,๓๔๐	พ.ย. ๖๑ – มี.ค. ๖๒ และ พ.ค. – ก.ย. ๖๒	ยอด ณ ก.ค. ๖๒ ใช้ไป ๙๕๔,๔๓๓.๕๐ บาท คงเหลือ ๖๖,๙๐๖.๕๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	๑,๖๕๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๑ – มี.ค. ๖๒ และ พ.ค. – ก.ย. ๖๒	ระยะเวลาตามแผนฯ ใช้ไป ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๒,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	๘๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๒	ใช้ไป ๘๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	๔๐,๐๐๐	ก.พ.๖๒	ใช้ไป ๔๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๘	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา	๒๐,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๒๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๑ – มี.ค. ๖๒ และ พ.ค. – ก.ย. ๖๒	ใช้ไป ๑๐๗,๗๖๐ บาท คงเหลือ ๑๒,๒๔๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย	๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๒	๒๕ ส.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๓,๕๕๙ บาท คงเหลือ ๒๖,๔๔๑ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๓๐,๗๐๐	ธ.ค. ๖๑ – ก.พ.๖๒	ระยะเวลาตามแผนฯ ใช้ไป ๓๐,๗๐๐ บาท	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมฯ) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔,๐๒๙,๐๔๐ บาท		ใช้ไป ๓,๘๔๗,๕๔๙.๕๐ บาท คงเหลือ ๑๘๑,๔๙๐.๕๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๒	๑๖ ม.ค.๖๒ ใช้ไป ๘๒,๕๕๕ บาท คงเหลือ ๑๗,๔๔๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว “คูบัวเกมส์” (ให้ห้างโกสยาเสพติด)	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๑	๑๙ – ๒๓/ ธ.ค. ๖๑ ใช้ไป ๙๕,๘๙๒ บาท คงเหลือ ๔,๑๐๘ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านกีฬาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย.๖๒	๑๗ ก.พ.-๑๐ มี.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๑๒,๐๗๐ บาท คงเหลือ ๗,๙๓๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๒	๑๕ เม.ย.๖๒ ใช้ไป ๙๙,๕๕๑ บาท คงเหลือ ๒๐,๔๔๙ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๕	โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๒	๘ – ๑๕ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๐,๖๓๙ บาท คงเหลือ ๔,๓๖๑ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๖	โครงการจัดการประกวดทอดผ้าพื้นเมือง (ผ้าขึ้นดินจก) ไท – ยวน คูบัว	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๒	๒๕ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๔,๙๐๕ บาท คงเหลือ ๒๕,๐๙๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓/	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๑	๒๒ พ.ย.๖๒ ใช้ไป ๓๘,๖๓๖.๙๕ บาท คงเหลือ ๑,๓๖๓.๐๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๘	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท – ยวน	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๒	๔ ม.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๑๔,๘๐๑ บาท คงเหลือ ๓๕,๑๙๙ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๙	โครงการค่ายพุทธบุตร	๖๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๒	๒๓ – ๒๘ มิ.ย.๖๒ ใช้ไป ๔๙,๓๕๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๖๕๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ในตำบลคูบัว	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๒	๑๓ – ๑๔ มิ.ย.๖๒ ใช้ไป ๔๘,๙๕๒ บาท คงเหลือ ๑,๐๔๘ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๒	๕ ก.ค.๖๒ ใช้ไป ๒๕,๐๕๖ บาท คงเหลือ ๔,๙๔๔ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๑๒	โครงการสนับสนุนอำเภอเมืองราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองเืองประจำปี ๒๕๖๒”	๑๕,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.๖๒	๒๓ – ๓๑ มี.ค.๖๒ ใช้ไป ๑๕,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๕,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๓๙,๐๕๖ บาท คงเหลือ ๕,๙๔๔ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะล้นถังขยะ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.๖๒	***ไม่ได้ดำเนินงาน คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	๙๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔๕,๐๐๐ บาท	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๑,๐๓๔,๖๔๑.๒๕ บาท คงเหลือ ๑๐,๓๕๔.๗๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๐๓๕,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๑,๐๓๔,๖๔๑.๒๕ บาท คงเหลือ ๔๐,๓๕๘.๗๕ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ตามแผนฯ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุูปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลคูบัว	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ตามแผนฯ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะภายใน ตำบลคูบัว	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๒๖,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๒๒๓,๒๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไล่ไก่)	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. – พ.ค.๖๒	ใช้ไป ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๐๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๖๖,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓๓,๒๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(ตั้งแต่แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ใช้แผน ๖๑-๖๕ จัดมาอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร กองช่าง อบต.คูบัว	๑๕๐,๐๐๐	ก.ย.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้ไป ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพัน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จ.๒
รวมงบประมาณ		๑๕๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๑๕๐,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการ ๕ ส. ภายในองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ตามแผนฯ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๔๓,๖๘๒ บาท คงเหลือ ๑๕๖,๓๑๘ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย.๖๒	***ไม่ได้ดำเนินงานคงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๔	โครงการบำรุงรักษา/ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.คูบัว				
	สำนักงานปลัดฯ	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๑๐๒,๒๓๐ บาท คงเหลือ ๗๗,๗๗๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
	กองคลัง	๘๐,๐๐๐ โอนสด ๔๖,๓๐๐ คงเหลือ ๓๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๑๘,๙๘๕.๗๑ บาท คงเหลือ ๖๑,๓๑๔.๒๙ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๔๖,๖๓๔ บาท คงเหลือ ๒๓,๓๖๖ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๑๘๓,๒๔๔.๖๔ บาท คงเหลือ ๑๖,๗๕๕.๓๖ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๕	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๒๐,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๖	โครงการบริหารงานสำนักงาน				
	สำนักงานปลัดฯ	๔๓๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๒๕๖,๙๐๒ บาท คงเหลือ ๑๘๕,๐๙๘ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
	กองคลัง	๒๔๐,๐๐๐ โอนลด ๑๒๔,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑๕,๖๐๐ บาท	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๙๓,๐๕๙ บาท คงเหลือ ๑๔๖,๕๔๑ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
	กองการศึกษา	๒๖๐,๐๐๐ โอนลด ๓๑,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๒๒๘,๕๐๐ บาท	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๑๑๓,๙๔๙.๑๓ บาท คงเหลือ ๑๑๔,๕๕๐.๘๖ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๓๑,๑๙๘ บาท คงเหลือ ๙๘,๘๐๒ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๙๖๙,๘๐๐		ใช้ไป ๙๑๓,๘๘๔.๕๒ บาท คงเหลือ ๑,๐๕๖,๙๑๕.๒๘ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานและการให้บริการของ อบต.คูบัว	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๒ (ปรับแผน ส.ค. ๖๒)	สิงหาคม ๒๕๖๒ ใช้ไป ๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานในหน้าที่	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๑ – ส.ค.๖๒	๘ ก.พ.๖๒ ใช้ไป ๑๒,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗,๖๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ของ อบต.คูบัว	๒๕,๐๐๐	ก.พ. – มี.ค.๖๒ (ปรับแผน มิ.ย. – ก.ค.๖๒)	ใช้ไป ๒๓,๘๗๕ บาท คงเหลือ ๑,๑๒๕ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๔	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ส.ค.๖๒	ส.ค. ๒๕๖๒ ไม่ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๗๕,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๔๒,๒๗๕ บาท คงเหลือ ๓๒,๗๒๕ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ คงเหลือ ๔๙๐,๐๐๐ บาท	(กันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน) ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๙๐,๐๐๐ บาท		คงเหลือ ๔๙๐,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๑ – ก.พ.๖๒	๓ – ๑๕ ก.พ.๖๒ ใช้ไป ๓๔,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๖๐๐ บาท	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๕๐,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๓๔,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๖๐๐ บาท	

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้สำนักงานอเนกประสงค์ (๒ ตัว)	๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	ใช้ไป ๕,๕๐๐.- คงเหลือ ๒,๕๐๐.-	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก (๒ ตัว)	๑๐,๘๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	ใช้ไป ๑๐,๘๐๐.-	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
๓	ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	๕,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๑	ใช้ไป ๔,๒๐๐.- คงเหลือ ๑,๓๐๐.-	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๔,๓๐๐ บาท		ใช้ไป ๒๐,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๘๐๐ บาท	

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง (ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ สาธารณะ)	๑,๔๐๐	ก.ย.๖๒	ใช้ไป ๑,๔๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กันเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จ.๒
๒	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๑ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๔๐๐๐๒	๒๑๑,๙๙๙.๑๐	ก.ย. ๖๒	ใช้ไป ๒๑๑,๙๙๙.๑๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กันเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จ.๒
๓	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด -กล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ จุด	๒๐๔,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐	ก.ย.๖๒	ยังไม่ได้ดำเนินการ คงเหลือ ๒๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕๖,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กันเงินรายจ่ายกรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จ.๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๖๓/๓,๓๙๙.๑๐ บาท		ใช้ไป ๒๑๓,๓๙๙.๑๐ บาท คงเหลือ ๔๖๐,๐๐๐ บาท	

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (๑) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ตัว (๒) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ตัว	๙๙,๔๐๐	ก.ย.๖๒	๙ ก.ย. ๖๒ ใช้ไป ๙๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๔๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น.๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๙๙,๔๐๐ บาท		ใช้ไป ๙๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๔๐๐ บาท	

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓,๔,๖,๑๐,๑๑,๑๓ และ๑๕ (ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ)	๔๙๔,๔๐๐	ก.ย.๖๒	ตามแผนฯ ใช้ไป ๔๙๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กั้นเงินรายการนี้ผู้купัน) แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น.๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๙๔,๔๐๐ บาท		ใช้ไป ๔๙๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๐๐ บาท	

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินงานเมื่อ/ ใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเคเบิลไฟส่องสว่างถนน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๒๐ ชุด (ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ)	๑๐๘,๐๐๐	ก.ย.๖๒	พ.ค. – ก.ย. ๖๒ ใช้ไป ๑๐๘,๐๐๐ บาท	ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม น.๒
รวมงบประมาณ		๑๐๘,๐๐๐ บาท		ใช้ไป ๑๐๘,๐๐๐ บาท	

๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ

๒. พื้นที่ระดับ อบต. ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมนิด และจัดทำให้สภาเด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงาน (Coaching) บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล เพื่อประโยชน์แก่เด็ก และเยาวชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

๑. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๒. ขาดการพัฒนา /ส่งเสริมการท่องเที่ยว ความมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปรับปรุง และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติต้นเขิน ขาดการดูแล ขาดการพัฒนา ควรจะมีการบริหารจัดการ แหล่งน้ำธรรมชาติคูคลอง หนอง บึง แหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ำ ได้ตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

๑. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ – เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่ว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

เนื่องด้วยการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้

กรอบแนวคิดและหลักการ...

➤ กรอบแนวคิดและหลักการ

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสถานการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้

- (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
- (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
- (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๔.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
- ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
- ๔.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- ๔.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
- ๔.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๔.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

/นโยบาย...

นโยบายที่ ๑ นโยบายจัดความยากจน + นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ (มั่งคั่ง)

นโยบายที่ ๒ นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

นโยบายที่ ๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ (Logistics)

นโยบายที่ ๔ นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ ๕ นโยบายความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นโยบายที่ ๖ นโยบายส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายที่ ๗ นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

นโยบายที่ ๘ นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติดั้งเดิมแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ

หลักการของยุทธศาสตร์

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

๑) ความอยู่ดีมีสุข...

- ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
- ๒) ชีตความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
- ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
- ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
- ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. ค่านิยมหลักของคนไทย

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ทั้งหมด ๑๒ ประการ

- ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
- ๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
- ๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
- ๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
- ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
- ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ห่วงดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
- ๗) เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
- ๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๐) รู้จักดำรงตน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ้างนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้อำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

๑๒) ดำเนินถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

๕. นโยบายของรัฐบาล

๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสำนึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภัยอันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”

๕.๒ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐมนตรี

นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ได้แก่

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสีน้ำเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

และ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่

๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจำ
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน
และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๖. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยเสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน รวบรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษารูปแบบการกระทำความผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรืออาจจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่อาจจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทำผิด

๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง

๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทำผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าการดำเนินการใดๆ เพราะรับผลประโยชน์

๒.๔) สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี

๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่

๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๗. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี

จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ และสภาพความเป็นไป ของปัจจัยภายนอก จังหวัดราชบุรีจึงกำหนดจุดยืนและตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วยตำแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนสำคัญ ดังนี้

๑) ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบที่ีระดับประเทศ และมีศักยภาพระดับนานาชาติ เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่เป็นแบรนด์สินค้าจากฐาน การเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถส่งออกไปยังนานาชาติ โดยเฉพาะประชาคม อาเซียนและประเทศคู่ค้า เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สับปะรด ชมพู่ มะม่วง กล้วยหอม ปลายงาม และ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐาน อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value based Economy) จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพที่มี มูลค่าสูงและการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่ผลิตการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและหนุนเสริม การพัฒนาภาคกลางในการเป็นฐานการผลิตอาหารและ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานโลกและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นที่ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ ของโลก

๓) การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุข ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเดินทางในอนาคต และเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคมคุณธรรมและสันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด ประเทศและของโลก เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และมีความสุขมั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกหมู่บ้าน

๔) สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างให้มีพื้นที่ต้นแบบนิเวศที่ยั่งยืน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศนิเวศป่าเขา นิเวศลุ่มน้ำ นิเวศชุมชนและระบบนิเวศเมืองให้มีความอุดม สมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว หนุนเสริมการค้า การบริการ และ อุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Smart City) อย่างยั่งยืน

โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีว่า “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) จำนวน ๖ ประเด็น ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ**

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค
- บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกัน น้ำท่วมและภัยแล้ง
- พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
- ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู้
- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ
- ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน เพื่อความเป็นพลเมือง
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ : ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน
- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค การเกษตร และอุตสาหกรรม
- การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาระบบการกำจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
- การบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- การจัดการมลพิษต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ได้นำนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดราชบุรีความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาเป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด

๔. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วิสัยทัศน์ "ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลคูบัว เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ

โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) จำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา :

๑. การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง
อำนวยการ ความสะดวก ในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา :

๑. การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสวัสดิการ ทางสังคม ความเป็นอยู่ ของประชาชน
และสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา :

๑. ทุกโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในตำบล มีมาตรฐาน การศึกษาใน ท้องถิ่นที่มีความ
ทันสมัย เด็กและ เยาวชน ต้อง ได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานทั่วถึง

๒. ประชาชนทุก หมู่บ้านมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทาง ศาสนา ปลูกฝัง จิตใจให้ประพฤติ
ดี มีคุณธรรม และศีลธรรม

๓. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นได้สืบทอด และดำรงไว้ทั้ง
ในโรงเรียนและ หมู่บ้าน

๔. มีการส่งเสริม การออกกำลังกายและเล่นกีฬา ในประชาชน กลุ่มต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ : พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา :

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลพัฒนาทั่วถึง
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอย ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. มีการป้องกัน เตรียมตัว และปรับตัวเท่าทัน ต่อสภาวะการณ์ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ : พัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

แนวทางการพัฒนา :

๑. มีการพัฒนา บุคลากร สถานที่และ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติราชการ
๒. มีการดำเนินการ ตามนโยบาย ของรัฐบาล และ แผนพัฒนาต่างๆ
๒. บุคลากรมีศักยภาพ การทำงานตาม หลักธรรมาภิบาล และในการ ให้บริการประชาชน

๙. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

๑) แผนชุมชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้

๑) แผนทำเอง

- ๑) แผนทำเอง
- ๒) แผนขอความร่วมมือ
- ๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน

โดยนำปัญหาความต้องการ จากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเกาะ ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้

- ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ เช่น การขุดลอกคูคลองจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตร
- ๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ
- ๔) ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว การจัดทำการแข่งขันกีฬา
- ๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด
- ๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
- ๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ
- ๙) ด้านสุขภาพชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคเรื้อรังโรคอุบัติใหม่
- ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น
- ๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.

๑๐. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลการเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นโดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงต้องประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ำ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสำรวจมีดังนี้

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน

ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร

ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ

(๑) ด้านเกษตร

(๒) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

(๓) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร



ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล



ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘	๙๐.๐๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๕	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
๓.๘ แผนงาน	๕	๔	๑๐๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๓	๖๐
รวม	๑๐๐	๙๕	๙๕

๑.๑) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนน ๙๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๑.๒ ข้อมูล...

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๒๐	๑๘	๙๐
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๔	๔	๑๐๐
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๑	๕๐
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐๐
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๒	๑๐๐
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑	๕๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๒	๒	๑๐๐
รวม		๒๐	๑๙	๙๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๒) พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น

น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว คะแนนที่ได้ ๑๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของภาพรวมทั้งหมด

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๕	๑๐๐
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๒	๑๐๐
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๑๐๐
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๒	๑๐๐
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๒	๑๐๐
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเชิงคุณภาพ	๒	๒	๑๐๐
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๑	๑	๑๐๐
	รวม	๑๕	๑๕	๑๐๐

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๑.๓) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๘ โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๓๖๖,๒๓๕.๙๙ บาท มีครบทุกยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว แต่จะให้ความสำคัญจำนวนโครงการ ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มากเป็นอันดับ ๑ รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นอันดับ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา เป็นอันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เป็นอันดับ ๔ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับสุดท้าย

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และ นโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วน ตำบลคว่ำบ่ ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหารส่วนตำบลคว่ำบ่ และสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคว่ำบ่ ที่จะนำไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ ชัดเจน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคว่ำบ่ ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๑๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงของครมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๓	๖๐
	รวม	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๑.๔) พบว่าประเด็น จำนวนโครงการทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา และนโยบายผู้บริหาร

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕

/ ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้อง

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๓/ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
๕.๔ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๕
๕.๕ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๓
๕.๖ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๖๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๕	๔
๕.๖๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔
รวม	๑๐๐	๙๓

(๑) พบว่าประเด็น

- โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๕๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
- ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

/ (๒) พบว่าประเด็น...

(๒) พบว่าประเด็น

- งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

- ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม - ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

(๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ

- จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๘ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

(๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ


- จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๘ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติมการจ่ายเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน ๑๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๙ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๑ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐	๑๐๐
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐

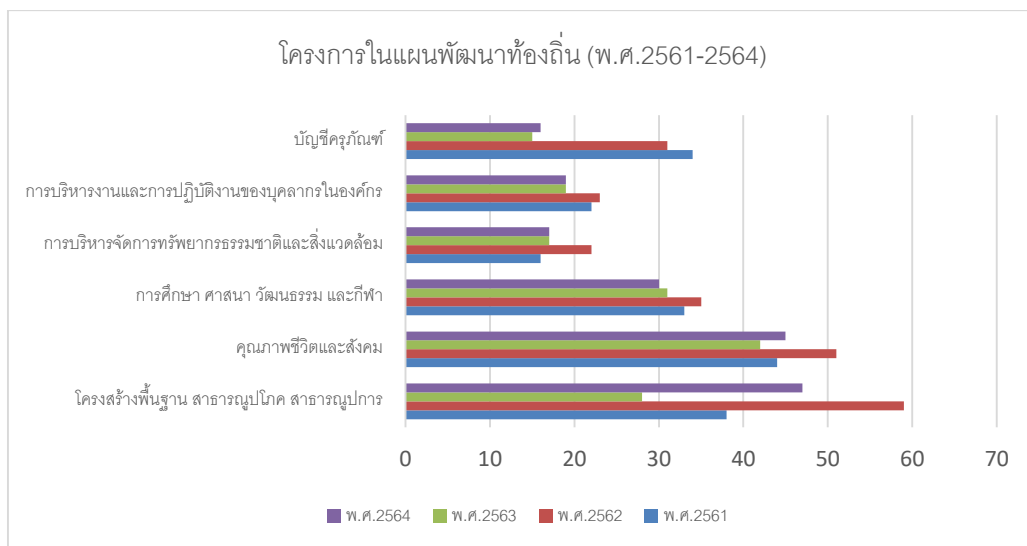


สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๒) พบว่าประเด็น สถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเพิ่มโครงการ /กิจกรรม ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ			
	๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๕	๔	๘๐
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๕	๕	๑๐๐
รวม		๑๐	๙	๙๐

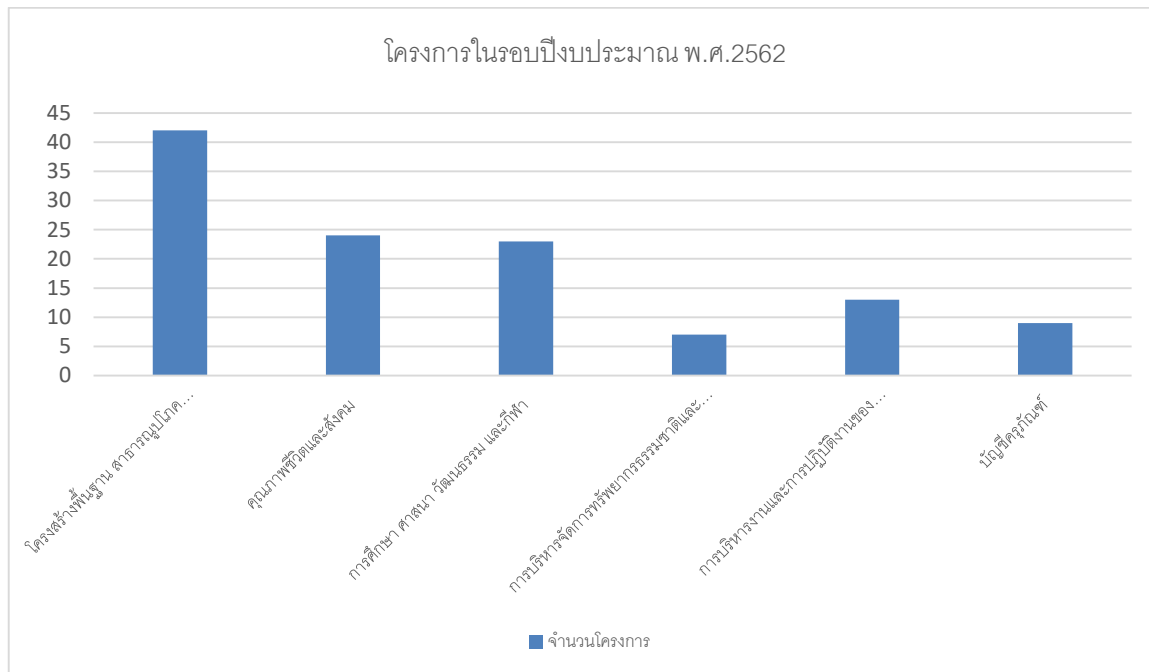


สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๓) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ มีการนำโครงการไปปฏิบัติ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๘ โครงการ หรือ ร้อยละ ๕๓.๓๙

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๕	๔	๘๐
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๕	๕	๑๐๐
รวม		๑๐	๙	๙๐

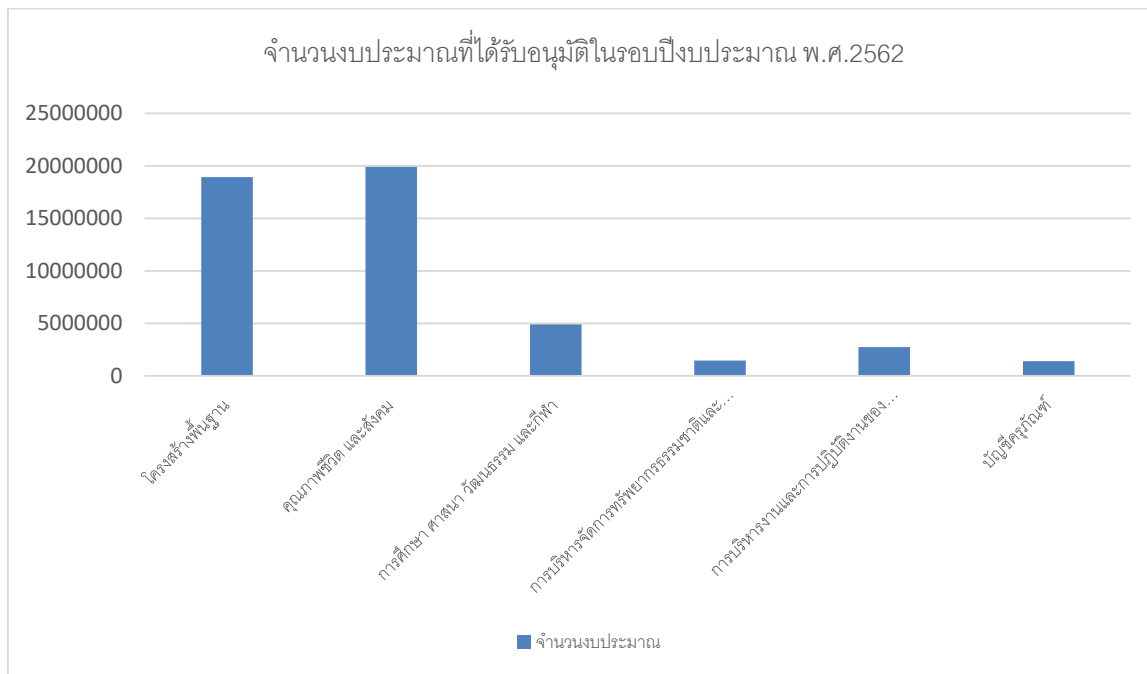

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๒.๔) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ มีการอนุมัติงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙,๓๖๖,๒๓๕.๙๙ บาท หรือ ร้อยละ ๔๕.๓๓/

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๕	๕	๑๐๐
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๕	๕	๑๐๐
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม ของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

พบประเด็น ดังนี้

(๑) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

(๒) ประเด็นด้านสังคม

(๒) ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การจัดทำโครงการด้านการกักตุนอาหาร ยาเสพติดประจำหมู่บ้านและควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะในชุมชน การปลูกป่าชุมชน แผนชุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการปลูกป่าชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลคูบัว แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บำรุงรักษาสสิ่งแวดล้อม ด้วย

(๓) จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

(๔) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

(๕) การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน เกลือกิ่งลงไปพองฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย

(๖) การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หรือเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในส่วนของแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันให้ประชาชนได้รับทราบ ทุกช่องทาง


ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๕	โครงการพัฒนา	๖๕	๕๕	๘๔.๖๑
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๓๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด ที่ ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕	๑๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๓	๖๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	๕	๔	๘๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๕	๑๐๐
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐

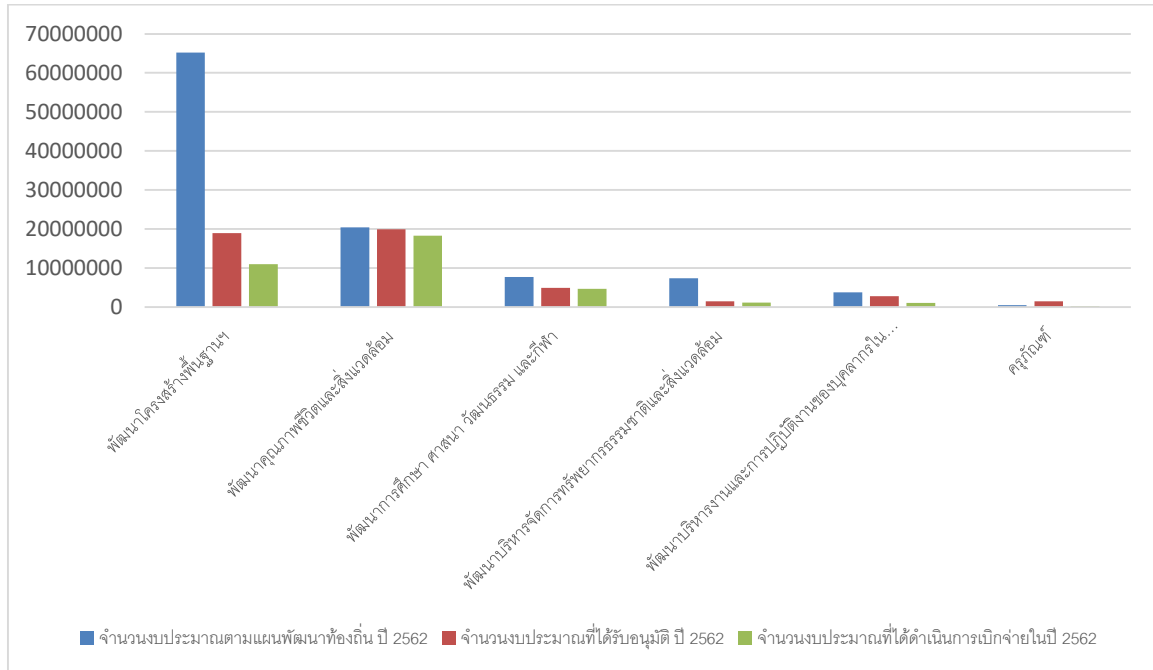

สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ด้านแหล่งน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ำ และ รางระบายน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทำให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วม หรือนิเวศน์น้ำหลาก

(๓) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น

(๔) การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๕) ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ปัญหาการจัดเก็บขยะ และที่ทิ้งขยะ ถือเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีนักท่องเที่ยวไป - มา เป็นจำนวนมากปัญหาขยะจึงตามมา องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวจึงควรรณรงค์เรื่องขยะให้เห็นผลให้มากขึ้นกว่าเดิม

(๖) การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เด็กควรได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์ และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพ และพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทัน และปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัตน์

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวน กลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
๑	เพศ			
	- ชาย	ม.๑-ม.๑๕	๕๐	๕๐
	- หญิง	ม.๑-ม.๑๕	๕๐	๕๐
๒	อายุ			
	- ๑๕-๒๕ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๑๒	๑๒
	- ๒๖-๓๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๑๘	๑๘
	- ๓๑-๔๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๓๕	๓๕
	- ๔๑-๕๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๕	๕
	- ๕๑-๖๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๑๓	๑๓
	- ๖๑-๗๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๑๓/	๑๓/
	- ๗๑ ปีขึ้นไป	ม.๑-ม.๑๕	-	-
๓	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ ชุมชน			
	- น้อยกว่า ๕ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๓/	๓/
	- ๕-๑๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๔๕	๔๕
	- ๑๑-๒๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๔๐	๔๐
	- ๒๑-๓๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๕	๕
	- มากกว่า ๓๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๓	๓

/ ข้อมูลทั่วไป...

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวน กลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
๔	ระดับการศึกษา			
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)	ม.๑-ม.๑๕	๓๐	๓๐
	- ประถมศึกษาตอนปลาย	ม.๑-ม.๑๕	๒๕	๒๕
	- มัธยมศึกษาตอนต้น	ม.๑-ม.๑๕	๑๘	๑๘
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	ม.๑-ม.๑๕	๓/	๓/
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	ม.๑-ม.๑๕	๒	๒
	- ปริญญาตรี	ม.๑-ม.๑๕	๘	๘
	- ปริญญาโท	-	-	-
	- ปริญญาเอก	-	-	-
	- อื่น ๆ	-	๑๐	๑๐
๕	ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน			
	- ประชาชน	ม.๑-ม.๑๕	๑๕	๑๕
	- สมาชิกสภาท้องถิ่น	ม.๑-ม.๑๕	๘	๘
	- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล	ม.๑-ม.๑๕	๔	๔
	- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน	ม.๑-ม.๑๕	๔	๔
	- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน	ม.๑-ม.๑๕	๑๕	๑๕

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวน กลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	ม.๑-ม.๑๕	๓๐	๓๐
	- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-
	- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง	ม.๑-ม.๕	๑๕	๑๕
	- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ	ม.๑-ม.๑๕	๕	๕
	- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์	ม.๑-ม.๑๕	๕	๕
	- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์เยาวชน หมอเดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ	ม.๑๕	๑	๑
	- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ	ม.๑-ม.๑๕	๕	๕
	- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว	-	-	-
	- สื่อมวลชน	-	-	-
	- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด	-	-	-
	- องค์กร/หน่วยงานอื่นๆ	-	-	-
		รวม	๑๐๐	๑๐๐

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ร้างระบายน้ำ ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๕๕%	๖๔.๐๐%	๐.๔๕%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๓.๓๓%	๔๔.๔๔%	๒๒.๒๒%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๒๗%	๔๔.๔๔%	๒๗.๒๗%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๑.๑๑%	๕๕.๕๕%	๑๓.๓๓%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๒๗%	๔๖.๖๖%	๒๓.๒๒%	๒.๓๓%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๖.๖๖%	๕๓.๓๓%	๒๐.๐๐%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๓.๓๓%	๕๑.๑๑%	๑๕.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๕.๕๕%	๔๔.๔๔%	๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๖.๖๖%	๔๑.๑๐%	๒.๒๒%	๐%	๐%
ภาพรวม	๕๔.๗๗%	๓๐.๙๖%	๑๔.๒๗%	๐%	๐%

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๔.๗๗/ พอใจมาก ร้อยละ ๓๐.๙๖/ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๔.๒๗/ พอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐ แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมากที่สุด ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ได้แก่ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสาธารณสุข

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๒.๕๕%	๖๕.๐๐%	๒.๔๕%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๒.๓๓%	๔๖.๔๔%	๒๑.๒๓%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๒๓%	๕๒.๙๖%	๑๗.๗๗%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๔.๑๑%	๕๓.๕๖%	๑๒.๓๓%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๗๘%	๔๘.๖๗%	๒๑.๒๒%	๒.๓๓%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๙.๖๗%	๕๐.๓๓%	๒๐.๐๐%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๒.๓๓%	๕๒.๑๑%	๑๕.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๕.๕๕%	๔๔.๔๖%	๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๗.๖๗%	๔๐.๑๑%	๒.๒๒%	๐%	๐%
ภาพรวม	๔๙.๗๗%	๓๙.๕๗%	๑๒.๖๖%	๐%	๐%

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๙.๗๗ พอใจมาก ร้อยละ ๓๙.๕๗ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๒.๖๖ พอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐ แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมากที่สุด ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬา การสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ประเพณี และการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ที่ทางราชการกำหนด ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๓.๓๓%	๕๕.๕๖%	๑๖.๖๓%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๑.๑๑%	๕๘.๘๙%	๑๓.๓๓%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๕๖%	๕๔.๔๔%	๑๐.๐๐%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๒.๒๒%	๕๓.๓๓%	๒๐.๐๐%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๘๙%	๕๐.๑๔%	๑๙.๒๒%	๑.๓๕%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๒.๒๒%	๕๕.๕๖%	๒๒.๔๔%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๑.๑๑%	๕๓.๓๓%	๑๕.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๐.๒๒%	๓๓.๕๖%	๒.๒๒%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๓.๓๓%	๖๒.๙๔%	๙.๒๒%	๐%	๐%
ภาพรวม	๒๓.๕๕%	๕๘.๑๘%	๑๔.๒๓%	๐%	๐%

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๒๓.๕๕ พอใจมาก ร้อยละ ๕๘.๑๘ พอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๔.๒๓ พอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐ แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมาก ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย การปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดวัชพืชผักตบชวา การขุดลอกคลองไส้ไก่ ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๔.๕๕%	๖๕.๐๐%	๐.๔๕%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๔.๓๓%	๔๓.๔๕%	๒๒.๒๒%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๓๓%	๔๒.๕๖%	๒๓.๓๓%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๐.๑๑%	๕๖.๕๕%	๑๓.๓๓%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕.๓๓%	๕๐.๒๒%	๒๑.๑๑%	๓.๓๓%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๖.๖๗%	๕๓.๓๓%	๒๐.๐๐%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๒.๓๓%	๕๒.๑๑%	๑๕.๕๖%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๒.๕๕%	๔๓.๕๖%	๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๒.๖๗%	๔๔.๑๐%	๓.๒๓%	๐%	๐%
ภาพรวม	๕๑.๓๓%	๓๕.๕๖%	๑๒.๒๓%	๐%	๐%

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๑.๓๓/๑๐๐ พพอใจมาก ร้อยละ ๓๕.๕๖ พพอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๒.๒๓/๑๐๐ พพอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจ ร้อยละ ๐ แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมากที่สุด ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การให้บริการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ฯลฯ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๕๕%	๖๑.๐๐%	๓.๔๕%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๑.๓๓%	๕๖.๔๕%	๒๒.๒๒%	๐%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๒.๒๒%	๔๔.๔๔%	๓๒.๓๒%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๒.๑๒%	๕๖.๕๕%	๑๑.๓๓%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๓.๓๓%	๔๓.๔๓%	๒๓.๒๒%	๑.๑๑%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๖.๖๖%	๕๕.๕๕%	๑๘.๑๘%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๓.๓๓%	๕๑.๕๑%	๑๕.๑๕%	๐%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๒.๔๔%	๕๓.๕๕%	๐%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๕.๕๕%	๔๑.๐๐%	๓.๓๓%	๐%	๐%
ภาพรวม	๔๕.๓๓%	๔๐.๙๐%	๑๓.๓๓%	๐%	๐%

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ ชุด ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๔๕.๓๓ พพอใจมาก ร้อยละ ๔๐.๙๐ พพอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๓.๓๓ พพอใจน้อย ร้อยละ ๐ และไม่พอใจร้อยละ ๐ แสดงว่าประชาชนพอใจในระดับ มากที่สุด ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ



ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ฉบับ (แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒, แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒, แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมี โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน.....๑๑๘.....โครงการ งบประมาณ ..๔๙,๓๖๖,๒๓๕.๙๙ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๔๒	๑๘,๙๒๔,๖๕๖.๘๙
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๔	๑๙,๙๑๑,๒๕๐.๐๐
๓. พัฒนาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๒๓	๔,๙๑๙,๐๔๐.๐๐
๔. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑,๔๓๕,๐๐๐.๐๐
๕. พัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๑๓	๒,๓๓๔,๘๐๐.๐๐
บัญชีครุภัณฑ์	๙	๑,๔๐๑,๔๙๙.๑๐
รวม	๑๑๘	๔๙,๓๖๖,๒๓๕.๙๙

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๖๓/๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ /๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพ...

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๒/ว ๐๓/๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓/ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคูบัว

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ฉบับ (แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒, แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒) โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม...๑๐๓...โครงการ จำนวนเงิน...๓๙,๐๘๖,๖๓๕.๑๐...บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน...๙๐...โครงการ จำนวนเงิน...๓๖,๑๑๓,๒๓๕.๖๐...บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๔๒	๑๓,๒๓/๙,๕๙๒.๘๔	๒๘	๑๐,๙๓๖,๕๙๒.๔๔
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๔	๑๘,๕๒๔,๔๒๔.๙๔	๒๑	๑๘,๒๔๓,๑๘๔.๙๔
๓. พัฒนาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๒๓	๔,๖๐๔,๙๕๓.๔๕	๒๓	๔,๖๐๔,๙๕๓.๔๕
๔. พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓/	๑,๑๐๑,๔๔๑.๒๕	๕	๑,๑๐๑,๔๔๑.๒๕
๕. พัฒนาการบริหารงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๑๓	๑,๖๔๔,๕๕๙.๕๒	๑๒	๑,๐๐๔,๕๕๙.๕๒
บัญชีครุภัณฑ์	๙	๙๓๒.๘๙๙.๑๐	๘	๒๒๒,๕๐๐
รวม	๑๑๘	๓๙,๐๘๖,๖๓๕.๑๐	๑๐๓	๓๖,๑๑๓,๒๓๕.๖๐

๑.๔ ความสำเร็จ...

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรมนามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่ จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิวัตน์เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลสรุปภาพรวม

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนา การบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

(๑) การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาพื้นที่และคน ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทิศทางที่ต้องการร่วมกัน ความสำเร็จทั้งปวงต้องอาศัยพัฒนาการมาเป็นลำดับ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันของแต่ละฝ่าย แต่ละบุคคล จึงจำเป็นต้องมีการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประสานวิธีการหลายวิธีและหลายๆ ด้าน

(๒) โครงการที่วางแผนจะดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

(๓) เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ในปีถัดไป และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ของปีงบประมาณนั้นๆ

ส่วนโครงการที่

ส่วนโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ ควรให้กองช่างที่เป็นเจ้าของโครงการ ดำเนินการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการจัดทำโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน เอกสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียง ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการของโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และการก่อสร้างได้เป็นไปตามเวลาที่สัญญาจ้างกำหนด ไม่ทำให้งานก่อสร้างสะดุดล่าช้าจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันระยะเวลาตามกำหนด

(๔) ผู้บริหาร อาจจัดทำข้อตกลง (MOU) กับคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การชุมชน ในระดับหมู่บ้าน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่มีความพร้อมกับการให้บริการ และการบำรุงรักษา เช่น โรงเรียน วัด สถานที่ที่เป็นสาธารณะสมบัติของหมู่บ้าน ภายในตำบล เป็นต้น เนื่องจากว่า ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งก่อสร้าง ขาดขาดการบำรุงดูแลรักษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างระบบที่ดีในการดูแล โดยให้ชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วม อาจจัดทำเป็นข้อตกลงกันขึ้นมาซึ่งจะสามารถช่วยเหลืองานตรวจจัดรักษาสิ่งซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์อันตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปได้

(๕) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนงาน ให้เพียงพอต่อการดำเนินการ ไม่ควรปรับลดงบประมาณที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน โดยหลักการพิจารณาควรพิจารณาว่า ด้านไหนควรต้องทำก่อน ทำหลังตามสถานการณ์ และความจำเป็นเร่งด่วน ผลลัพธ์จำเป็นต้องสอดคล้องกับงบประมาณ และความเป็นไปได้ของโครงการนั้นด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

(๖) ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้น ปีงบประมาณมากกว่าการทำ โครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม ความต้องการสูงสุดของประชาชน

(๗) ผู้บริหาร ควรนำประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดราชบุรี

(๘) ผู้บริหาร ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะในตำบล ให้เป็นวาระสำคัญ ของตำบล และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน



ภาคผนวก





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๖๘ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) นายชัยวัฒน์ อธิฐมนานกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวกุลนิษฐ์ ดาเชิงเขา
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คูบัว | กรรมการ |
| (๓) นายชาญชัย ผาแสนเงิน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คูบัว | กรรมการ |
| (๔) นายศินวงศ์ มาตกฤษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.คูบัว | กรรมการ |
| (๕) นายชาญวิทย์ ห่วงทอง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านระหนอง | กรรมการ |
| (๖) นายสันติ อบเชย
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองยายแก้ว | กรรมการ |
| (๗) นางจิรนนท์ แดงสุภา
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองยายแก้ว | กรรมการ |
| (๘) นางพนอจิตร นารามิรมย์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | กรรมการและเลขานุการ |
| (๙) นางภักกร แก้วมรกต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ตามข้อ ๑๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ตาม (๕) (๖) (๗) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพจวนศล ธนิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ปลัด	
รองปลัด	
พจน.	
จนท.พิมพ์/ทำน.	

กำหนดฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๖๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| (๑) นายจรรวดี คล้ายเคลื่อน | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๒ | |
| (๒) นายสุพจน์ แก้วเพชร | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๙ | |
| (๓) นายสุทิน เทียนวงศ์ | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๑๔ | |
| (๔) นายพรพรม ไสยจิตร | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านไร่นามะม่วง | |
| (๕) นายอรุณ รักผกา | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๓ บ้านต้นแห | |
| (๖) นายกำพล พงษ์หาญ | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูบัว | |
| (๗) นายสมภพ ไส้ไหม | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว | |
| (๘) นางสาวชญามาศ พิบูลแถว | กรรมการ |
| รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | |
| (๙) นางพนอจิตร นาราภิรมย์ | กรรมการ |
| หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | |
| (๑๐) นายสมาน ชมมิ่ง | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข | |
| (๑๑) นายฉลวย แก้วจำปาสี | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาขาอาชีพช่าง | |


ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการพัฒนาที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ตาม (๑) (๒) (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ตาม (๔) (๕) ผู้แทนภาคราชการที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ตาม (๖) (๗) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ตาม (๘) (๙) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ตาม (๑๐) (๑๑) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายพจวนศล ธนิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๕๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ ๑๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคูบัว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ๑. นายจรรววัฒน์ คล้ายเคลื่อน | สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ที่ ๒ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางพนอจิตร นาราภิรมย์ | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว | เลขานุการคณะกรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพจฐนศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ปลัด	
รองปลัด	
นาง	๑๕.๓.๖๒
นาย	



คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๔) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | อนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | อนุกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | อนุกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ | อนุกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | อนุกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน | อนุกรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

(๑) พิจารณาดำเนินการตามกรอบแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวกำหนด

(๒) จัดทำสรุปผลการประเมินของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประเมิน

(๓) นำเสนอรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการติดตามฯ

(๔) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการติดตามฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจักรวัฒน์ คล้ายเคลื่อน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



****ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒****

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วาระการประชุม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

และรายงานความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นตำบลคูบัว
ได้รับทราบตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว
(ลำห้วยบน บ้านทุ่งนา)

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท


- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

เบิกจ่ายจริง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๐ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดำเนินการตามโครงการ ปังงบประมาณ ๒๕๖๒
 (โครงการปังงบประมาณ ๒๕๖๑ กันเงิน)
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการโครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ (งบปี ๒๕๖๑ กันเงิน) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา /๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธาก่อสร้าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี



(๒) โครงการเจาะวางท่อประปาตลอดถนน ๓๓๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายการตั้งจ่ายใหม่)
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการเจาะวางท่อประปาตลอดถนน ๓๓๓๓๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการเจาะวางท่อประปาตลอดถนน ๓๓๓๓๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ (รายการตั้งจ่ายใหม่) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/ใบสั่งจ้าง ๖๗ /๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายธีรนาถ แก้วสว่าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว
สายเลียบบคลองชลประทานจากบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อดำบลบ้านไร่

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม ปี ๒๕๖๑)

☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๙๙,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล

☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายการตั้งจ่ายใหม่)
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๙๙,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๔/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
- โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๔) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว

เริ่มจากคลองน้ำทิ้งเลียบบถนนสาย ๓๓๓๘ เข้ามาถึงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน


งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท

(จุดแรกที่ดินดำเนินการก่อสร้าง)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๔๑,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปิ๊งประมาณ ๒๕๖๑
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว

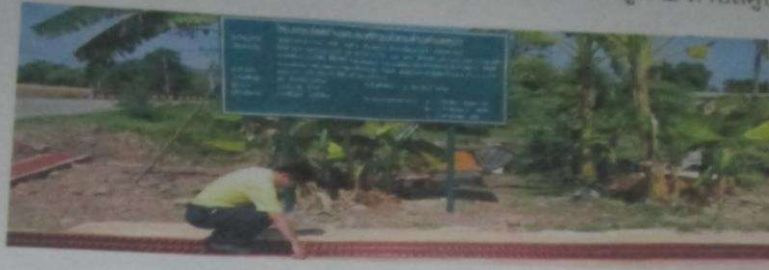

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๑๒/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายธีรนาท แก้วสว่าง
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
- วันที่ทำสัญญา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
- เสร็จแล้วเสร็จเมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

จำนวน ๒๔๓,๐๐๐ บาท

จำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท

(๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว
จากจุดสิ้นสุดเดิมถึงสามแยกบ้านนายสุกฤษ

งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓๖,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๓ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา /๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายกฤษณะ พวงมาลัย
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี


(๖) โครงการปกเสาพาดสายพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว

ซอย ๗ ต้นซอยไปท้ายซอย จำนวน ๓ ต้น

งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๗,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

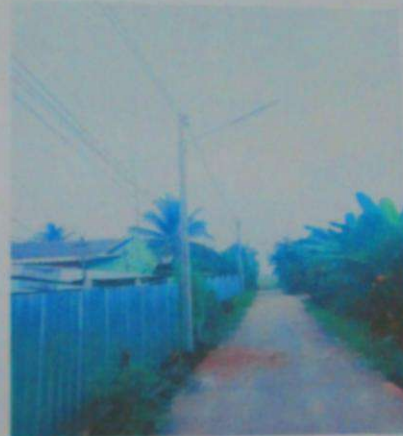

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งโคไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
 ๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ (รายจ่ายตั้งจ่ายใหม่) จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
 ๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
 ๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา /๒๕๖๒
 ๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายสมพงศ์ โซเอียง
 ๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
- วันที่ทำสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
 เวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
 ารแล้วเสร็จเมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
 ารรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี




(๗) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
จากจุดสิ้นสุดเดิมไปทางสระน้ำวัดบ้านโพธิ์

งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| ☒ | โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายจริง ๒๕๖,๐๐๐ บาท |
| | แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ | คงเหลือ ๐ บาท |
| ☐ | สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | -..... |
| ☐ | ยกเลิกโครงการ เหตุผล | -..... |
| ☐ | ปัญหา/อุปสรรค | -..... |

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายการตั้งจ่ายใหม่)
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว

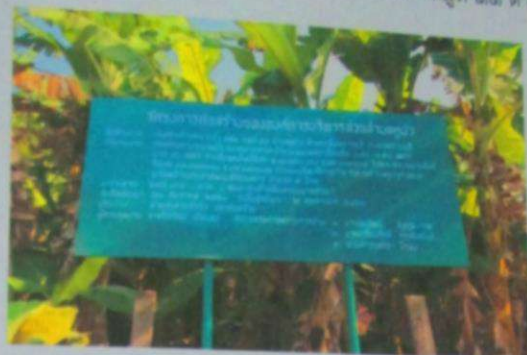

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๑๐/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธาก่อสร้าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
- วันสิ้นสุดสัญญา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ /
- ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

จำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท
 จำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท

(๘) โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว
 ๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา /๒๕๖๒
 ๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายกฤษณะ พวงมาลัย
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
- วันที่ทำสัญญา ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
- สัญญา ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
- ๑ ปี

(๙) โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว
(จากบ้านนางจำปา ทองอยู่ ไปถึงบ้านนางสวาท องค์ชุมชน)

งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

เบิกจ่ายจริง ๓๙๕,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ (รายการตั้งจ่ายใหม่) จำนวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
- โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๑๐) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัด อบต.คูบัว)
งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท

☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๙๑,๙๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ ๘,๑๐๐ บาท

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร



(๑๑) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัด อบต.คูบัว)
งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๑๗,๐๐๐ บาท

- ☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๖,๘๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ ๒๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
ยกเลิกโครงการ เหตุผล -.....
ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่)



(๑๒) ซ่อมบำรุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๗๕๖ ราชบุรี
รถบรรทุกขยะ คันสีฟ้า (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัด อบต.คูบัว)

งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล -.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

เบิกจ่ายจริง ๒๒๒,๒๓๙ บาท
คงเหลือ ๒๗,๗๖๑ บาท

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่)



ซ่อมบำรุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-7756 ราชบุรี



(๑๓) โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๖๑,๗๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๓๘,๓๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(ภาพตัวอย่าง)



บรรยายภาพ

๑.วันที่ดำเนินการ เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

๒.สถานที่ ภายในตำบลคูบัว

๓.กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ (ลูกรัง หินคลุก)

เป้าหมาย ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร





(๑๔) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว
สายเลียบคันคลองชลประทานจากบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อดำบลบ้านไร่
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๖๗,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๓๓,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



บรรยายภาพ

1. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 200,000 บาท
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 167,000 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 16/2562
5. ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.เค.อาร์.มอเตอร์ จำกัด
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
7. วันที่ทำสัญญา 30 มีนาคม 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562
10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

(๑๕) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว

เริ่มจากคลองน้ำทิ้งเลียบบถนนสาย ๓๓๓๘ เข้ามาถึงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน

งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

(ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๔๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



บรรยายภาพ

1. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 4
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 240,000 บาท
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 240,000 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 26/2562
5. ชื่อผู้รับจ้าง นายธีรนาท แก้วสว่าง
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
7. วันที่ทำสัญญา 7 มิถุนายน 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

วันที่รับมอบงาน 6 สิงหาคม 2562

(๑๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว

บริเวณสายเลียบบคลองชลประทาน จากศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ไปทางศาลปู่หมื่น

งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว-.....

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....

☒ ยกเลิกโครงการ เหตุผลการขอยื่นแบบก่อสร้างในเขตชลประทานตามขั้นตอนรายการ
ประกอบแบบแปลนก่อสร้างทางถนน ไม่มีวิศวกรรับรองแบบก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้

☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ความไม่พร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อน



(๑๗) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว
บริเวณจากบ้านผู้พันสมวงศ์ พิบูลแถว ไปทางคลองราชินี


งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

(ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๒๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว

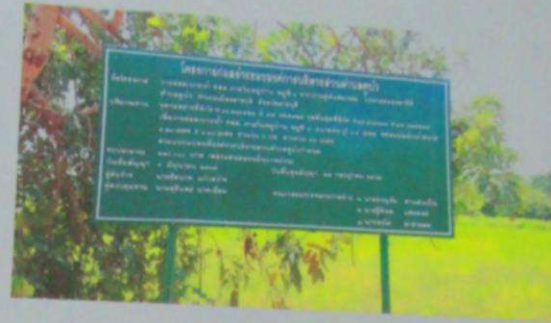

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๒๗ /๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายธีรนาท แก้วสว่าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท


(๑๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว
บริเวณบ้านนางจำสวัสดิ์ ไปทางบ้านนางประภา ศรีนวล

งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| ☒ | โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายจริง ๒๒๕,๐๐๐ บาท |
| | แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ | คงเหลือ ๐ บาท |
| ☐ | สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | -..... |
| ☐ | ยกเลิกโครงการ เหตุผล | -..... |
| ☐ | ปัญหา/อุปสรรค | -..... |

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ภาพถ่ายผลการดำเนินการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 9

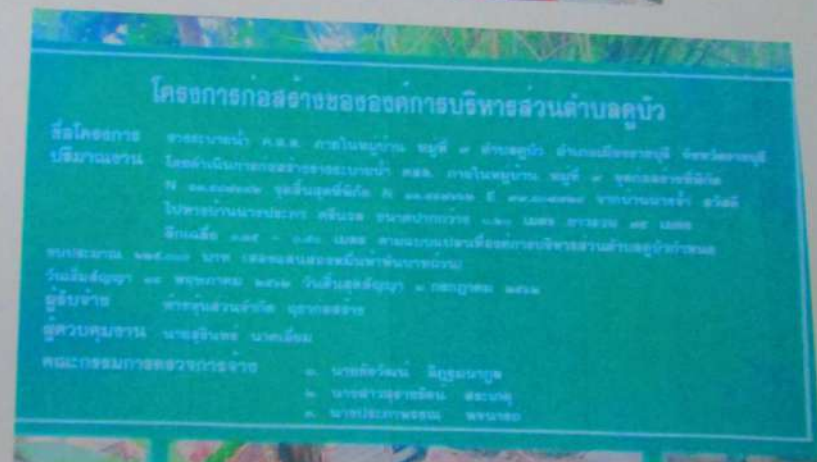

- บรรยายภาพ
1. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 9
 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 225,000 บาท
 3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 225,000 บาท ✓
 4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 24/2562
 5. ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรม
 6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
 7. วันที่ทำสัญญา 18 พฤษภาคม 2562
 8. ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
 9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ✓
 10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี



(๑๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว
จากบ้านนายถวิล แสงใส ถึงบ้านนางสุชาลี สุขเกษม

งบประมาณ ๙๖,๖๐๐ บาท

(ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๙๓,๖๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ภาพถ่ายผลการดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายถวิล แสงใส ถึงบ้านนางสุชาติ สุขเกษม




(๒๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว
บริเวณบ้านนางบังอร ทับประเสริฐ

งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ บาท (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๒,๒๗๒.๐๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๘,๙๒๗.๙๕ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนางบึงอร ตำบลประเสีฐ

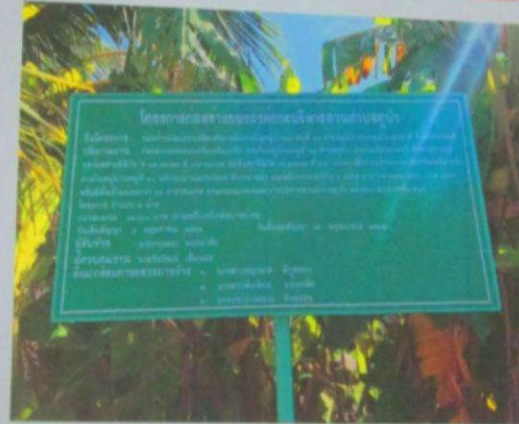

บรรยายภาพ

1. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 31,200 บาท ✓
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 31,200 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 21/2562 20,272.05.
5. ชื่อผู้รับจ้าง นายกฤษณะ พวงมาลัย
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
7. วันที่ทำสัญญา 1 พฤษภาคม 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 ✓
10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

(๒๑) โครงการก่อสร้างปักเสาไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
จากริมคลองชลประทานข้างวงเวียนไปทางบ้านนางอุไร บัวไสว

งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๒๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการปักเสาไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา /๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายสมพงศ์ โชแข็ง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
๗. วันที่ทำสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๒๒) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว
จากอุโมงค์ฝึ้นจนถึงบ้านนายเพลิน ศรีจันทร์เพื่อ(ริมถนนสาย ๓๓๓๙ ไปลงคลองระบายน้ำ ร.๑ขวา คูบัว)
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว-.....

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....

☒ ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากโครงการดังกล่าว ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน หมู่ที่ ๑๓ ขอยกเลิกโครงการ แจ่มติที่ประชุม ขอยกเลิกเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมไหลเข้าบ้าน
ในที่บ้านลุ่มต่ำนั้น ในปัจจุบันบ้านที่ลุ่มต่ำได้จัดการกับสถานการณ์ปัญหาป้องกันน้ำท่วมบ้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเส้นทางไหลของน้ำที่ข้าง
ถนนระบายการไหลค่อนข้างสะดวก และขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวพิจารณาดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งหมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณสะพาน บ้านนายสำลี -นางทองดี แดงพราน
(บ้านเลขที่ ๙๓) จุดที่ ๒ บริเวณหน้าร้านค้านางบุญสม อ่อนแก้ว (บ้านเลขที่ ๖๗/๑) จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนายสุริเยฟ โชคลาภ
(บ้านเลขที่ ๑๒๔) ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณโครงการ วางท่อ ค.ส.ล. ของหมู่ที่ ๑๓ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ติดตั้งตามจุดที่ประชาคมหมู่บ้านต้องการ.....

☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ยกเลิกโครงการ



(๒๓) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว
จากบ้านนางเจียน วงกลม ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนามพุงดอ

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว-.....
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☒ ยกเลิกโครงการ เหตุผลเนื่องจากความพร้อมของสถานที่ทำโครงการไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไป
ดำเนินการได้ และแนวเขตที่ดินข้างเคียงที่ติดที่สาธารณะไม่อนุญาตยินยอมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน จึงขอยุติโครงการ
.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



ยกเลิกโครงการ

(๒๔) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว
บริเวณจุดเริ่มต้นบ้านนายสวิงไปทางบ้านนางกลม ฝอยทอง
งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๒๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 15
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 220,000 บาท
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 220,000 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 25/2562
5. ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธาก่อสร้าง
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
7. วันที่ทำสัญญา 17 พฤษภาคม 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562
10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

(๒๕) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว
บริเวณบ้านทุ่งนาไปทางบ้านนายมนตรี (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

เบิกจ่ายจริง ๑๘๖,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๑,๔๐๐ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ภาพถ่ายผลการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2



บรรยายภาพ


1. ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 200,000 บาท
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 186,000 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 15/2562
5. ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
7. วันที่ทำสัญญา 30 มีนาคม 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 28 เมษายน 2562
10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

(๒๖) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว
บริเวณจุดสิ้นสุดเดิมไปทางประปา (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

งบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๔๖,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๑,๕๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

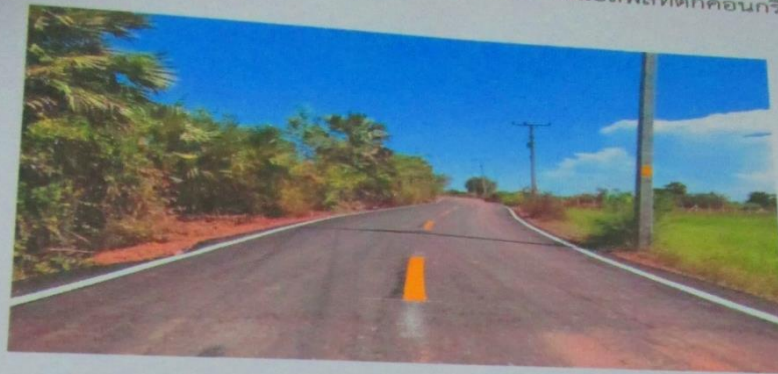

บรรยายภาพ

1. ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 258,000 บาท
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 246,500 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 15/2562
5. ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
7. วันที่ทำสัญญา 30 มีนาคม 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 28 เมษายน 2562
10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี


(๒๗) โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์
ไปทางตำบลอ่างทอง (หมู่ที่ ๙,๑๐,๑๑) ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562
โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านปากห้วย - บ้านท่าช้าง บ้านโพธิ์

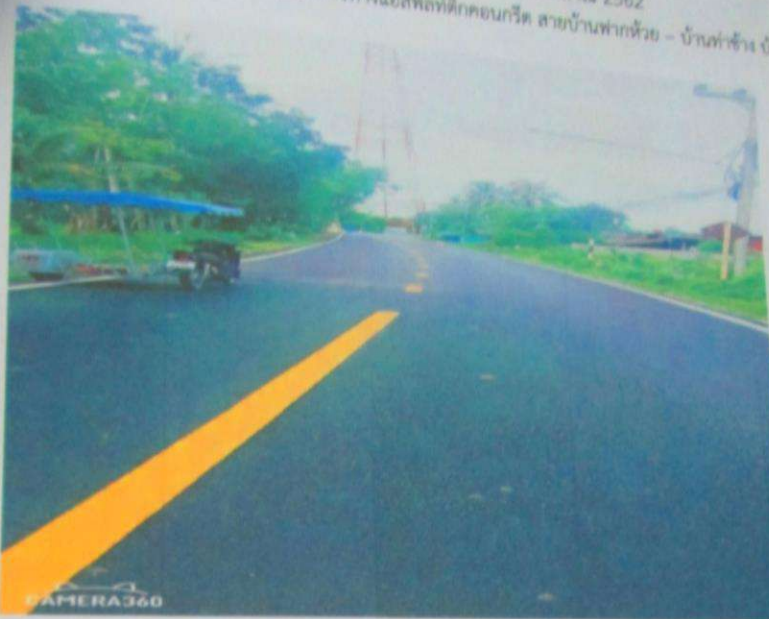

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านปากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์ ไปทางตำบลอัมพ
หมู่ที่ ๙,๑๑,๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านปากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์ ไปทางตำบล
อัมพ หมู่ที่ ๙,๑๑,๑๑ ตำบลคูบัว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ วันที่สิบสองสัญญา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จ้างเหมาส่วนราชการ ๒๕๖๒

นายสมิทธิ์ นาคเชื้อพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

๑. นายอัมพวัน อัมพวันกุล

๒. นายอัมพวัน อัมพวันกุล

๓. นายอัมพวัน อัมพวันกุล

บรรยายภาพ

- ปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านปากห้วย - บ้านท่าช้าง บ้านโพธิ์
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 5,690,000 บาท
- ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 3,600,000 บาท
- ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 20/2562
- ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระลักษมณ์ก่อสร้าง
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- วันที่ทำสัญญา 25 เมษายน 2562
- ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
- โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562
- ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี


(๒๘) โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานไปทางตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๕,๓๘๘,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓,๘๓๘,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562
โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานไปทางตำบล
บ้านไร่ หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด ตำบลคูบัว

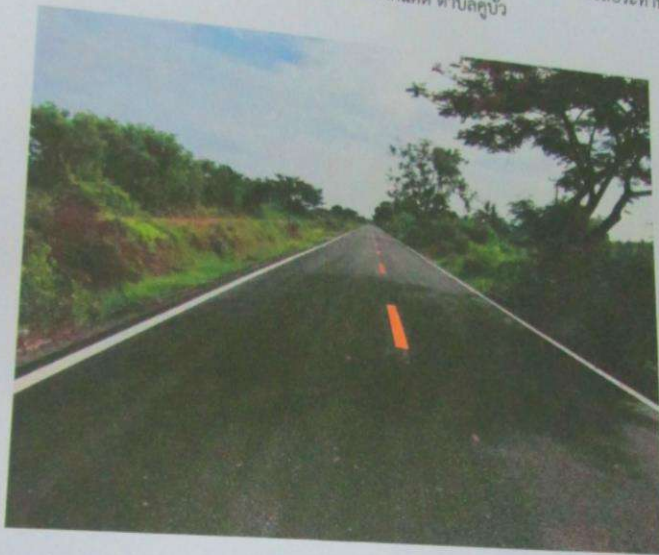

บรรยายภาพ

1. ปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานไปทางตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด ตำบลคูบัว
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 5,388,000 บาท
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 3,838,000 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 19/2562
5. ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท ทำร่าบก่อสร้าง จำกัด
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. วันที่ทำสัญญา 25 เมษายน 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562
10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

(๒๙) โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ฝาท่อระบายน้ำ ฝาทะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๘๒,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๘๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)



ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการ โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ฝาท่อระบายน้ำ ฝาดะแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ฝาท่อระบายน้ำ ฝาดะแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๘๒,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๑๐๓/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายรังสฤทธิ โส๊ะหนองรีน
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๓๐) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว


บริเวณจากจุดสิ้นสุดเดิมถึงบ้านร้อยตรีศุภชัย (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๔๕,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม) จำนวน ๒๔๗,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๐/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณชัยก่อสร้าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
- วันที่ทำสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
- การแล้วเสร็จเมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๓๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว
บริเวณบ้านทุ่งนาไปทางบ้านนายมนตรี (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๔๖,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงประมาณ ๒๕๖๒ (เงินสะสม)
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรรูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ


๑. ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรรูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว จำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม) จำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๓/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง บ.ทำรบบก่อสร้าง จำกัด
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
- โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๓๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว
สายเลียบคันคลองชลประทานจากบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อดำบลบ้านไร่
งบประมาณ ๒๕๙,๐๐๐ บาท (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๕๓,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินสะสม)
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว

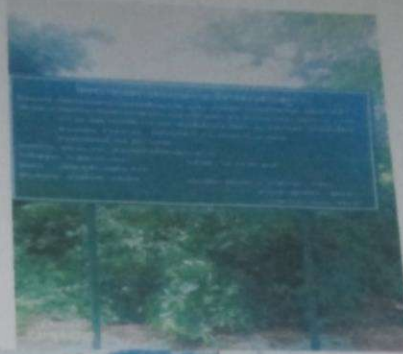

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม) จำนวน ๒๕๔,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๕๓,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๔/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง หจก.ท่าราบก่อสร้าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
- โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๓๓) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว

เริ่มจากคลองน้ำทิ้งเลียบบถนนสาย ๓๓๓๘ เข้ามาถึงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน

งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สถานที่/พื้นที่ดำเนินการโครงการ ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม



(๓๔) โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลคูบัว

ต่อจากของเดิมโค้งข้างสะพานตรงข้ามร้านเจ๊อร เลียบถนนสาย ๓๓๓๙ เพื่อต่อกับท่อเดิมหลัง อบต.คูบัว

งบประมาณ ๔๖๔,๐๐๐ บาท

(ต่อจากจุดเดิม)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ยังอยู่ในระยะกระบวนการตรวจรับงานและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์.....



(๓๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว

บริเวณสายเลียบบคลองชลประทาน จากศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ไปทางศาลปู่หมื่น

งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐ บาท (ตั้งไว้เพื่อจะก่อสร้างต่อจากจุดเดิม)

☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

☒ ยกเลิกโครงการ เหตุผลการขอยื่นแบบก่อสร้างในเขตชลประทานตามขั้นตอนรายการ
ประกอบแบบแปลนก่อสร้างทางถนน ไม่มีวิศวกรรับรองแบบก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้

☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ความไม่พร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อน

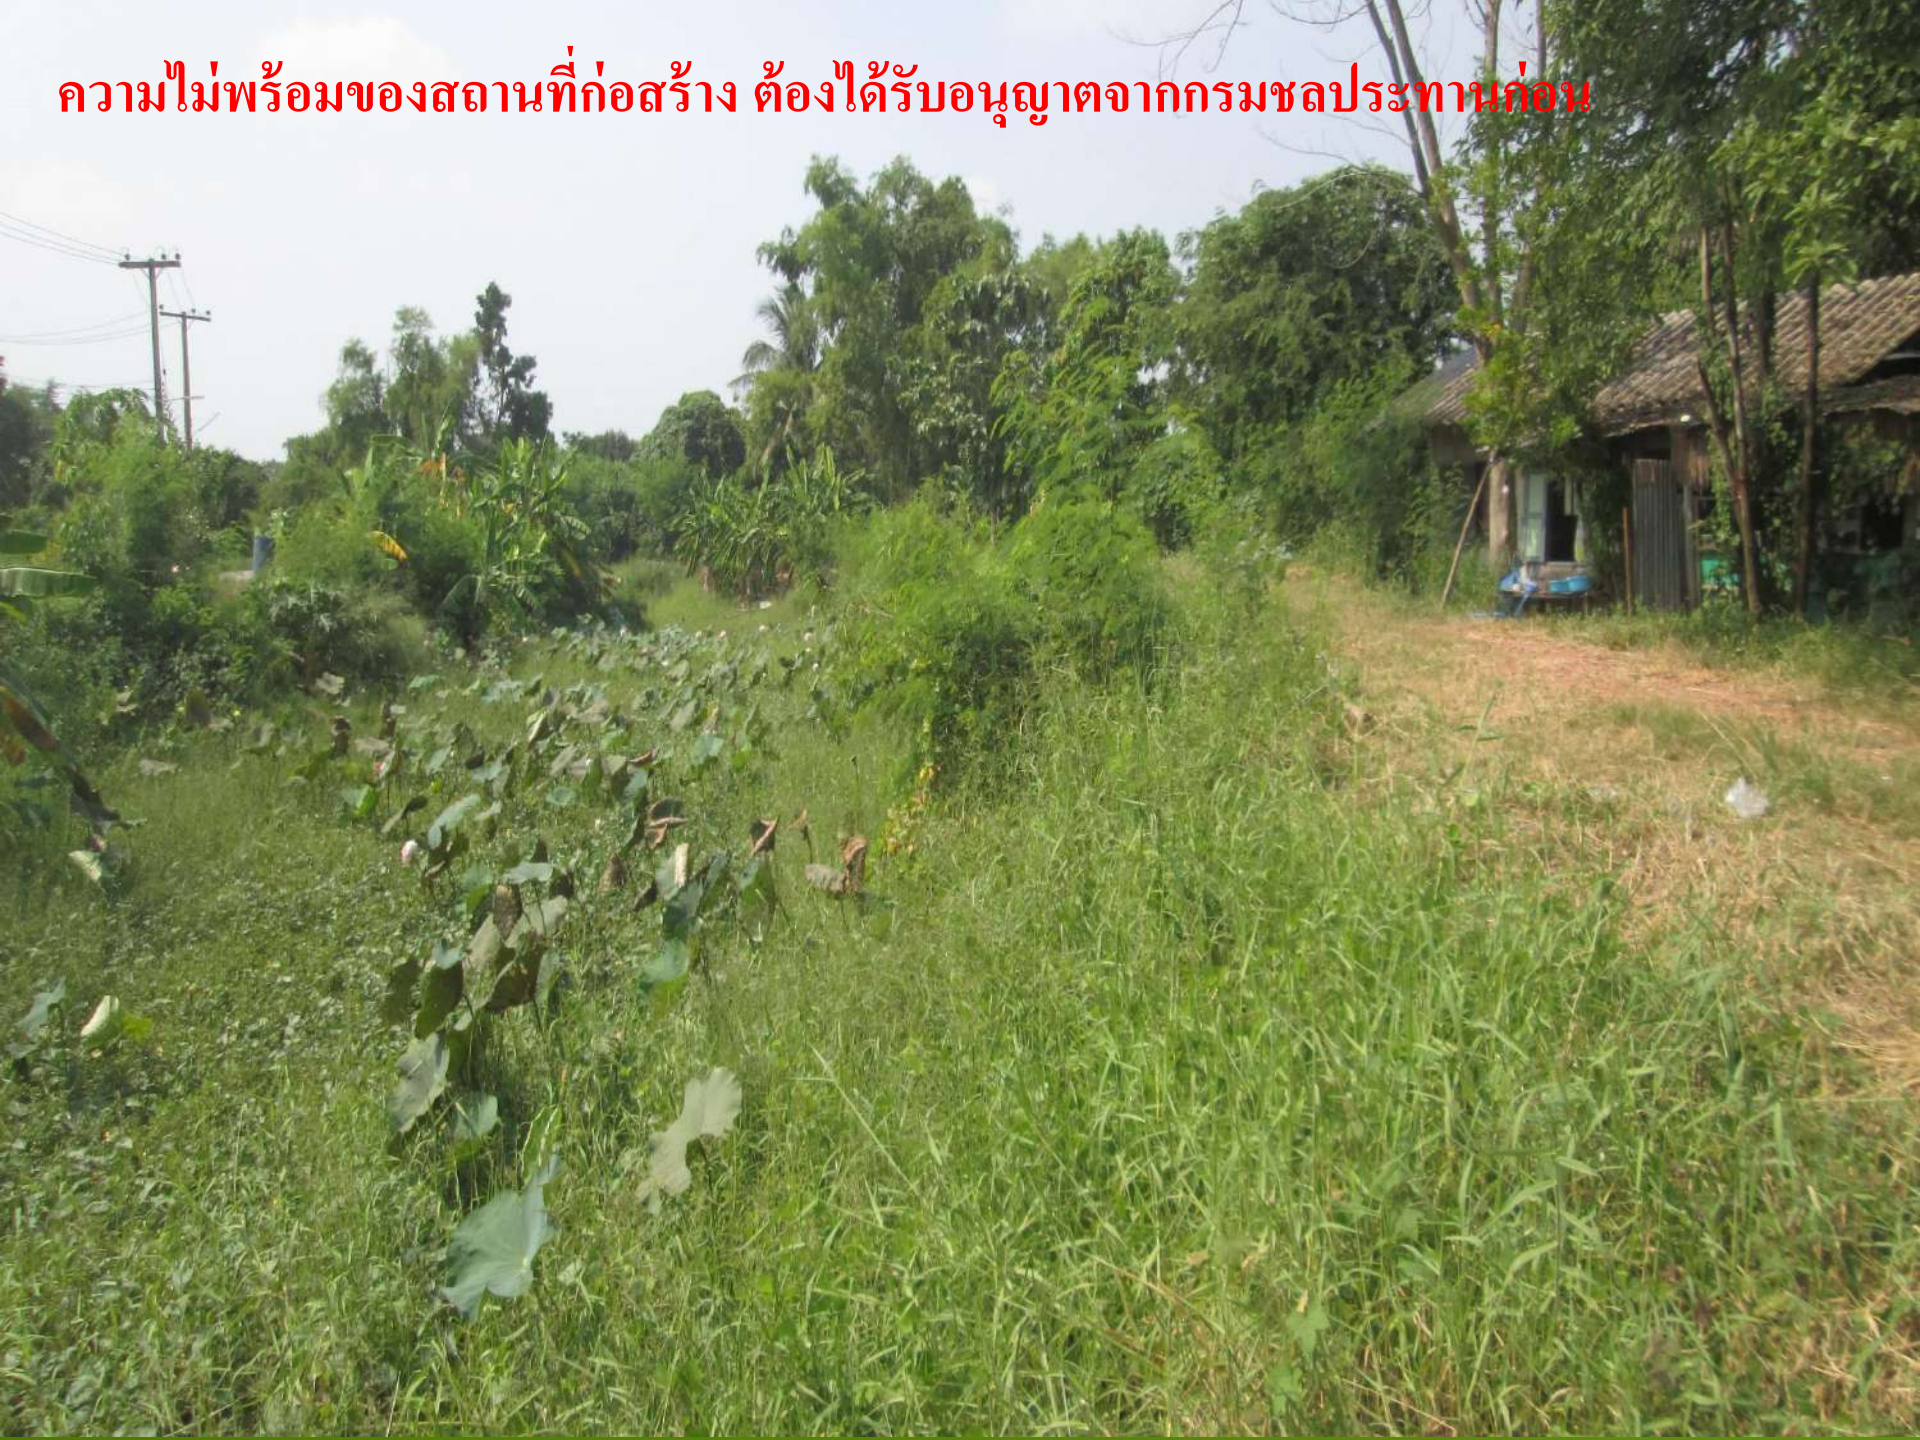


(๓๖) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว
จากบ้านนายละมุด สะอาดแก้ว ผ่านหลังบ้านนายทองหล่อ ชมโลก ลงคลองชลประทาน
งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๒๘,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ ปิ๊งประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว

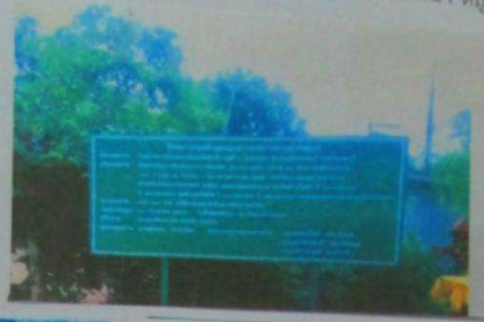

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๐ /๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณชัยก่อสร้าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
- วันที่ทำสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
- การแล้วเสร็จเมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

(๓๗) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว
จากบ้านนายสายันต์ ไปทางบ้านร้อยตรีชุมพล

งบประมาณ ๒๙๕,๐๐๐ บาท

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สถานที่/พื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง



(๓๘) โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว
จากบ้านนายบุญช่วย ทับทิม ไปสุดที่บ้านนายชำนาญ มณีโชติ
งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท


- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

เบิกจ่ายจริง ๑๒๘,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๐ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม)
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๖/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายกฤษณะ พวงมาลัย
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

จำนวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท

จำนวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท


(๓๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบำบัดน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
จากบ้านนายชล ชาติไทย ไปถึงบ้าน นางสาวธัญพัฒน์ ชาติไทย

งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๓๗,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว

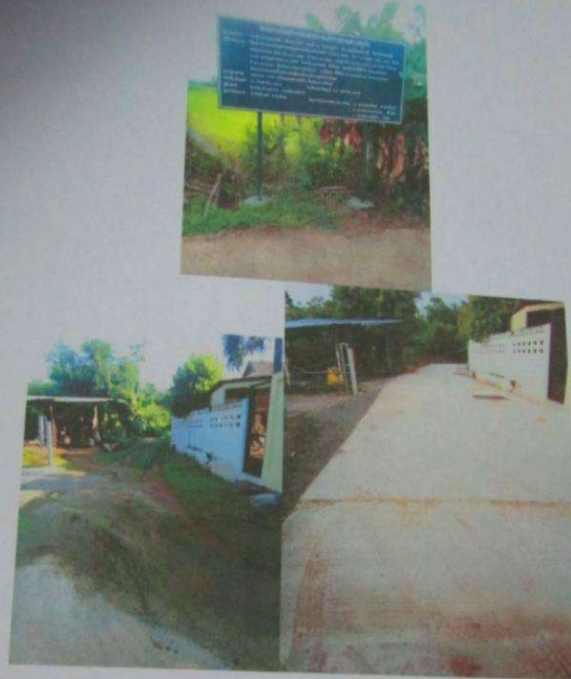

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม) จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๔๐/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณชัยก่อสร้าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี


(๔๐) โครงการปกเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
ริมถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ ไปทางตำบลอ่างทอง

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๕๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการป้องกันปริมาณ ๒๕๖๒ (เงินสะสม)
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว

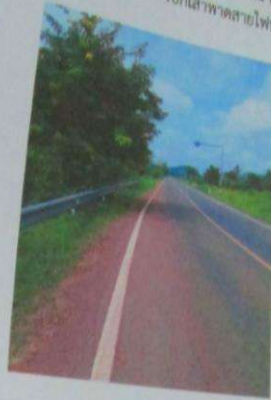

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม) ✓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา ✓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๔/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายสมพงศ์ ไชแข็ง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ✓
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๔๑) โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว

ริมถนนเลียบบคลองชนประทาน จากจุดสิ้นสุดเดิม ถึงบ้านนางอุไร บัวไสว (ต่อจากจุดเดิม)

งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๗๒,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินสะสม)
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการโครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ



๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม) จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๒ /๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายสมพงศ์ โชแข็ง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ✓
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๔๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว
จากบ้านนางอนงค์ เพ็งระแก้ว ไปทางบ้านนายมาโนช คชสถิตย์
งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| ☒ | โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายจริง ๑๓๔,๐๐๐ บาท |
| | แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒ | คงเหลือ ๐ บาท |
| ☐ | สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | -..... |
| ☐ | ยกเลิกโครงการ เหตุผล | -..... |
| ☐ | ปัญหา/อุปสรรค | -..... |

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว

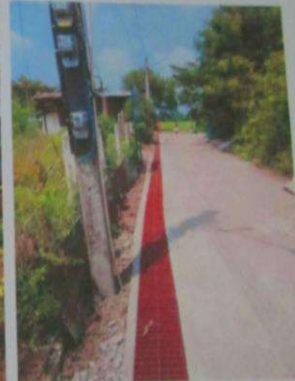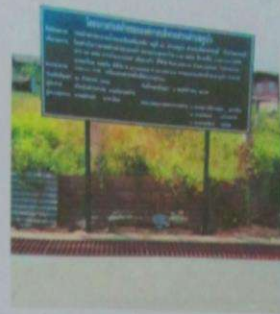

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม)
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๔๑/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณชัยก่อสร้าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

จำนวน ๑๓๔,๐๐๐ บาท

จำนวน ๑๓๔,๐๐๐ บาท

(๔๓) โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่opakน้ำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว
จากบ้านนางสาวอรุณี หีบทอง ไปทางบ้านนายสงค์ ศิลภมร

งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างเตรียมการ.....
เนื่องจากสถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการยังไม่พร้อม ชาวนายยังต้องการน้ำทำนาตลอด
เมื่อทำนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจึงจะดำเนินการได้.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สถานที่/พื้นที่ ดำเนินการโครงการ



(๔๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว
จากบ้านผู้ช่วยกันตถน คำก้อนแก้ว ไปทางบ้านนางนิตยา คอนเมฆ
งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๗๘,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ งบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๕ ตำบลตูบิว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๕ ตำบลตูบิว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม) จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๑/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายกฤษณะ พวงมาลัย
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
- โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๔๕) โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว
จากบ้านนายสุเทพ ตันติกำธน ไปทางบ้านนางบาง ตันติกำธน

งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓๘,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (เงินสะสม) จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๖/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง หาดฤๅษะ พวงผด้อย
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๕๕ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(๔๖) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
ทางแยกบ้านป่าเงิน วงพรม ผ่านบ้านนายอรุณ ไข่มุกข์ ไปสิ้นสุดบ้านนางมณี วงษ์วิจิตรต์ เชื่อมต่อ
ท่อระบายน้ำเดิมในซอยและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท (ก้นเงิน)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

A photograph of a narrow alleyway. On the left is a concrete wall with decorative blocks. On the right is a blue corrugated metal fence. The ground is gravel and dirt. In the background, there are trees and a building.

สถานที่/พื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

(๔๗) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลองชลประทานสาธารณะบริเวณหัวนา นางวรรณฯ กำลังหาญ หมู่ที่ ๒

งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท (กั้นเงิน)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

A photograph of a rural landscape. In the foreground, a paved road curves to the right, bordered by tall green grass and dense foliage on the left. In the background, there are traditional houses with tiled roofs, surrounded by trees and a clear sky. The text "สถานที่/พื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง" is overlaid in red on the left side of the image.

สถานที่/พื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

(๔๘) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙
บริเวณบ้านนางจำ สวัสดิ์ ไปทางบ้านคุณประภา ศรีนวล (ต่อจากจุดเดิม)

งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท (กั้นเงิน)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)



สถานที่/พื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

(๔๙) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๑๔

จากบ้านนางสาวอรุณี หีบทอง ไปทางบ้านนายสงค์ ศิลภมร (ต่อจากจุดเดิม)

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (กั้นเงิน)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมการ.....
เนื่องจากสถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการยังไม่พร้อม ชาวนายยังต้องการน้ำทำนาตลอด
เมื่อทำนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจึงจะดำเนินการได้.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล -
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

A photograph of a rural area. In the foreground, there is a wide, reddish-brown dirt road that curves slightly to the left. To the right of the road, there is a large, dense patch of green weeds and grass. Further back, a blue plastic barrel stands near a large, leafy tree. The background shows more trees, including palm trees, and a small white house with a brown roof. The sky is overcast with grey clouds. The entire image is framed by a green border with rounded corners.

สถานที่/พื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

(๕๐) โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ต่อจาก หมู่ที่ ๔ ไป หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖
(ต่อจากจุดเดิม)

งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท (กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)




สถานที่/พื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

(๕๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว
ถนนสาย รบ ๔๑๒๔ บริเวณสะพาน หมู่ที่ ๙ ไปทางรางรถไฟ หมู่ที่ ๒
งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๙๕,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายการตั้งจ่ายใหม่)
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างปิกเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว ตำบลคูบัว

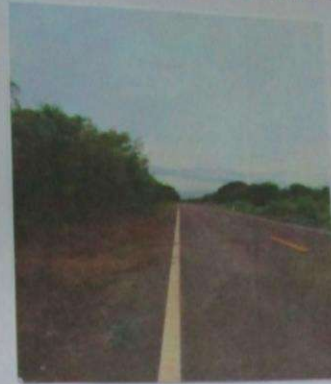

บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างปิกเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูบัว ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (รายการตั้งจ่ายใหม่) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๘/๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายสมพงศ์ ไชเซ่ง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๔ กันยายน ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๕๒) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้า/ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว บริเวณจากบ้านนายสมาน คำกองแก้ว และหลังบ้าน ส.อบต.สุทิน เทียนวงศ์ งบประมาณ ๕๙,๘๕๖.๘๙ บาท

☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๕๙,๘๕๖.๘๙ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล

☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
เลข หมู่ ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลเจ็ดอัมพวา
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๖๐๐๐

เลขวันที่ ๑๐/๙/๖๒
วันที่ ๕ ก.ย. ๖๒
ลงชื่อ ปัทมา วัชรพงศ์

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง คัดค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลคูบัว

อ้างถึง หนังสือเลขที่ รบ ๔๐๐๒/๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามที่หนังสืออ้างถึงขอให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี สํารวจประมาณการคิดค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้านหลังบ้าน ส.อบต.สุทิม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการประมาณการคิดค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.การดำเนินการ

๑.๑ แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอ.ร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- ติดตั้ง แร็ค ๒"๒๐๐ มม. จำนวน ๗ ชุด
- ร็อดออนเสา คอ.ร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (นำกลับมาใช้อีก)
- ร็อดออน แร็ค ๒"๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด (นำกลับมาใช้อีก)
- ติดตั้งสายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด และทำทาวเวอร์แรงต่ำ ๑ จุด
- ร็อดสายอูนิไคยม ๕๐ AW ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร (นำกลับมาใช้)
- พาดสายอูนิไคยม ขนาด ๕๐ AW ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทางประมาณ ๒๑๐ เมตร

๒.ค่าใช้จ่าย

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อ ๑. เป็นเงิน (รวมภาษี ๗%)

๕๕,๘๖๘.๘๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๕,๘๖๘.๘๙ บาท

(ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๓.กำหนดคืนราคาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

๓.๑ กำหนดการคืนราคาค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย

๓.๒ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปัทมา วัชรพงศ์

(นางลลิตา เล็กเจริญ)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๙ รักษาการแทนผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔



บรรยายภาพ

๑.วันที่ดำเนินการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

๒.สถานที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูบัว

๓. กิจกรรม อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔

๔.เป้าหมาย ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางออกกำลังกาย สัญจรในยามค่ำคืน

(๕๓) โครงการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายอัตโนมัติ (ลูกย่อย) ภายในตำบลคูบัว
งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องรับกระจายเสียงไร้สายภายในหมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๔,๑๕ รวม ๖ ชุม
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓๔๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

โครงการติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณเสียง เสียงไร้สายอัตโนมัติ (ถูกขอยก) ภายในตำบลคูบัว
(หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 14 และ 15 รวม 6 หมู่)
งบประมาณในการดำเนินการติดตั้งเสียง 500,000 บาท ค่าเงินการโดย



ติดตั้งที่ หมู่ที่ 5 บ้านตะโก ริมถนนสาย 3339 ตรงข้ามร้านค้าประชาวิธี




ติดตั้งที่ หมู่ที่ 6 บ้านสระโบสถ์ ซ้ำสะพานบ้านสระโบสถ์ ริมถนน ตรงข้ามศาลาหมู่บ้าน




ติดตั้งที่ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ริมถนนสาย 3339 บริเวณหน้าบ้านนาซัด ทุ่งทอง



ติดตั้งที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองยายแก้ว ซ้ำศาลารอโดยสวามิภักดิ์ของบ้านหนองยายแก้ว
ฝั่งตรงข้าม บ้านหนองยายแก้ว หมู่ 8 ซอย 6

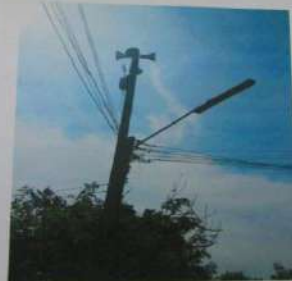

ติดตั้งที่ หมู่ที่ 14 บ้านนาหมุงต่อ บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้าน
บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 12/1 นางสาวสายดิน เกษมวงศ์

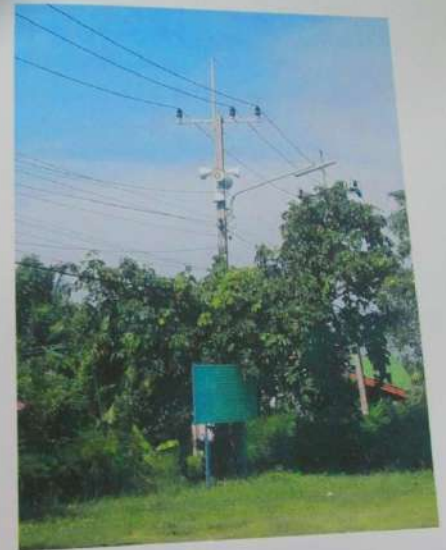

ติดตั้งที่ หมู่ที่ 15 บ้านไร่มะม่วง บริเวณทางโค้งริมถนนสาย 3339
บริเวณหน้าบ้าน นายสรวง คำแก้ว

(๕๔) โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา

ซ่อมแซมมอเตอร์ ปั๊มน้ำและระบบไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๙๕,๖๖๓.๕๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๔,๓๓๖.๕๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการ ซ่อมแซมมอเตอร์ , ป้อนน้ำและระบบไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12



บรรยายภาพ

1. วันที่ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

สถานที่ หมู่ที่ 12 ตำบลคูบัว

ซ่อมแซมมอเตอร์ , ป้อนน้ำและระบบไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๕๕) โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท


- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

เบิกจ่ายจริง ๒๔,๙๐๐ บาท

คงเหลือ ๕,๑๐๐ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัว อำเภอมือราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัว (อาคารเก่า)

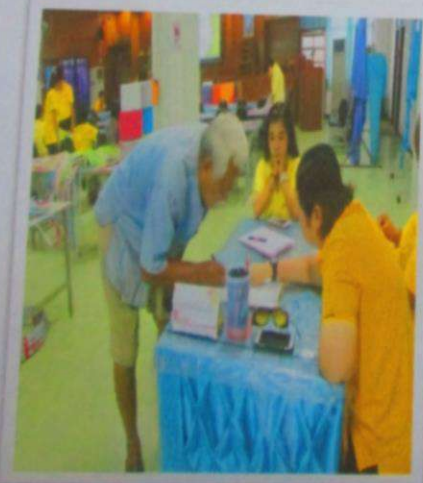

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม/ฝึกอาชีพ



(๕๖) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในตำบลคูบัว (หลังละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/หลัง)


เป้าหมายผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ : นางสาววิภารัตน์ กลิ่นสมบัติ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว
งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| ☒ | โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายจริง ๑๗,๗๕๔.๗๔ บาท |
| | แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ | คงเหลือ ๗๒,๒๔๕.๒๖ บาท |
| ☐ | สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | |
| ☐ | ยกเลิกโครงการ เหตุผล | |
| ☐ | ปัญหา/อุปสรรค | |

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในตำบลคูบัว
(หลังละไม่เกิน 30,000 บาท/หลัง)

เข้าฉายผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ นางสาววิภากรัตน์ กลิ่นสมมติ บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี

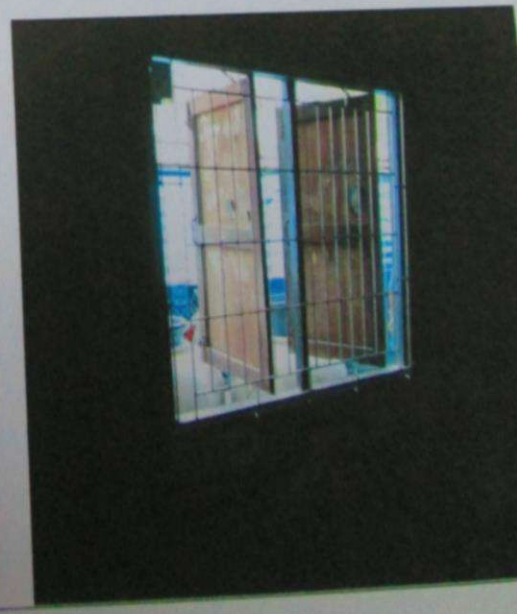

(๕๗) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุตำบลคูบัว

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท



โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เบิกจ่ายจริง ๑๔๒,๘๑๗ บาท

คงเหลือ ๗,๑๘๓ บาท



สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน



ยกเลิกโครงการ เหตุผล



ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว (อาคารเก่า ชั้น ๒)



ลงทะเบียน




ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม



(๕๘) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพด.) ตำบลคูบัว
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๔๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

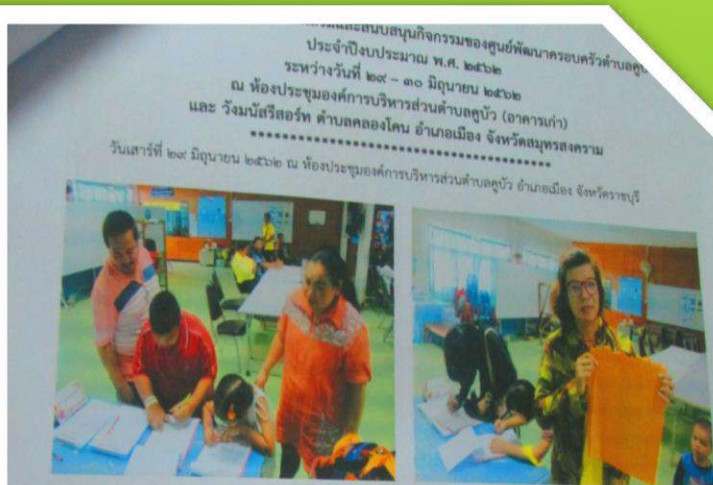

ลงทะเบียนพร้อมรับวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม



อาจารย์วัฒน์ คล้ายเคลื่อน ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคูบัว กล่าวรายงาน
 และลงทะเบียนพร้อมรับวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม



(๕๙) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๙,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒



(๖๐) โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๘๔,๙๕๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๕,๐๔๕ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



ตั้งใจทำข้อสอบก่อนการอบรม



นายชัยวัฒน์ อภิธมมกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว


ผู้กล่าวรายงานต่อหน้าประธานในพิธีเปิด

นายพจธูณศล ธนิกกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประธานในพิธีเปิด

๗๖๖๗ นายสม ๗ หิระคณิน
กวดมนต์น้อมอธิษฐานขอพรให้โครงการอบรมฯ ได้รับความสำเร็จ
เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์


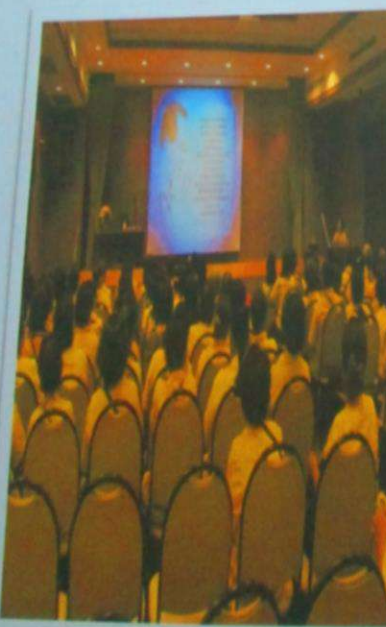


(๖๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๘,๙๓๒ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๐๖๘ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่าย โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

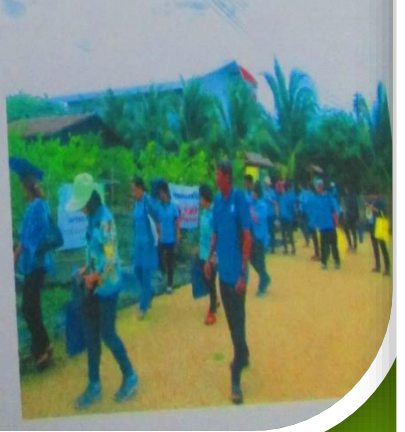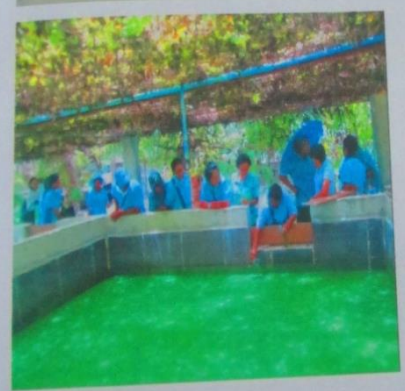

เผยแพร่โดย สุเมธ พระแก้ว 20 สิงหาคม เวลา 11:03 น.

***การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้าน
ใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ***
อบต.คูบัว ขอขอบคุณ คุณแรม เข้มขำ วิสาหกรรทำให้อยู่เข้าร่วมได้ความ
รู้ ความเข้าใจและยังช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างอุดมการณ์
ร่วมมือ-ช่วยเหลือนึงกันและกันร่วมปลูกฝังความดี สร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วย
ทั้งตัวเรา คนอื่น เพื่อให้สังคม ทุกด้านดีขึ้นไปพร้อมกัน (ความดีไม่มีขาย ถ้า
อยากได้ ต้องทำเอง) +++++ใช้ความดีของตนเอง สร้างตนและสร้างคนอื่น
ตามตัวชี้วัดความดี/คนดีในชุมชน ใช้ความดีเป็นตัวนำเป็นธนาคารความดี รับ
ฝากความดี รับฝากความสุข และค่าประกันตนเองจากสถาบันการเงินใน
ชุมชน+++++ขอให้ผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน ช่วยกันขยายความคิด ช่วยกัน
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ต่อودความรู้สู่การปฏิบัติ อย่างเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนาท้องถิ่น ตำบลคูบัวตามลำดับ



(๖๒) โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท



โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายจริง ๒๘,๖๒๐ บาท

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๒

คงเหลือ ๑,๓๘๐ บาท



สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน



ยกเลิกโครงการ เหตุผล



ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 และ เกษตรกรผู้ปลูกผัก และจำหน่ายผักปลอดภัย นายล้นทม สุพรรณโรจน์ ๕๔/๓ หมู่ ๑๑
 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม



นายแพทย์ มนัส พฤษสุนันท์
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน



วิทยากร.....นายสรณพงษ์ บัวโรย
 หัวข้อ.... เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการการเกษตรตามแนวทางอริยสัจสี่



นายอาลี มูฮำหมัด
 อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 หัวข้อ.....มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิตสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน



ผู้นำท้องที่ และประชาชนในตำบลคูบัว ผู้สนใจเข้าร่วม
 ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม



นายล้นทม สุพรรณโรจน์
 เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
 หัวข้อ...การปลูกผักปลอดสารพิษ และอาหารปลอดภัย



ผู้นำท้องที่ และประชาชนในตำบลคูบัว ผู้สนใจเข้าร่วม
 ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

(๖๓) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตตำบลคูบัว
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๖,๙๒๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒๓,๐๘๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ปีใหม่ 2562 เบิกบานหทัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ



เมาไม่ขับ



เปิดไฟ ใส่หมวก
ลดความรุนแรง

- ขับขี่ปลอดภัย
- เข้าใจกฎ
- ลดอุบัติเหตุ




สวมหมวกนิรภัย
100%



โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ในเขตตำบลคูบัว

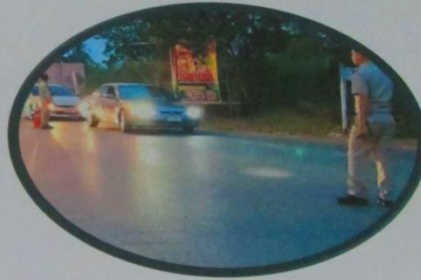


(๖๔) โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๘,๓๓๒ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒๑,๖๖๘ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

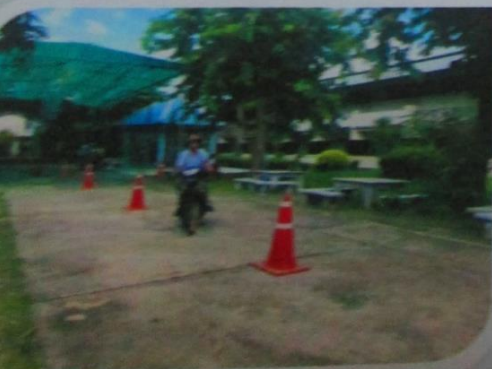

(๖๕) โครงการบำรุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ งานป้องกันฯ
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๓,๗๓๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๖,๒๗๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค


หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๖๖) โครงการอบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๓,๑๗๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๖,๘๒๕ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ณ ไร่รวงข้าวภูตะวัน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

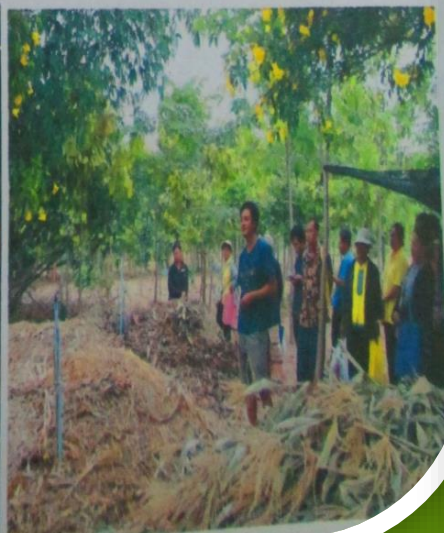

วิทยากรบรรยายโดย....กลุ่มเกษตรกรร่วมเย็นราชบุรี

(๖๗) อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรีตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อคุณภาพเพื่อการบริโภค

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว-.....
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☒ ยกเลิกโครงการ เหตุผลเนื่องจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรีไม่มีส่วนงานที่ออกใบสำคัญรับเงินอุดหนุน หัวหน้าหน่วยงานสำนักงานเกษตรจึงไม่ขอรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการ
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๖๘) โครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรประเภทข้าว

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

เบิกจ่ายจริง ๒๑,๒๕๒ บาท

คงเหลือ ๘,๗๔๘ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรประเภทข้าว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒



-๒-

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒



(๖๙) โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (งบกลาง)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๑๔,๔๖๔ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๘๕,๕๓๖ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



ได้แก่ ข้างขุดลอกทางระบายน้ำ
เปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกแก้ปัญหาหน้าท่วม กรณีเร่งด่วน

(๗๐) โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบกลาง)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

เบิกจ่ายจริง ๑๓,๕๖๑,๘๐๐ บาท

คงเหลือ ๔๓๘,๒๐๐ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



(๗๑) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ

งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (งบกลาง)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓,๐๖๕,๖๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒๓๔,๔๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



(๗๒) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท (งบกลาง)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

เบิกจ่ายจริง ๘๔,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

HIV



AIDS



(๗๓) โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูบัว (ประจำปี ๒๕๖๒)

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบกลาง)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๐ บาท
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ...ไม่ได้เบิกจ่าย.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๗๔) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูบัว (สปสช. ประจำปี ๒๕๖๒)

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (งบกลาง)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๗๕) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆในสัตว์เลี้ยง (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย)
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๕๔,๐๐๗.๒๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๕,๙๙๒.๘๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



(๗๖) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
งบประมาณ ๑๕๑,๒๔๐ บาท

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว-.....
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานไม่ได้ดำเนินการ.....
เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีเป้าหมายขอรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล -.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๗๗) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตำบลคูบัว

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๒
เบิกจ่ายจริง ๑๘๐,๐๗๐ บาท
คงเหลือ ๑๙,๙๓๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๗๘) โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว

งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| ☒ | โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายจริง ๒๓๒,๘๕๖ บาท |
| | แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ | คงเหลือ ๑๔๗,๑๔๔ บาท |
| ☐ | สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | -..... |
| ☐ | ยกเลิกโครงการ เหตุผล | -..... |
| ☐ | ปัญหา/อุปสรรค | -..... |

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

(๗๙) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว

งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๙๐๗,๐๘๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๔๒,๙๒๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๖

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียน
การสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. คูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
๒. วันที่ดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
๓. วันที่ดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

(๘๐) โครงการส่งเสริมการศึกษาออกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

เบิกจ่ายจริง ๒๘,๔๑๕ บาท

คงเหลือ ๒๑,๕๘๕ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๗
ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมการศึกษาออกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. สถานที่ วัดหนองหมี, นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒, วัดหนองหมี, นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดง

(๘๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

เบิกจ่ายจริง ๑๒,๖๘๒ บาท

คงเหลือ ๒,๓๑๘ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๘



ทีมงานประดิษฐ์โปสเตอร์



ทีมงานประดิษฐ์ภูมิทัศน์



หน้าที่ ๙

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็กในสังกัด อบ.ต.คูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. สถานที่ อาคารเรียน โรงเรียนวัดแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

(๘๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ของ อบต.คูบัว

งบประมาณ ๑,๐๒๑,๓๔๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- ☐ เบิกจ่ายจริง ๙๕๔,๐๔๓๓.๕๐ บาท
คงเหลือ ๖๖,๙๐๖.๕๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้า ๖
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปิงประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.คูบัว
 และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
๒. สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คูบัว ทั้ง ๓ แห่ง และโรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. ทั้ง ๔ แห่ง
๓. กิจกรรม การจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว และ
 สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ป.๖ ของโรงเรียนประถมสังกัดสพฐ.
๔. เป้าหมาย เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว และเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ.
 ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว

(๘๓) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๑,๖๕๒,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๕๒,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที ๖
ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนประถมสังักตพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลตุนัว
องค์การบริหารส่วนตำบลตุนัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ทศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
๒. สถานที่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังักตพฐ. ในเขตตำบลตุนัว จำนวน ๔ แห่ง
๓. กิจกรรม การอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังักตพฐ. ในเขตตำบลตุนัว
จำนวน ๔ แห่ง
๔. เป้าหมาย เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังักตพฐ. ในเขตตำบลตุนัว

(๘๔) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒
๒. สถานที่ โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว จำนวน ๔ แห่ง
๓. กิจกรรม อดทนกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว
๔. เป้าหมาย เด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว

(๘๕) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๘๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที ๗
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. สถานที่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว จำนวน ๔ แห่ง
๓. กิจกรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว

(๘๖) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรายวิทยา
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๐,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๖

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรยวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒

๒. สถานที่ โรงเรียนแคทรยวิทยา

๓. กิจกรรม ฝึกหัดงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรยวิทยา

(๘๗) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- ☐ เบิกจ่ายจริง ๕๐,๗๖๐ บาท
คงเหลือ ๖๙,๒๔๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๖

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



(๘๘) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๓,๕๕๙ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒๖,๔๔๑ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษาระบบและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. สถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอวังคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาฐานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม Workshop สรุปเนื้อหาการอบรมและศึกษาฐาน

(๘๙) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนแคทรายวิทยา ในสังกัด อบต.คูบัว

งบประมาณ ๓๐,๗๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓๐,๗๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๓. วันที่ดำเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

(๙๐) โครงการวันเด็กแห่งชาติ

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๘๒,๕๕๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๘๒,๕๕๕ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๘

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ บึงประมวณ ๒๕๖๒
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒. สถานที่ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๓. กิจกรรม กิจกรรมเล่นเกม กิจกรรมแถมบนเวที การแสดงบนเวที และจับสลากของรางวัล

หน้าที่ ๑๑



การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



การแสดงของกลุ่มเยาวชนต้นกล้า



(๙๑) โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว “คูบัวเกมส์ ให้ห่างไกลยาเสพติด”

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๙๕,๘๙๒ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ ๔,๑๐๘ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้า ๗
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๑๙-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. สถานที่ สนามกีฬาโรงเรียนเกษตรวิทยาคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๓. กิจกรรม การแข่งขันกีฬา ๖ ชนิดกีฬา และ พิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน
๔. เป้าหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลคูบัว ๔ แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว...โรงเรียนวัดแคทราย...โรงเรียนวัดบ้านไร่...และโรงเรียนวัดหนองปรือ



การแข่งขันฟุตบอล (ระดับประถมศึกษา)



การแข่งขันฟุตบอล (ระดับอนุบาล)




(๙๒) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกายยาเสพติด

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๑๒,๐๗๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๗,๙๓๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที ๗
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปิยะประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกีฬาสถาปัตยกรรม
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

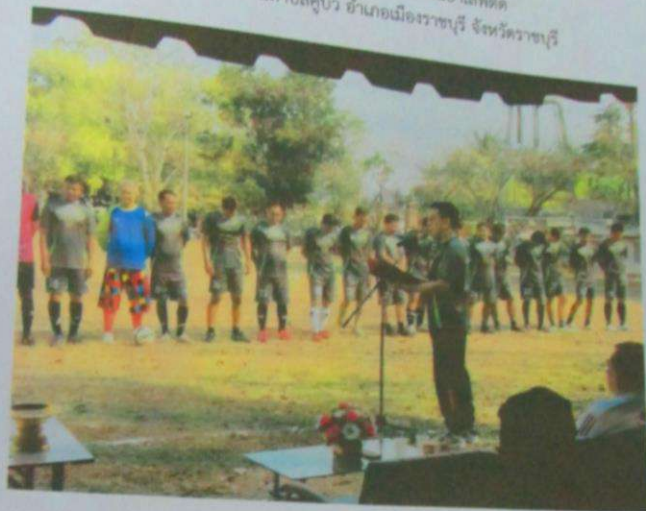

บรรยายภาพ

ซึ่งดำเนินการ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
 ที่ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว

หน้าที ๘



การแข่งขันฟุตบอล ๙ คน



การแข่งขันฟุตบอล ๙ คน



(๙๓) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๙๙,๕๕๑ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒๐,๔๔๙ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม



การประกวดแม่ข่ายสงฆ์สงกรานต์



กิจกรรมรำถวายพระพุทธรูปสุวรรณภูมิ



กิจกรรมสงฆ์น้ำพระ



(๙๔) โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๐,๖๓๙ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๔,๓๖๑ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๗
ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๘-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และวัดทุ่งราชภูมิศรีรัตนธรรม (วัดตากแดด) ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


(๙๕) โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าขึ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๔,๙๐๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒๕,๐๙๕ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค


หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๗
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปิงประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าขึ้นด้นจก) ไท-ยวน คูบัว
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

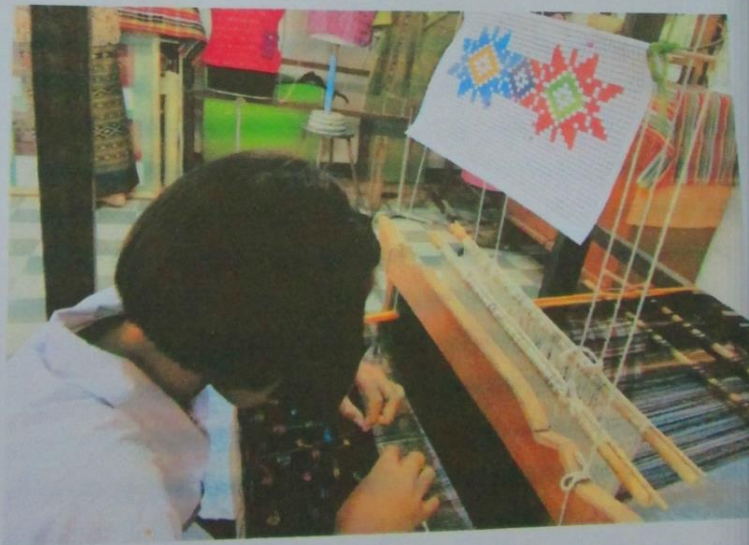

บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. สถานที่ โรงเรียนแคทรยวีทยา หมู่ ๑๒ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

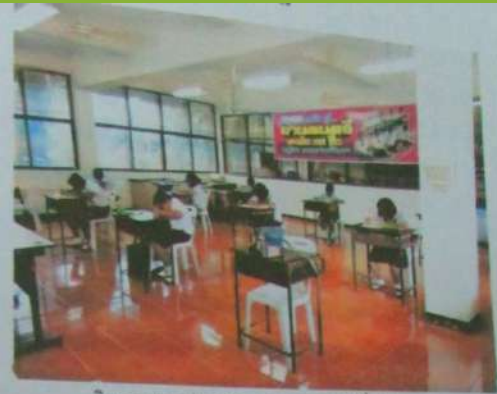

กิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าขึ้นด้นจก



กิจกรรมการประกวดทอผ้าขึ้นด้นจก



(๙๖) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๗๘,๖๓๖.๙๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๓๖๓.๐๕ บาท

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล

☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๗
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. สถานที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม



กิจกรรมการประกวดหุ่นนัวย่นพมาศ



(๙๗) โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย-ยวน

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๑๔,๘๐๑ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๓๕,๑๙๙ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๑๗
ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย-ยวน
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒. สถานที่ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๓. กิจกรรม การสาธิตการทำอาหารไทย-ยวน, การจัดแสดงซุ้มสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย-ยวน, กิจกรรมการขับร้อง, ขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมไทย-ยวน, กิจกรรมการเชิญโดกหลวง และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม

หน้าที่ ๑๘
ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

๒. สถานที่ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๓. กิจกรรม การเดินขบวนแห่วัฒนธรรมไทย-ยวน, การประกวดแม่ข่ายส่งท้ายสงกรานต์, การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมรดน้ำหัวไม้สงกรานต์


(๙๘) โครงการค่ายพุทธบุตร

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๔๙,๓๕๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๐,๖๕๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๗
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปิงประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการค่ายพุทธบุตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

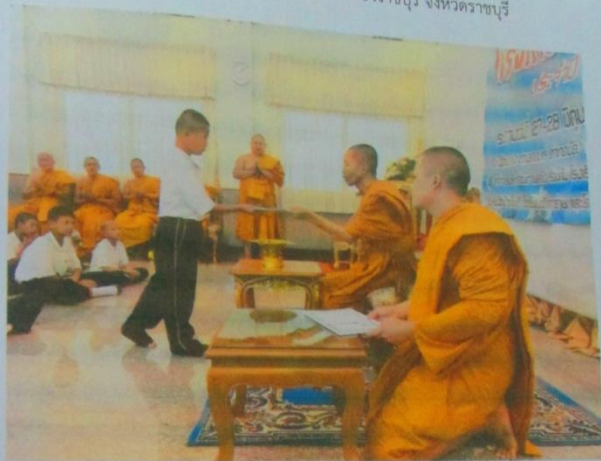


บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. สถานที่ วัดนวมทอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๓. กิจกรรม กิจกรรมบรรยายธรรมะ , กิจกรรมจิตอาสา , กิจกรรมเดินจงกรม , กิจกรรมนั่งสมาธิ-แผ่เมตตา , กิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตร

หน้าที่ ๘



กิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตร

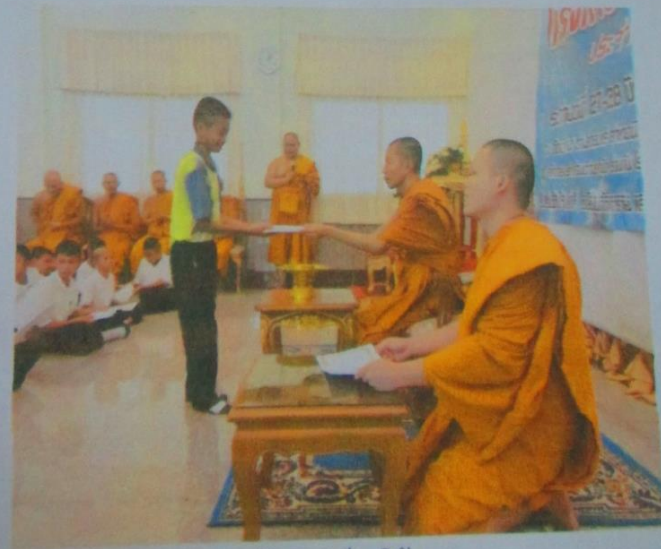

พิธีรับมอบเกียรติบัตร

(๙๙) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในตำบลคูบัว

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท



โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายจริง ๔๘,๙๕๒ บาท

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๒

คงเหลือ ๑,๐๔๘ บาท



สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน



ยกเลิกโครงการ เหตุผล



ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

แสดงผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. สถานที่ โรงเรียนแคทรายวิทยา ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๓. กิจกรรม กิจกรรมบรรยายธรรมะ , กิจกรรม Workshop , กิจกรรมมวอล์คแรลลี่ (Walk Rally) , กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ , กิจกรรมจุดเทียนแห่งความดี , การบรรยายและกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หน้าที่ ๙



กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์



กิจกรรมจุดเทียนแห่งความดี



(๑๐๐) โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๕,๐๕๖ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๔,๙๔๔ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หน้าที่ ๗
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปิงประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ...๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. สถานที่ โรงเรียนสตรีราชวิทยานุกูล ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๓. กิจกรรม การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การทำขลุ่ยเพียงออ และการทำของเล่นพื้นบ้าน

หน้าที่ ๘



กิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การทำขลุ่ยเพียงออ



การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การทำขลุ่ยเพียงออ



(๑๐๑) โครงการสนับสนุนอำเภอมืองราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง”

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๕,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ชิงชมประมาณ ๒๕๖๒
โครงการสนับสนุนอำเภอเมืองราชบุรี "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองไร่"
องค์การบริหารส่วนตำบลบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



๑. วันที่ดำเนินการ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๑. วันที่ดำเนินการ ๒๕... ๒๕... ๒๕...
๒. สถานที่ โรงเรียน... และบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

๒. สถานที่ โรงเรียนในเขตเมือง และชนบท

๓. กิจกรรม สนับสนุนการท่องเที่ยวและรางวัลที่จังหวัดบุรีรัมย์
เป้าหมาย ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

(๑๐๒) โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะล้นถังขยะ
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว-.....

☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานไม่ได้ดำเนินการ.....

ในการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเนื่องจากนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะจากผู้บริหารท้องถิ่นต้องการ
ขับเคลื่อนแนวทางลดปริมาณขยะจากต้นทาง ด้วยหลัก ๓R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรูปนำกลับมาใช้ใหม่
ให้ประชาชนต้องร่วมกันลดขยะให้เหลือน้อยลง และลดถังขยะให้มีจำนวนน้อยลง.....

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....

☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๑๐๓) โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๔๕,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๑,๐๔๕,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑,๐๓๔,๖๔๑.๒๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๐,๓๕๘.๗๕ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย



(๑๐๔) โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก

งบประมาณ ๐ บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒

เบิกจ่ายจริง ๐ บาท

คงเหลือ ๐ บาท

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล

☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการปลูกต้นไม้ / หญ้าแฝก



(๑๐๕) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำสาธารณะตำบลคูบัว

งบประมาณ ๐ บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานไม่ได้ดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๑๐๖) โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ (กำหนดให้มีกิจกรรมทุกวันวันพุธสัปดาห์แรกของทุกเดือน และในวันสำคัญ)

งบประมาณ ๐ บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล

☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ



องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กิจกรรม การรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ





(๑๐๗) โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๖,๘๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๒๒๓,๒๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว

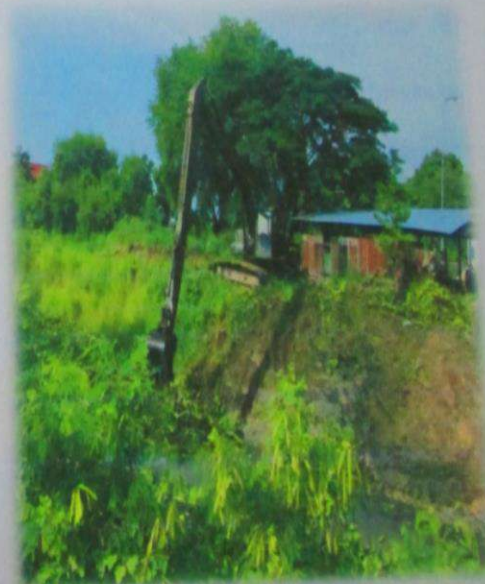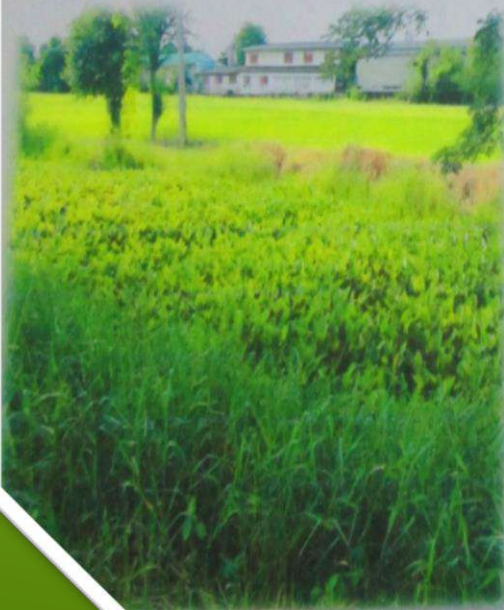

(๑๐๘) โครงการชุดลอกคลองซอย (คลองไล่ไก่)

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

เบิกจ่ายจริง ๔๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานบุคลากร
ในองค์กร

(๑๐๙) โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร กองช่าง อบต.คูบัว

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่)



(๑๑๐) โครงการ ๕ ส. ภายในองค์กร

งบประมาณ ๐ บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



(๑๑๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

เบิกจ่ายจริง ๔๗,๖๘๒ บาท

คงเหลือ ๑๕๒,๓๑๘ บาท

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๑๑๒) โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว-.....
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานไม่ได้ดำเนินการ.....
เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีประกาศกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๑๑๓) โครงการบำรุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.คูบัว

สำนักงานปลัดฯ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

กองคลัง งบประมาณ ๓๓,๗๐๐ บาท (๘๐,๐๐๐ - โอนลด ๔๖,๓๐๐)

กองการศึกษา งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

กองช่าง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 งบประมาณรวม ๔๘๓,๗๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓๕๑,๐๙๔.๓๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๓๒,๖๐๕.๖๕ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน-.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๑๑๔) โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท

☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล

☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๑๑๕) โครงการบริหารงานสำนักงาน

สำนักงานปลัดฯ	งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท	(๔๓๒,๐๐๐ + โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐)
กองคลัง	งบประมาณ ๑๑๕,๖๐๐ บาท	(๒๔๐,๐๐๐ - โอนลด ๑๒๔,๔๐๐)
กองการศึกษา	งบประมาณ ๒๒๘,๕๐๐ บาท	(๒๖๐,๐๐๐ - โอนลด ๓๑,๕๐๐)
กองช่าง	งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท	
	งบประมาณรวม ๙๑๖,๑๐๐ บาท	

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒
- เบิกจ่ายจริง ๔๙๙,๑๐๘.๑๗ บาท
คงเหลือ ๔๑๖,๙๙๑.๘๓ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

(๑๑๖) โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานและการให้บริการ ของ อบต.คูบัว
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๖,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานและการให้บริการของ อบต.คูบัว



สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่อง ประกาศรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ งาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้บริการ ดังนี้

๑. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม ไทยวน คูบัว
๒. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การให้บริการด้านถนน, ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง, การให้บริการด้านประปา) ที่สะท้อนถึงความพึงพอใจด้านคุณภาพ และด้านความคุ้มค่าประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.คูบัว
๓. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านการดำเนินงานสวัสดิการสังคม ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ
๔. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ ของ อบต.คูบัว และ
๕. ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมิน ดังนี้

๑. รายการสำรวจความพึงพอใจในงานให้บริการด้านการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม ไทยวน คูบัว ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านการขนานการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้
- ๑.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับคะแนนเต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

(๑๑๗) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานในหน้าที่

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๒,๔๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๗,๖๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

การอบรมส่งเสริมให้ความรู้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานในหน้าที่



(๑๑๘) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของ อบต.คูบัว งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๓,๘๗๕ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๑๒๕ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล / วารสาร / แผ่นพับ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำ
ของ อบต.คูบัว



(๑๑๙) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ ๐ บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)



โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๒

เบิกจ่ายจริง ๐ บาท

คงเหลือ ๐ บาท



สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน




ยกเลิกโครงการ เหตุผล



ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

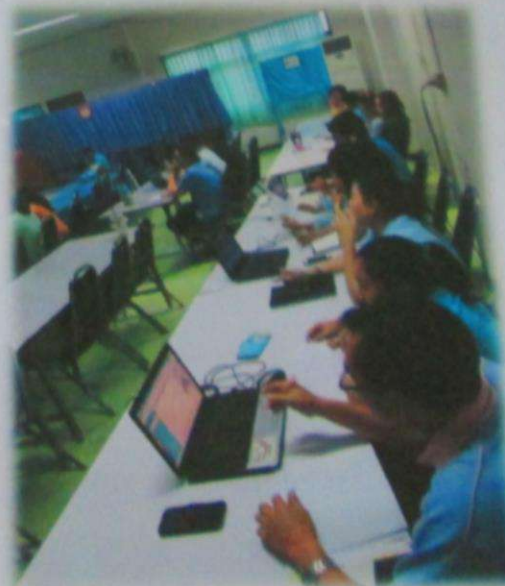

(๑๒๐) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
ผู้รับจ้างกำลังลงข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้งาน
ในระบบการจัดเก็บภาษีถูกต้องครบถ้วน.....
- ยกเลิกโครงการ เหตุผล -
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่)

(๑๒๑) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ☒ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓๔,๔๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑๕,๖๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. (กม.หมู่บ้าน หมู่ ๖)



รายการครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



(๑๒๒) แก้อื้อสำนักงานอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ตัว (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง อบต.คูบัว)
งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๘,๐๐๐ บาท

- ☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๕,๕๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล -.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเนกประสงค์ (2 ตัว)



(๑๒๓) โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๒ ตัว (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง อบต.คูบัว)

งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๑๐,๘๐๐ บาท

- ☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๐,๘๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

โต๊ะทำงานหลัก (2ตัว)



(๑๒๔) ตู้เก็บเอกสารหลัก จำนวน ๒ หลัง (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง อบต.คูบัว)
งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๕,๕๐๐ บาท

- ☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๔,๒๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ ๑,๓๐๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล -.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



(๑๒๕) จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๒ เครื่อง
(หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัด อบต.คูบัว)

งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๑,๔๐๐ บาท

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| ☒ | รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | เบิกจ่ายจริง ๑,๔๐๐ บาท |
| | แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑ | คงเหลือ ๐ บาท |
| ☐ | สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | -..... |
| ☐ | ยกเลิกโครงการ เหตุผล | -..... |
| ☐ | ปัญหา/อุปสรรค | -..... |

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)



(๑๒๖) ซ่อมบำรุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ฌ๒-๙๑๐๑
ราชบุรี รถบรรทุกขยะ คันสีเขียว (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัด อบต.คูบัว)

งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๒๑๑,๙๙๐.๑๐ บาท

- ☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๑๑,๙๙๐.๑๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)



(๑๒๗) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-กล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	จำนวน ๒ จุด	งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ บาท
-กล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	จำนวน ๓ จุด	งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณตั้งไว้จ่าย		๔๖๐,๐๐๐ บาท

- ☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ.....
ขั้นตอนเตรียมความพร้อมการขอดำเนินการจัดหาการทำหนังสือขออนุญาตพาดสาย Fiber Optic
กับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

(๑๒๘) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง)

(๑) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ตัว

(๒) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ตัว

งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๙๗,๔๐๐ บาท



รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายจริง ๙๔,๐๐๐ บาท

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒

คงเหลือ ๓,๔๐๐ บาท



สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....



ยกเลิกโครงการ เหตุผล -.....



ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

(2) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว



(๑๒๙) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด

(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

หมู่ที่ ๑,๓,๔,๖,๑๐,๑๑,๑๓ และหมู่ที่ ๑๕)

งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท



รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายจริง ๔๙๗,๐๐๐ บาท

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒

คงเหลือ ๑๑,๐๐๐ บาท



สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน



ยกเลิกโครงการ เหตุผล



ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

หน้าที่ ๗



หมู่ ๑



หมู่ ๓



หมู่ ๔



หมู่ ๖



หมู่ ๑๐



หมู่ ๑๑



หมู่ ๑๓



หมู่ ๑๕

(๑๓๐) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างถนน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๒๐ ชุด

(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง)

งบประมาณตั้งไว้จ่าย ๑๐๘,๐๐๐ บาท

- ☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๐๘,๐๐๐ บาท
แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๐ บาท
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล -.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างถนน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๒๐ ชุด



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างถนน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๒๐ ชุด จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ (รายการตั้งจ่ายใหม่) จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๓๖/๒๕๖๒
- ชื่อผู้รับจ้าง

โครงการที่เกินศักยภาพประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการเสนอขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้เสนอขอโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ถึง หมู่ที่ ๑๕ บ้านไร่โรงเจ ตำบลคูบัว (อบจ.ราชบุรี ปรับแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
- ๒) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบถนน ๓๓๓๙ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว
- ๓) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพธิ์ ตำบลคูบัว
- ๔) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- ๕) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลองระบายน้ำ ๘ ขวา แม่กลอง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลคูบัว
- ๖) โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว
- ๗) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านไร่โรงเจ ตำบลคูบัว

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อบจ.ราชบุรี ได้ดำเนินโครงการ

จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๗,๐๐๐ บาท

สรุปสถานะโครงการที่ดำเนินการ ดังนี้

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ถึง หมู่ที่ ๑๕ บ้านไร่โรงเจ ตำบลคูบัว (อบจ.ราชบุรี ปรับแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑) งบประมาณ ๔,๖๐๗,๐๐๐ บาท

- ☒ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....-
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -



โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการ

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบถนน ๓๓๓๙ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....กองช่าง อบจ.ราชบุรี

และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามได้ประชุมร่วมกับ อบต.คูบัว และผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒ มีมติ เรื่องการออกแบบขอให้สามารถแก้ไขปัญหาดูได้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของบ้านที่ปลูกสร้าง ต้นไม้ที่ปลูก รุกล้ำเข้าเขตทางหลวง ทุกหลังต้องให้ความยินยอมในการดำเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทำเอกสารที่มีการลงนามจากเจ้าของที่ดินทุกบ้านในเขตที่จะดำเนินโครงการ โดยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสาน และเจ้าหน้าที่หมวดการทางจะเข้าตัดต้นไม้ในเขตทางหลวง ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากแขวงทางหลวง และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่เกินศักยภาพต้องขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการของ อบจ.ราชบุรี อีกครั้ง เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณงานก่อสร้างและการประมาณราคาในงานก่อสร้างใหม่ และต้องขอปรับย้ายช่องปิงงบประมาณออกไปอีก ๒-๓ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณที่จะดำเนินการจริง.....

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล -

☐ ปัญหา/อุปสรรค -



สถานที่/พื้นที่ ดำเนินโครงการ

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการ

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพธิ์ ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....ยังไม่ได้ดำเนินการ.....
รอการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ จาก อบจ.ราชบุรี.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....



สถานที่/พื้นที่ ดำเนินโครงการ

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการ

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๑,๑๕๑,๐๐๐ บาท

- ☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....กองช่าง อบจ.ราชบุรี
อยู่ระหว่างตั้งเรื่องดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมชลประทาน ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ และอบต.คูบัว จะต้องดำเนินการประสานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขอแก้ไขย้ายช่องปิงงบประมาณตั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้งในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อรองรับการจัดทำโครงการ
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค



สถานที่/พื้นที่ ดำเนินโครงการ

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ๘ ขวา แม่กลอง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ระหว่างเตรียมการ.....
ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขอแก้ไขย้ายช่องปิงงบประมาณและแก้ไขชื่อคลองในโครงการให้ตรงกับชื่อโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหน่วยเจ้าของงบประมาณได้ขออนุญาตการก่อสร้างจากกรมชลประทานซึ่งได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค



สถานที่/พื้นที่ ดำเนินโครงการ

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการ

โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว
งบประมาณ ๑,๑๕๑,๐๐๐ บาท

☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....กองช่าง อบจ.ราชบุรี
ให้ประสาน อบต.ดอนตะโก เรื่องของการออกแบบเพื่อให้โครงการขยายผิวจราจรถนน
บรรจบเส้นทางระหว่างสองตำบลพร้อมกัน และในเรื่องของการย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้มีปัญหา
แนวเขตทางรวมทั้ง ที่อยู่อาศัย ร้านค้าสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำเข้ามาถนน ซึ่งทุกหลังต้อง
ให้ความยินยอมในการดำเนินโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการทำงาน
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ช่วยเจรจาความต้องการใช้ระยะเวลาเตรียม
สถานที่ให้พร้อม เหมาะสมตามขั้นตอนประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่เกินศักยภาพ
ของ อบจ.ราชบุรี.....

☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล -

☐ ปัญหา/อุปสรรค -



สถานที่/พื้นที่ ดำเนินโครงการ

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านไร่โรงเจ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี

งบประมาณ ๕,๒๖๑,๐๐๐ บาท *****ระยะเวลาคาดว่าจะจัดซื้อ/จัดจ้างบ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☐ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....อยู่ระหว่างเตรียม.....
ความพร้อมโครงการ ของ อบจ.ราชบุรี ปีงบประมาณก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....



สถานที่/พื้นที่ ดำเนินโครงการ



โครงการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้เสนอขอทั้งสิ้น ๖ โครงการ

ลักษณะของโครงการ

๑. การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เสนอขอ ๓ โครงการ

๑.๑ โครงการขุดลอกคลองราชินี หมู่ที่ ๑๒ ถึง หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว

๑.๒ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านสวน ถึง หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว

๑.๓ โครงการขุดลอกคลอง ลำเหมืองอีดอก หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว

๒. การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เสนอขอ ๒ โครงการ

๒.๑ โครงการก่อสร้างหอดังสูงเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว

๒.๒ โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว

๓. การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ เสนอขอ ๐ โครงการ

๔ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน เสนอขอ ๐ โครงการ

๕ การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย

๕.๑ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก กาดวิถีชุมชนคูบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว

ซึ่งกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ

รวมจำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๐๗๕,๐๐๐ บาท

***สรุปสถานะโครงการที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว

ก่อสร้างหอถังสูงชนิดท่อเหล็กขึ้นรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร พร้อมฐานราก คสล. แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัวกำหนด

วงเงินงบประมาณ ๑,๘๔๑,๐๐๐ บาท

- ☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....อยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค

สถานที่/พื้นที่ ที่จะดำเนินโครงการ



๒. โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว

ก่อสร้างวางท่อเมนประปา ชนิด HDPE ชั้นคุณภาพ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๑๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ยาวรวม ๔๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัวกำหนด และตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด
วงเงินงบประมาณ ๑,๑๕๖,๐๐๐ บาท

- ☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....อยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล-.....
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค -.....



สถานที่/พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง



๓. โครงการขุดลอกคลองลำเหมืองอีตอก หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว

ทำการขุดลอกคลอง ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐.๒๐ ลบ.ม.
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว กำหนด

วงเงินงบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท

- ☐ รายการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ☒ สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการดำเนินงาน.....อยู่ระหว่างดำเนินการ.....
- ☐ ยกเลิกโครงการ เหตุผล
- ☐ ปัญหา/อุปสรรค



สถานที่/พื้นที่ ดำเนินโครงการ

เอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ใช้อ้างอิงในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร
แสดงให้เห็นถึงคุณค่า หรือผลสำเร็จจากการใช้งบประมาณ
ความคุ้มค่างบประมาณ ประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนได้รับ
และส่วนราชการได้รับ

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. งาน จัดซื้อวัสดุ (ลูกรัง หินคลุก)

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๙๖
- ☐ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่ ๑ ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☐ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☐ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.
- กอง/สำนัก กองช่าง
- ปฏิทินแผนการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒
 - ระยะเวลาดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒
 - ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม กองช่าง
 - สรุปรายงานเมื่อ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อบำรุงรักษาทางให้ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย /ผลผลิต/ ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
	เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะรวม ๑๕ หมู่บ้านภายในตำบลคูบัว ใช้วัสดุรวม ๕๓๙ คิว	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (✓) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่ ภายในตำบลคูบัว

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

- () มาก () ปานกลาง () น้อย
() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน
() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงกันยายน ๒๕๖๒

สรุป () ดำเนินการก่อน (✓) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ใช้จ่ายจริง ๑๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๓๘,๓๐๐.๐๐ บาท

- สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ
(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....
(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ
() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....
() ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง
() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม
() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๖. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. เตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนดำเนินการตามโครงการ	☒ ตามกำหนดโครงการ
๒. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ	☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
๓. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง/พัสดุ	
๔. ดำเนินการจัดซื้อจ้างตามขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
๕. การตรวจการจ้าง/หลักฐานการเบิกจ่าย	
๖. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ /รายงานผลหลังจากสิ้นสุดโครงการ	

๖.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก (✓) เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๖.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (✓) พอดี () น้อยเกินไป

๖.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

() ได้รับความร่วมมือดีมาก (✓) ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

() ได้รับความร่วมมือดีมาก (✓) ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

() ได้รับความร่วมมือดีมาก (✓) ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (✓) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑.ร้อยละของพื้นที่ได้รับความสะดวก	๑.สถานที่/พื้นที่ลงลูกวิ่งหินคลุก ลูกวิ่ง และเกิดประโยชน์อย่างชัดเจน และคุ้มค่าต่อประชาชน ๒.ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรใน ยามค้าคืน	☐ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☐ สอบถาม ☐ ตรวจสอบ ☐ ทดสอบ ☐ เก็บข้อมูล

๘. ภาพรวม

๘.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ) -

- () จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- () ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (✓) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (/) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (✓) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ) -

- () งาน/โครงการ /กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
- () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
- () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

(โปรดระบุกิจกรรม).....

เพราะ.....

- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ

- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรม
ล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง

- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)

เพราะ.....

- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๘.๓ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

๘.๔ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

๙. สรุปโครงการนี้ เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนภายในตำบลคูบัว

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายชาญชัย ผาแสนถิ่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

- ให้อำเภอสรรค

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชฎามาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ อภิธูมนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการตัดสินใจสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทศม


ลงชื่อ.....

(นายพจธณศร ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

...../...../.....

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปังบประมาณ ๒๕๖๒
 ภาพถ่ายผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ (ลูกรัง หินคลุก)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 (ภาพตัวอย่าง)

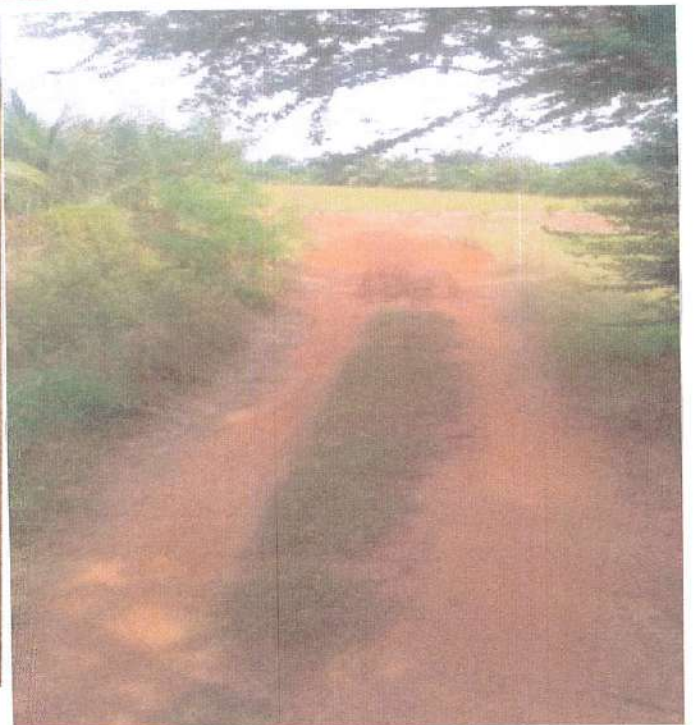

บรรยายภาพ

- ๑.วันที่ดำเนินการ เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
- ๒.สถานที่ ภายในตำบลคูบัว
๓. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ (ลูกรัง หินคลุก)
- ๔.เป้าหมาย ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

1. ชื่อโครงการ / งาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) หน้า 79 ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ด้านที่..... ☒ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองช่าง

ปฏิทินแผนดำเนินงาน ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ มีนาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2562

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม กองช่าง

สรุปรายงานเมื่อ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

2. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสำหรับประชาชนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
2				☐ บรรลุบางรายการ
3				☒ บรรลุทุกรายการ
4				☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์
5				☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการ
				☐ ดำเนินงานต่อเนื่องอีก

3. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (สายเลียบรินคลองชลประทานทางบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อดำบลบ้านไร่) กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.คูบัว กำหนด	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
				☐ บรรลุเป้าหมาย
				☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
				☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
				☐ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ
				☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☒ เท่ากับเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย

4. สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูบัว

1. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

☐ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย

☐ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

☐ ไม่เหมาะสม เพราะ.....

5. วันที่ดำเนินการ 30 มีนาคม 62 - 13 พฤษภาคม 2562

สรุป ☐ ดำเนินการก่อน ☐ ตรงตามแผน ☒ เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

6. งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท

ใช้จ่ายจริง 167,000 บาท

คงเหลือ 33,000 บาท

ใช้เกิน - บาท

สรุป ☐ มากกว่างบประมาณ ☐ พอดีกับงบประมาณ

☒ น้อยกว่างบประมาณ ☐ ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

☐ การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

☐ การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

☐ ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

☐ เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

☐ เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

☐ ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

6. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
1. เตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนดำเนินการตามโครงการ	☒ ตามกำหนดโครงการ
2. ดำเนินโครงการจัดซื้อจ้างตามขั้นตอน โดยวิธีตกลงราคา	☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
3.	
4.	
5.	

6.1 ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

☒ เป็นที่น่าพอใจมาก ☐ เป็นที่น่าพอใจ ☐ ยังต้องปรับปรุง

6.2 จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

☐ มากเกินไป ☐ พอดี ☐ น้อยเกินไป

6.3 ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

☐ ได้รับความร่วมมือดีมาก ☐ ได้รับความร่วมมือพอสมควร ☐ ได้รับความร่วมมือน้อย

6.4 ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

☐ ได้รับความร่วมมือดีมาก ☐ ได้รับความร่วมมือพอสมควร ☐ ได้รับความร่วมมือน้อย

6.5 ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

☐ ได้รับความร่วมมือดีมาก ☐ ได้รับความร่วมมือพอสมควร ☐ ได้รับความร่วมมือน้อย

6.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

- ☐ จำนวนมากเกินไป ☐ จำนวนพอดี ☐ จำนวนน้อยเกินไป

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.ความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร	☐ สังเกต
2.		☐ สัมภาษณ์
3.		☒ สอบถาม
4.		☒ ตรวจงาน
5.		☐ ทดสอบ
		☐ เก็บข้อมูล

8. ภาพรวม

8.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- ☐ จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
☐ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
☒ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ☒ มาก ☐ เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว ☐ มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
☒ ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
☐ ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 ปัญหาและอุปสรรค

- ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและเขียนแบบแปลน
☐ งาน/โครงการ /กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
☐ งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
☐ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
☐ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

- ☐ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

- ☐ กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

(โปรดระบุกิจกรรม).....

เพราะ.....

- ☐ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ

- ☐ ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรมล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง

- ☐ เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)

เพราะ.....

- ☐ อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

8.3 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

8.4 ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

9. สรุปโครงการนี้ เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

☒ ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ ... มีเงินอุดหนุน ที่จ. ดำเนินการ ได้สร้าง อีก มาก

☐ ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายชาญชัย ผาแสนเถิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

- ใจดีใจดี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาภา พิบูลธรรมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ อภิธรรมกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการตัดสินใจสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

(ลงชื่อ).....

(นายพจณศร ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

...../...../.....

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ภาพถ่ายผลการดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3



บรรยายภาพ

1. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 200,000 บาท
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 167,000 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 16/2562
5. ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
7. วันที่ทำสัญญา 30 มีนาคม 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562
10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

1. ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☐ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ 2561-2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 8
- ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ด้านที่..... ☒ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองช่าง

ปฏิทินแผนดำเนินงาน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562

ระยะเวลาดำเนินการจริง ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม กองช่าง

สรุปรายงานเมื่อ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

2. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและป้องกันปัญหาน้ำท่วมภายในหมู่บ้านไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
2				☐ บรรลุบางรายการ
3				☒ บรรลุทุกรายการ
4				☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์
5				☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการ
				☐ ดำเนินงานต่อเนื่องอีก

3. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย /ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 1.60 เมตร ตามแบบแปลน อบต.คูบัวกำหนด	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
2				☐ บรรลุเป้าหมาย
3				☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
4				☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
5				☐ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ
				☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☒ เท่ากับเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย

4. สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคูบัว

1. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

☐ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย

☐ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

☐ ไม่เหมาะสม เพราะ.....

5. วันเวลาที่ดำเนินการ 7 มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562

สรุป ☐ ดำเนินการก่อน ☒ ตรงตามแผน ☐ เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

6. งบประมาณ ตั้งไว้ 240,000 บาท

ใช้จ่ายจริง 240,000 บาท

คงเหลือ 0 บาท

ใช้เกิน - บาท

สรุป ☐ มากกว่างบประมาณ ☒ พอดีกับงบประมาณ

☐ น้อยกว่างบประมาณ ☐ ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

☐ การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

☐ การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

☐ ประหยัดค้ำค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

☐ เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

☐ เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

☐ ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

6. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
1.เตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนดำเนินการตามโครงการ	☒ ตามกำหนดโครงการ
2.ดำเนินการจัดซื้อจ้างตามขั้นตอน โดยวิธีตกลงราคา	☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
3.	
4.	
5.	

6.1 ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

☒ เป็นที่น่าพอใจมาก ☐ เป็นที่น่าพอใจ ☐ ยังต้องปรับปรุง

6.2 จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

☐ มากเกินไป ☐ พอดี ☐ น้อยเกินไป

6.3 ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

☐ ได้รับความร่วมมือดีมาก ☐ ได้รับความร่วมมือพอสมควร ☐ ได้รับความร่วมมือน้อย

6.4 ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

☐ ได้รับความร่วมมือดีมาก ☐ ได้รับความร่วมมือพอสมควร ☐ ได้รับความร่วมมือน้อย

6.5 ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

☐ ได้รับความร่วมมือดีมาก ☐ ได้รับความร่วมมือพอสมควร ☐ ได้รับความร่วมมือน้อย

6.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

- ☐ จำนวนมากเกินไป ☐ จำนวนพอดี ☐ จำนวนน้อยเกินไป

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.จำนวนสถานที่ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้	สถานที่/พื้นที่ก่อสร้างนั้นเกิดผลสำเร็จตามแบบและคุณภาพเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนและคุ้มค่าต่อประชาชน	☐ สังเกต
2.		☐ สัมภาษณ์
3.		☒ สอบถาม
4.		☒ ตรวจสอบ
5.		☐ ทดสอบ
		☐ เก็บข้อมูล

8. ภาพรวม

8.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- ☐ จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- ☐ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- ☒ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ☒ มาก ☐ เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว ☐ มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- ☒ ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ☐ ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 ปัญหาและอุปสรรค

- ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและเขียนแบบแปลน
- ☐ งาน/โครงการ /กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
- ☐ งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
- ☐ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ☐ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

- ☐ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

- ☐ กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

(โปรดระบุกิจกรรม).....

เพราะ.....

- ☐ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ

- ☐ ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้เงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรมล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง

- ☐ เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)

เพราะ.....

- ☐ อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

8.3 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

8.4 ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

9. สรุปโครงการนี้ เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

☒ ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ *ถือว่าดี รวดเร็ว พอที่จะทำได้ อีก*

☐ ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้รายงาน

(นายชาญชัย ผาแสนเงิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

..... *- ไม่ขอไปรบกวน*

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวชญามาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

..... *[Signature]*

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นายชัยวัฒน์ อภิธมมกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการตัดสินใจสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

..... *[Signature]*

(ลงชื่อ).....

(นายพจวนศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

...../...../.....

[illegible]



บรรยายภาพ

1. ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2562 จำนวน 240,000 บาท
3. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา จำนวน 240,000 บาท
4. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา 26/2562
5. ชื่อผู้รับจ้าง นายธีรนาท แก้วสว่าง
6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา
7. วันที่ทำสัญญา 7 มิถุนายน 2562
8. ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
9. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ 6 สิงหาคม 2562
10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

โรงเรียนวัดป่าสัก ๒๕๖๒

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(งบประมาณปี ๒๕๖๒)

No5

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

- ☒ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☐ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๑๐๒
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่ ๑ ☒ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองช่าง

- ปฏิทินแผนการดำเนินงาน มกราคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลาดำเนินการจริง มิถุนายน ๒๕๖๒ - กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม กองช่าง
- สรุปรายงานเมื่อ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและป้องกันปัญหาน้ำท่วมภายในหมู่บ้านไม่ให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	ก่อสร้างวางท่อ ขนาดท่อ ๘ ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๑.๒๐ จำนวน ๘ บ่อ ยาว ๘๖ เมตร	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☐ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สกกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลควบัว

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

- (/) มาก () ปานกลาง () น้อย
() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน
() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๓๐ วัน)

สรุป () ดำเนินการก่อน () ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน (ขอปรับแผน)

๖. งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ใช้จ่ายจริง ๒๒๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือ - บาท

ใช้เกิน - บาท

- สรุป () มากกว่างบประมาณ (/) พอดีกับงบประมาณ
() น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....
() การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ
() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....
() ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง
() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม
() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๖. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. เตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนดำเนินการตามโครงการ	☒ ตามกำหนดโครงการ
๒. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ	☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
๓. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง/พัสดุ	
๔. ดำเนินการจัดซื้อจ้างตามขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
๕. การตรวจการจ้าง/หลักฐานการเบิกจ่าย	
๖. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ /รายงานผลหลังจากสิ้นสุดโครงการ	

๖.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

- (/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๖.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

- () มากเกินไป () พอดี () น้อยเกินไป

๖.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- () ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

- () ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- () ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

- () จำนวนมากเกินไป () จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ /วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑.จำนวนสถานที่ดำเนินการแก้ไขปัญห ได้	๑.สถานที่/พื้นที่ก่อสร้างนั้นเกิดผล สำเร็จตามแบบและคุณภาพเกิด ประโยชน์อย่างชัดเจนและคุ้มค่าต่อ ประชาชน ๒.สามารถระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	☐ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☐ สอบถาม ☐ ตรวจสอบ ☐ ทดสอบ ☐ เก็บข้อมูล

๘. ภาพรวม

๘.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- () จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- () ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (/) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (/) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ ปัญหาและอุปสรรค

- () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
- () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
เพราะ.....
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เพราะ ตรวจสอบงบประมาณจากกองคลัง ปรากฏว่ามีงบประมาณเพียงพอใน-
การดำเนินโครงการดังกล่าว
- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
(โปรดระบุกิจกรรม).....
เพราะ.....
- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ
- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรม
ล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
- () อื่นๆ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยจึงไม่สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามความยาวของถนนได้

๘.๓ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

๘.๔ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

๙. สรุปโครงการนี้ เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

() ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ มีพื้นที่ในการก่อสร้าง

(/) ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ โครงการก่อสร้างสมบูรณ์

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายชาญชัย ผาแสนเถิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อไปต่อทง.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญามาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ อภิธมมนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการตัดสินใจสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ลงชื่อ.....

(นายพจธณศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการขุดลอกคลอง พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว



บรรยายภาพ

๑. ปริมาณงาน ขุดลอกคลอง พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒
๓. ค่าก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา
๔. ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญา ๒๗ /๒๕๖๒
๕. ชื่อผู้รับจ้าง นายธีรนาท แก้วสว่าง
๖. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเจาะจง
๗. วันที่ทำสัญญา ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๘. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๙. โครงการแล้วเสร็จเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว.....ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน.....

ที่.....๗๓๕๐๑/.....วันที่.....๒ กันยายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน.....
ประจำปี ๒๕๖๒.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่ข้าพเจ้า นายธีรภัทร กลิ่นมงคล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน ปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลคูบัว (อาคารเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอส่งรายงานผลการดำเนิน โครงการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธีรภัทร

(นายธีรภัทร กลิ่นมงคล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว
(เพื่อโปรดทราบ)

(นางสาวชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นของรองปลัด อบต.คูบัว

(เพื่อโปรดทราบ)

ความเห็นของปลัด อบต.คูบัว

(นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

(นายชัยวัฒน์ อภิภูมุนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น/ข้อพิจารณาสั่งการของนายก อบต.คูบัว

ทรง

(นายพจวรรณศ ธิติกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑. **ชื่อโครงการ** ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑.๑ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ๑.๒ ☒ มีในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒๙ ลำดับที่ ๑
- ๑.๓ ☒ มีในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- ๑.๔ ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๖) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา ๖๘ (๗) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- ๑.๕ ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ มาตรา ๑๖ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ ๓.๑๐ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- ๑.๖ งานฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
- ๑.๗ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑ วัน
- ๑.๘ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรภัทร กลิ่นมงคล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ๑.๙ สรุปรายงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. วัตถุประสงค์ สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของตำบลคูบัว ให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพ นำมาสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนและครอบครัว	✓		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ ต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต / ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต / ตัวชี้วัดของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	- ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลคูบัวที่สนใจฝึกอบรม จำนวน ๖๐ คน	✓		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

/สรุป ผลการดำเนิน...

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (☒) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว(อาคารเก่า) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๔.๑ สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(☒) มาก () ปานกลาง () น้อย

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สรุป () ดำเนินการก่อน (☒) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณ

ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐	บาท
ใช้จ่ายจริง	๒๔,๙๐๐	บาท
คงเหลือ	๕,๑๐๐	บาท
ใช้เกิน	๐	บาท

- สรุป
- ☒ น้อยกว่างบประมาณ
 - ☒ การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ
 - ☒ ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
 - ☒ เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

๗. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. ประชาสัมพันธ์และทำแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลคูบัว	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
๒. สำรวจความต้องการของประชาชน	
๓. จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการตามจำนวนของแบบตอบรับ	
๔. ประสานงานด้านวิทยากร	
๔.๑ วิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีพ	
๔.๒ วิทยากรภาคปฏิบัติจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกอาชีพ	
๕. แบ่งหน้าที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน	
๖. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
๗. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกสอนอาชีพ	
๘. สรุปปัญหาและประเมินผลการดำเนินโครงการ	

๗.๑. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

☒ เป็นที่น่าพอใจ

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

☒ พอดี

- ๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ☒ ได้รับความร่วมมือดีมาก
- ๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ☒ ได้รับความร่วมมือดีมาก
- ๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ ได้รับความร่วมมือดีมาก
- ๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงพอ ☒ จำนวนพอดี

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย (๖๐ คน)	- มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๖๖	การบันทึก โดยลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม
๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ (ภาพรวม) ไม่ต่ำกว่าระดับมาก จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ(โดยรวม) ระดับไม่ต่ำกว่ามาก คะแนนรวม ๔๐๗๓ จาก ๔๘๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๕	แบบสำรวจความพึงพอใจ

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้

- ๙.๑.๑ ประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์นำไปเป็นอาชีพเสริมได้จริง และสามารถทำเพื่อใช้งานจริงได้
- ๙.๑.๒ ประชาชนเห็นว่าการอบรม/การให้บริการดีมาก และอยากให้มีการฝึกอบรมอีกในครั้งต่อไป
- ๙.๑.๓ มีการนำปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการจัดทำโครงการครั้งก่อนมาแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ต่อยอดการทำหุ้หั่ว/ฝาคัด, เตรียมพร้อมการฝึกอบรมเกินเวลาที่กำหนดจนसानเสร็จ

๙.๒ ปัญหาและอุปสรรค

- ๙.๒.๑ ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไปทำให้บางคนยังสานเสร็จไม่ทัน ต้องขยายเวลาเพิ่มให้ทำต่อจนเสร็จ
- ๙.๒.๒ ตะกร้ามีการขึ้นรูปส่วนพื้นไว้แล้ว เพื่อความรวดเร็วในการฝึกทำส่วนประกอบต่างๆ เช่น หุ้หั่ว ฝาคัด เป็นต้น ทำให้หลายคนที่ไม่เคยทำไม่สามารถสานตั้งแต่เริ่มต้นเองได้

๙.๓ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- ๙.๓.๑ ปรับเวลาให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพอื่นๆ เพิ่มเวลาในการลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด
- ๙.๓.๒ ควรจัดแบ่งฝึกอาชีพเป็นกลุ่มๆตามที่สนใจ เช่น แบ่งกลุ่มสานขึ้นรูปกับกลุ่มสานส่วนประกอบ หรือ เพิ่มหลักสูตรและแบ่งกลุ่มหรือแบ่งวันอบรม เช่น กลุ่มฝึกสานตะกร้า/กลุ่มฝึกทำขนมแปรรูปอาหาร ฯ

๙.๔ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- ๙.๔.๑ ควรนำผ้าจก, ผ้าทอมือ หรือสินค้าอื่นๆในท้องถิ่น มาใช้ตกแต่งตะกร้า เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

สรุปโครงการนี้ เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(✓) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าประโยชน์ สามารถนำผลิตภัณฑไปใช้สอยได้จริง นำไปประกอบอาชีพได้ และสามารถต่อยอดนำไปผสมผสานกับผลิตภัณฑเดิมของชุมชนได้


() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป เพราะ.....

ลงชื่อ  ผู้รายงาน


(นายธีรภัทร กลิ่นมงคล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ

..... 


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

..... 

ลงชื่อ..... 

(นางสาวชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..... 


(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของรองปลัด อบต.คูบัว

..... 

ความเห็นของปลัด อบต.คูบัว

..... 

ลงชื่อ..... 

(นางสาวชฎามาศ พิบูลแถว)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ลงชื่อ..... 

(นายชัยวัฒน์ อธิฐมนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นและการพิจารณาสั่งการของนายก อบต.คูบัว

..... 

ลงชื่อ 

(นายพจธณศ ธนิกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/

วันที่

๒๓

กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแบบประเมินการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว(อาคารเก่า) โดยได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

ขอสรุปการประเมิน ดังนี้

แบบสอบถามจำนวน ๖๐ ชุด			คำถามที่ใช้ประเมิน ๑๖ ข้อ	
เพศชาย ๔ คน	คิดเป็น ๗%		เพศหญิง ๕๖ คน	คิดเป็น ๙๓%
อายุ ๑๕-๒๕ ปี	๑ คน		คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
อายุ ๒๖-๓๕ ปี	๒ คน		คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓%
อายุ ๓๖-๔๕ ปี	๖ คน		คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๐%
อายุ ๔๖-๕๕ ปี	๑๕ คน		คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๕%
อายุ ๕๖-๖๕ ปี	๒๒ คน		คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๗%
อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป	๑๔ คน		คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๓%

คำถามในการประเมิน

๑.๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

มากที่สุด (๕)	=	๒๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๐%
มาก (๔)	=	๒๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๘%
ปานกลาง (๓)	=	๘	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๓%
น้อย (๒)	=	๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕%
น้อยมาก (๑)	=	๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓%
เฉลี่ย ๔.๐๖	สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก		

๑.๒ ความเหมาะสมของสถานที่

มากที่สุด (๕)	=	๓๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๓%
มาก (๔)	=	๒๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๗%
ปานกลาง (๓)	=	๖	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๐%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย ๔.๔๓	สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก		

๑.๓ ความเหมาะสมของช่วงเวลา (๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.)

มากที่สุด (๕)	=	๒๗	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๕%
มาก (๔)	=	๒๗	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๕%
ปานกลาง (๓)	=	๖	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๐%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย ๔.๓๕		สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก	

๑.๔ การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม

มากที่สุด (๕)	=	๒๙	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๘%
มาก (๔)	=	๓๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๐%
ปานกลาง (๓)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย ๔.๔๖		สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก	

๒.๑ ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยาการ

มากที่สุด (๕)	=	๓๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๗%
มาก (๔)	=	๒๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๘%
ปานกลาง (๓)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
น้อย (๒)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
น้อยมาก (๑)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
เฉลี่ย ๔.๔๖		สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก	

๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

มากที่สุด (๕)	=	๓๕	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๘%
มาก (๔)	=	๒๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๐%
ปานกลาง (๓)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย ๔.๕๖		สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มากที่สุด	

๒.๓ การตอบคำถาม

มากที่สุด (๕)	=	๓๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๓%
มาก (๔)	=	๒๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๐%
ปานกลาง (๓)	=	๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๗%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย ๔.๕๖		สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มากที่สุด	

๒.๔ ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม

มากที่สุด (๕)	=	๓๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๗%
มาก (๔)	=	๒๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๐%
ปานกลาง (๓)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
เฉลี่ย ๔.๕		สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มากที่สุด	

๓.๑ เอกสารประกอบ

มากที่สุด (๕)	=	๒๕	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๒%
มาก (๔)	=	๒๗	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๕%
ปานกลาง (๓)	=	๘	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๓%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย ๔.๒๘		สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก	

๓.๒ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

มากที่สุด (๕)	=	๓๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๗%
มาก (๔)	=	๒๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๕%
ปานกลาง (๓)	=	๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๗%
น้อย (๒)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย ๔.๔๖		สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก	

๓.๓ อาหาร,เครื่องดื่ม และสถานที่				
มากที่สุด (๕)	=	๓๗	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๖๒%
มาก (๔)	=	๒๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๗%
ปานกลาง (๓)	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย	๔.๖	สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มากที่สุด	
๔.๑ ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกอาชีพ				
มากที่สุด (๕)	=	๔๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๗๒%
มาก (๔)	=	๑๗	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๘%
ปานกลาง (๓)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย	๔.๗๑	สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มากที่สุด	
๔.๒ ท่านมีแนวโน้มจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพสำหรับตนเองต่อไป				
มากที่สุด (๕)	=	๓๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๕%
มาก (๔)	=	๑๙	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๒%
ปานกลาง (๓)	=	๘	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๓%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย	๔.๔๑	สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก	
๔.๓ สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน				
มากที่สุด (๕)	=	๓๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๗%
มาก (๔)	=	๒๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๕%
ปานกลาง (๓)	=	๕	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๘%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
เฉลี่ย	๔.๔๘	สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์	มาก	

๔.๔ โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่านหรือไม่

มากที่สุด (๕)	=	๓๖	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๖๐%
มาก (๔)	=	๒๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๐%
ปานกลาง (๓)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%

เฉลี่ย ๔.๖ สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด

๔.๕ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

มากที่สุด (๕)	=	๓๖	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๖๐%
มาก (๔)	=	๒๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๐%
ปานกลาง (๓)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อย (๒)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%
น้อยมาก (๑)	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐%

เฉลี่ย ๔.๖ สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด

$$* \text{เฉลี่ย} = \frac{\Sigma(\text{คะแนนรายชื่อ} \times \text{จำนวนคนรายชื่อ})}{\text{จำนวนคนทั้งหมด (๖๐)}}$$

ตารางสรุปผลการประเมิน

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑.๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ		/			
๑.๒ ความเหมาะสมของสถานที่		/			
๑.๓ ความเหมาะสมของช่วงเวลา (๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.)		/			
๑.๔ การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม		/			
๒.๑ ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร		/			
๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้	/				
๒.๓ การตอบคำถาม	/				
๒.๔ ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม	/				
๓.๑ เอกสารประกอบ		/			
๓.๒ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม		/			
๓.๓ อาหาร,เครื่องดื่ม และสถานที่	/				

ตารางสรุปผลการประเมิน (ต่อ)					
รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๔.๑ ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกอาชีพ	/				
๔.๒ ท่านมีแนวโน้มจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพสำหรับตนเองต่อไป		/			
๔.๓ สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน		/			
๔.๔ โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่านหรือไม่	/				
๔.๕ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม	/				




(นายธีรภัทร กลิ่นมงคล)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ความเห็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ


.....


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ


.....



(นางสาวชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ


(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว


ความเห็นรองปลัด อบต.คูบัว


.....


ความเห็นปลัด อบต.คูบัว



.....


(นางสาวชญามาศ พิบูลแถว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว


(นายชัยวัฒน์ อภิภูมุนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว


.....


(นายพจจุณศล ธนิกกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (อาคารเก่า)



ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม/ฝึกอาชีพ



นายชัยวัฒน์ อภิภูมุนากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กล่าวรายงาน



นายพจธนศร ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นประธานในพิธีเปิด



คณะวิทยากรที่มาให้ความรู้และฝึกสอนทำसानตะกร้าจากเส้นพลาสติก











บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ที่ ๗๓๔๐๑/ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่ ข้าพเจ้านายธีรภัทร กลิ่นมงคล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธีรภัทร

(นายธีรภัทร กลิ่นมงคล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ

กนก

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นของรองปลัด อบต.คูบัว

พิชญ์พร

ความเห็นของรองปลัด อบต.คูบัว

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชญามาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

(นายชัยวัฒน์ อภิธรรมนาถกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น/ข้อพิจารณาสั่งการของนายก อบต.คูบัว

กนก

กนก

(นายพจวนศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำเนาถูกต้อง

ธีรภัทร

นายธีรภัทร กลิ่นมงคล

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑.๑ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ๑.๒ ☒ แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๓
- ๑.๓ ☒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๑.๔ ☒ อำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ๑.๕ งานฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
- ๑.๖ ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๒ วัน
- ๑.๗ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรภัทร กลิ่นมงคล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ๑.๘ สรุปรายงานเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. วัตถุประสงค์ สรุปรผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและการมีวินัยในเรื่องขยะต่อส่วนรวม การประชาสัมพันธ์การลด/คัดแยก/กำจัดขยะและน้ำเสียต้นทาง	✓		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก สำเนาถูกต้อง  นายธีรภัทร กลิ่นมงคล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๒	ส่งเสริมนโยบายการจัดการขยะของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการลด/คัดแยก/กำจัดขยะและน้ำเสียต้นทาง เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องกำจัดปลายทางน้อยที่สุด	✓		
๓	การเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้อยู่หมัดจากการกำจัดขยะและน้ำเสียที่บำบัดแล้วและการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและสมุนไพร	✓		

๓. เป้าหมาย ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย/ ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต / ตัวชี้วัดของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	สตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน	✓		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

/สรุป ผลการดำเนินการ...

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (✓) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่ ๑) ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒) โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชประชานิ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๓) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๔.๑ สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(✓) มาก () ปานกลาง () น้อย

๕. วันที่ดำเนินการ วันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

() ดำเนินการก่อน (✓) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณ ตั้งไว้คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
ใช้จ่ายจริง ๒๘๔,๙๕๕.- บาท
คงเหลือ ๑๕,๐๔๕.- บาท
ใช้เกิน ๐ บาท

- สรุป ☒ น้อยกว่างบประมาณ
☒ การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ
☒ ประหยัดคุ้มค่ากับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในโครงการ
☒ เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

๗. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. เขียนโครงการฯ ๒. ติดต่อประสานงานไปยังสถานที่ต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงให้ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลคูบัวรับทราบโครงการ และ ร่วมเสนอแนะรูปแบบ การจัดทำโครงการพร้อมกับคณะผู้บริหารและ พนักงานเจ้าหน้าที่ ๔. นำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้กับประธานสตรีแม่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ๕. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ๖. จัดอบรมให้ความรู้สตรี โดย วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ ๗. จัดการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการจัดการกำจัดขยะและบำบัดน้ำ เสียของชุมชน ๘. รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้นโครงการ	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ สำเนาถูกต้อง จิราพร นายจิรภัทร กลิ่นมงคล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

☒ เป็นที่น่าพอใจ

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

☒ พอดี

/๗.๓ ความร่วมมือในการ...

- ๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ☒ ได้รับความร่วมมือดีมาก
- ๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ☒ ได้รับความร่วมมือดีมาก
- ๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☒ ได้รับความร่วมมือดีมาก
- ๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงพอ ☒ จำนวนพอใช้

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (๒๕๐ คน)	- มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒	การบันทึก โดยลงมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ (ภาพรวม) ในระดับไม่ต่ำกว่า “มาก” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๒๐๐ แบบสอบถาม)	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ (ภาพรวม) ในระดับไม่ต่ำกว่า “มาก” จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕	แบบประเมินความพึงพอใจ

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้

๙.๑.๑ กลุ่มสตรีและแม่บ้านมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและการมีวินัยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดการขยะที่บ้านตนเองเพื่อเป็นต้นแบบในชุมชน

๙.๑.๒ ได้ศึกษาแนวทางการนำของเสียที่เหลือหลังการบำบัด และวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำมาประยุกต์เพื่อลดขยะในพื้นที่โดยไม่เสียเวลาและลดรายจ่ายได้

๙.๑.๓ ได้เรียนรู้แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียในสถานที่ดำเนินงานจริง ซึ่งอาศัยวิธีการทางธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง ประหยัด สะดวก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆได้ทั่วไป

๙.๒ ปัญหาและอุปสรรค

๙.๒.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมาก แต่วันดำเนินการจริงมีผู้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ถึง ๑๑ คน เพราะเจ็บป่วย หรือติดภารกิจด่วน

๙.๒.๒ สภาพอากาศร้อนและสถานที่จัดงานมีที่ร่มน้อย ทำให้เมื่อต้องเดินศึกษาดูงานแม่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุปรับตัวไม่ทัน และมีความต้องการน้ำดื่มมากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้

๙.๓ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

๙.๓.๑ ควรติดตามผลการจัดการขยะของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพิ่มเติมจากการติดตามผลหลังการศึกษาดูงาน ประมาณปีละ ๑-๒ ครั้ง

๙.๓.๒ สถานที่และสภาพอากาศในช่วงที่ดำเนินการโครงการมีผลต่อประสิทธิภาพในการศึกษาดูงาน ต้องคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด

๙.๔ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

๙.๔.๑ ควรขยายผลของโครงการลงไปในแต่ละชุมชน ในการจัดโครงการครั้งต่อไปหรือโครงการอื่นๆ

๙.๔.๒ ย้ำเตือนให้กลุ่มเป้าหมายเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศและสถานที่ศึกษาดูงาน เช่น ให้นำหมวก/ร่ม/ยาประจำตัวติดตัวไปด้วย เตรียมน้ำดื่มเพิ่มเติมและนำชุดปฐมพยาบาลส่วนกลางไปด้วย

สำเนาถูกต้อง

ก๊อ

/สรุปโครงการนี้...

นายธีรภัทร กลิ่นมงคล


นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สรุปโครงการนี้ เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมแล้ว

(✓) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป


เพราะ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ อบต.ดำเนินการ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ในการมีส่วนร่วมต่อชุมชนด้านการลด คัดแยก กำจัดขยะและน้ำเสีย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป เพราะ.....

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน
(นายธีรภัทร กลิ่นมงคล)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ
- งาม

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ





ลงชื่อ..... 
(นางสาวชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


ลงชื่อ..... 
(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


ความคิดเห็นของรองปลัด อบต.คูบัว
- จินโครงการลด เน้นลดดำเนินการ

ความคิดเห็นของปลัด อบต.คูบัว






ลงชื่อ..... 
(นางสาวชฎามาต พิบูลแถว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ลงชื่อ..... 
(นายชัยวัฒน์ อภิภูมนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาสั่งการของนายก อบต.คูบัว


พิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... 
(นายพจธรณศ ธนิกกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำเนาถูกต้อง



นายธีรภัทร กลิ่นมงคล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ที่ รบ ๗๓๔๐๑/ วันที่ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานแบบประเมินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้าน
ตำบลคูบัว ปี ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัด
เพชรบุรี โดยได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ขอสรุปการประเมิน ดังนี้

จากแบบสอบถามจำนวน	๒๐๐ ชุด	คำถามที่ใช้ประเมิน	๘ ข้อ
แยกตามอายุ			
อายุ 20 - 30 ปี	๑ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐.๕%
อายุ 31 - 40 ปี	๔ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒.๐%
อายุ 41 - 50 ปี	๒๗ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๓.๕%
อายุ 51 - 60 ปี	๘๐ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๐.๐%
อายุ 61 ปีขึ้นไป	๘๘ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๔.๐%
แยกตามการศึกษา			
ประถมศึกษา	๑๔๗ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๗๓.๕%
มัธยมต้น	๒๔ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๒.๐%
มัธยมปลาย	๑๘ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๙.๐%
อนุปริญญา/ปวส.	๕ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒.๕%
ปริญญาตรี	๓ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑.๕%
อื่นๆ	๓ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑.๕%
แยกตามอาชีพ			
เกษตรกรรวม	๖๐ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓๐.๐%
ลูกจ้าง	๕๖ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๘.๐%
ธุรกิจส่วนตัว	๔๘ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๔.๐%
พนักงานของรัฐ	๔ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒.๐%
อื่นๆ	๓๒ คน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๖.๐%

สำเนาถูกต้อง

รับทราบ

/ข้อ ๑...

นายธีรภัทร กลิ่นมงคล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ข้อ ๑ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

มากที่สุด	=	๔๙	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๔.๕%
มาก	=	๙๖	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๘.๐%
ปานกลาง	=	๕๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๖.๕%
น้อย	=	๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑.๐%
น้อยที่สุด	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐.๐%

* สรุปว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก

ข้อ ๒ มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

มากที่สุด	=	๔๗	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๓.๕%
มาก	=	๙๕	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๗.๕%
ปานกลาง	=	๕๕	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๗.๕%
น้อย	=	๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑.๕%
น้อยที่สุด	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐.๐%

* สรุปว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก

ข้อ ๓ การตอบข้อซักถามของวิทยากรในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

มากที่สุด	=	๔๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๒.๐%
มาก	=	๙๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔๖.๐%
ปานกลาง	=	๕๙	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๙.๕%
น้อย	=	๕	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒.๕%
น้อยที่สุด	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐.๐%

* สรุปว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก

ข้อ ๔ ความเหมาะสมของสถานที่และเวลาที่ใช้ในการอบรมและศึกษาดูงาน

มากที่สุด	=	๔๖	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๓.๐%
มาก	=	๑๐๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๒.๐%
ปานกลาง	=	๔๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๑.๕%
น้อย	=	๕	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒.๕%
น้อยที่สุด	=	๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑.๐%

* สรุปว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก

สำเนาถูกต้อง

จ.ก.๔

/ข้อ ๕...

นายธีรภัทร กลิ่นมงคล

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ข้อ ๕ วิธีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดในโครงการ

มากที่สุด	=	๓๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๖.๕%
มาก	=	๑๑๕	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๗.๕%
ปานกลาง	=	๔๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๑.๕%
น้อย	=	๘	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๔.๐%
น้อยที่สุด	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐.๕%

* สรุปว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก

ข้อ ๖ ท่านคิดว่าสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะในชุมชนได้เพียงใด

มากที่สุด	=	๕๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๕.๕%
มาก	=	๑๐๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๐.๐%
ปานกลาง	=	๔๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๑.๕%
น้อย	=	๖	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๓.๐%
น้อยที่สุด	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐.๐%

* สรุปว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก

ข้อ ๗ ท่านคิดว่าสามารถเข้าร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างไร

มากที่สุด	=	๓๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๕.๕%
มาก	=	๑๐๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๐.๕%
ปานกลาง	=	๕๘	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๙.๐%
น้อย	=	๑๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕.๐%
น้อยที่สุด	=	๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐.๐%

* สรุปว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก

ข้อ ๘ ความพึงพอใจในภาพรวม

มากที่สุด	=	๕๓	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๒๖.๕%
มาก	=	๑๑๐	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๕๕.๐%
ปานกลาง	=	๓๔	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑๗.๐%
น้อย	=	๒	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๑.๐%
น้อยที่สุด	=	๑	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	๐.๕%

* สรุปว่า อยู่ในเกณฑ์ มาก


สำเนาถูกต้อง
วิจิตร

นายธีรภัทร กลิ่นมงคล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตารางสรุปผลการประเมิน

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน		/			
๒. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน		/			
๓. การตอบข้อซักถามของวิทยากรในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน		/			
๔. ความเหมาะสมของสถานที่และเวลาที่ใช้ในการอบรมและศึกษาดูงาน		/			
๕. วิธีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดในโครงการ		/			
๖. ท่านคิดว่าสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะในชุมชนได้เพียงใด		/			
๗. ท่านคิดว่าสามารถเข้าร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ชุมชน และท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างไร		/			
๘. ความพึงพอใจในภาพรวม		/			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นายธีรภัทร กลิ่นมungskุล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ
- ทวณ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว



(นางสาวชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว



ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



(นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

(นายชัยวัฒน์ อภิธูมนานกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



ความเห็น/ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทวณ



(นายพจธฐนศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำเนาถูกต้อง



นายธีรภัทร กลิ่นมungskุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒



รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน



ตั้งใจทำข้อสอบก่อนการอบรม



นายชัยวัฒน์ อภิธรรมนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ผู้กล่าวรายงานต่อหน้าประธานในพิธีเปิด




นายพจวรรณศล ธนิกกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ประธานในพิธีเปิด



นางนงลักษณ์ พรหมสกลิต ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘

วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน

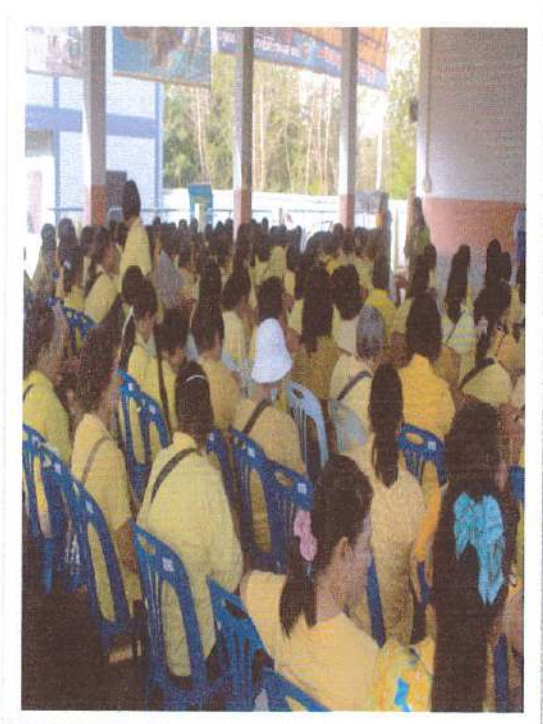

เวลา ๑๐.๓๐ น. เดินทางสู่โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

ตำบลสามพระยา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี



รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวห่อใบบัว)










วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

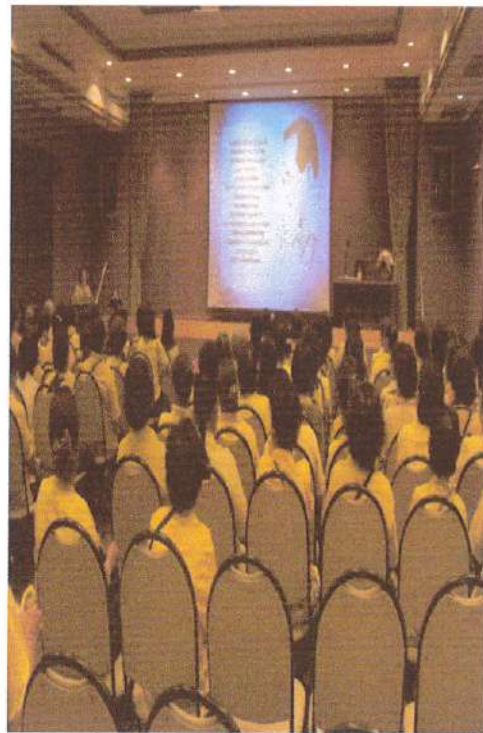

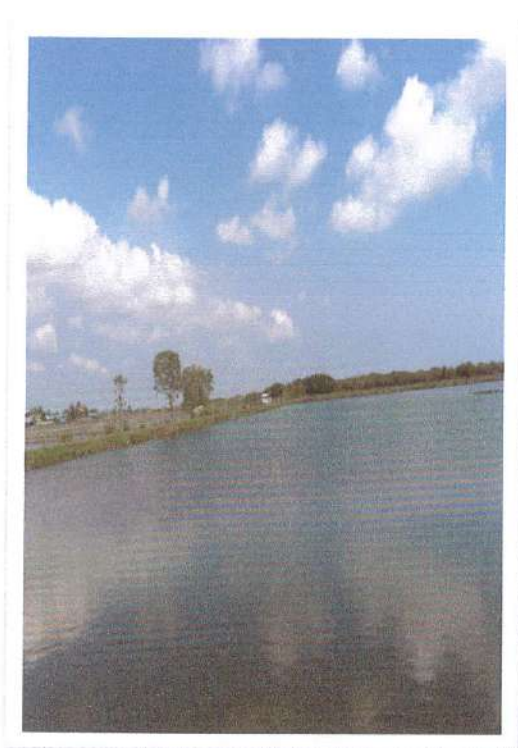

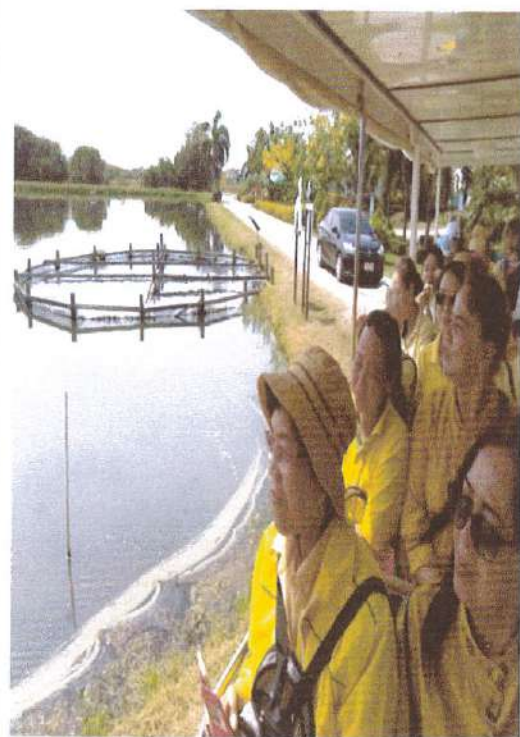





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๗๓๔๑๑/-

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ เกษตรกรผู้ปลูกผัก และจำหน่ายผักปลอดภัย นายล้นทม สุพรรณโรจน์ ๕๘/๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ไปแล้วนั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) และเห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นรองปลัดฯ

(นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นปลัด อบต.

ปลัด อบต.

(นายชัยวัฒน์ อภิธรรมนาถกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น นายก อบต.คูบัว

นายก อบต.

(นายพจวรรณ ฐนิกกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ เกษตรกรผู้ปลูกผัก และจำหน่ายผักปลอดภัย นายลั่นทม สุพรรณโรจน์ ๕๘/๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

บัดนี้ การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนโยบายและแผนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ฯ

(นายพจวนศล ธนิกกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ....๒๕๖๑-๒๕๖๒/เพิ่มเติมหน้าที่ ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว.....

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่.....๒๖.....มีนาคม...๒๕๖๒.....ถึง...๒๖ มีนาคม...๒๕๖๒.....

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม.....นางภัคกร แก้วมรกต และ นายสุเมธ พระแก้ว.....

สรุปรายงานเมื่อ วันที่.....๒๗.....เดือน.....มีนาคม.... พ.ศ.๒๕๖๒...

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก
๒	เพื่อส่งเสริมให้นำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความพอเพียงความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าและเกิดรายได้	✓		
๓	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน	✓		
๔	เพื่อส่งเสริมบุคคลต้นแบบนักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓		

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	ประชาชนผู้สนใจในตำบลคูบัว จำนวน ๕๐ คน	✓		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☐ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

(✓) สูงกว่าเป้าหมาย () เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ เกษตรกรผู้ปลูกผัก และจำหน่ายผักปลอดภัย นายลั่นทม สุพรรณโรจน์ ๕๘/๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(✓) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ / ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ.....

สรุป () ดำเนินการก่อน (✓) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้๓๐,๐๐๐..... บาท

ใช้จ่ายจริง ๒๘,๖๒๐ บาท

คงเหลือ๑,๓๘๐..... บาท

ใช้เกิน.....-..... บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(✓) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(✓) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

() ประหยัดค้ำค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

(✓) เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๖. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. <u>ขั้นเตรียมงาน (PLAN)</u> (๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน (๒) ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมให้ความรู้ (๓) ประสานงานกับวิทยากรอบรม (๔) จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ (๕) กำหนดกิจกรรมในโครงการ/ระยะเวลาดำเนินงาน	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
๒. <u>ขั้นดำเนินการ (DO)</u> (๖) ขออนุมัติดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน (๗) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ - ฐานเรียนรู้ จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม - ฐานเรียนรู้ จากเกษตรกรผู้ปลูกผัก และจำหน่ายผักปลอดภัย นายลั่นทม สุพรรณโรจน์ ๕๘/๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	
๓. <u>ขั้นตรวจสอบ (CHECK)</u> (๘) หลักฐานการเบิกจ่าย (๙) ภาพถ่าย ร่องรอยการดำเนินกิจกรรม (๑๐) การประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรม	
๔. <u>ขั้นรายงาน (ACTION)</u> (๑๑) สรุปข้อมูลการดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๒) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ (๑๓) รายงานผลหลังจากสิ้นสุดโครงการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น	

๖.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(✓) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๖.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (✓) พอดี () น้อยเกินไป

๖.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(✓) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๔ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(√) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๕ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(√) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๖เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (√) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. ประชาชนผู้สนใจในตำบลคูบัว จำนวนเป้าหมาย ๕๐ คน	จำนวนประชาชนผู้สนใจในตำบลคูบัวที่ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๕๔ คน	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☒ สอบถาม ☐ ตรวจงาน ☒ ทดสอบ ☐ เก็บข้อมูล
๒. ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการฯ มีความพึงพอใจกับโครงการที่ ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สรุป หัวข้อจากแบบประเมินผู้เข้ารับ การอบรม จำนวน ๔ หัวข้อ ได้ดังนี้ ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในกิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๓ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในวิทยากร อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ ๓. ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในการบริการ อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๒ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๕	

๘. ภาพรวม

๘.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ)..... เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ให้มีความคิด ไอเดีย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างคุณค่าแก่ผู้คน พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศจะมุ่งหน้าสู่ยุค ๔.๐ ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้

- (☒) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- (☒) ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (☒) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (☒) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (☒) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (☒) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ).....

- () งาน/โครงการ /กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
- () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
- () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

(โปรดระบุกิจกรรม).....

เพราะ.....

- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ

- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรมล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง

- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)

เพราะ.....

- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๘.๓ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น
ไม่มากเท่าที่ควร

๒. มีการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในครัวเรือนน้อยเกินไป

๘.๔ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

๑. ควรให้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม

๒. ควรให้มีการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

๓. ควรมีแนวความคิด ไอเดีย และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ไทยกับยุคไทยแลนด์ ๔.๐

๙. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(✓) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการขับเคลื่อน ประเทศไทยสู่ยุค ๔.๐ เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราทุกคนควรที่จะทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อนเพื่อ ความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน เราจะพัฒนา ‘บ้านของเรา’ ไปในทิศทางไหน สำคัญคือรากฐานเราต้องแข็งแรง มากพอ เราต้องรู้ว่าอะไรคือพื้นฐานสำคัญ เมื่อนั้น เราก็ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยแนวคิดและนวัตกรรม ที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ล้มรากฐานสำคัญในการ “รู้จักเดิม รู้จักพอ และรู้จักปัน”

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางภัคกร แก้วมรกต)

ตำแหน่ง. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานของโครงการฯ

.....

.....
(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เป็นโดยทศพล โทณการอำเภอนครหลวง



(นางสาวชญาภาส พิบูลแฉว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

นางสาว ชญาภาส พิบูลแฉว


ลงชื่อ



(...นายชัยวัฒน์...อิฐฐมนากุล...)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



นาย พจวนศร ชนิกุล



ลงชื่อ

(นายพจวนศร ชนิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
๖๓ / ๓ - ๑๐ / ๖๖

ภาพถ่ายพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

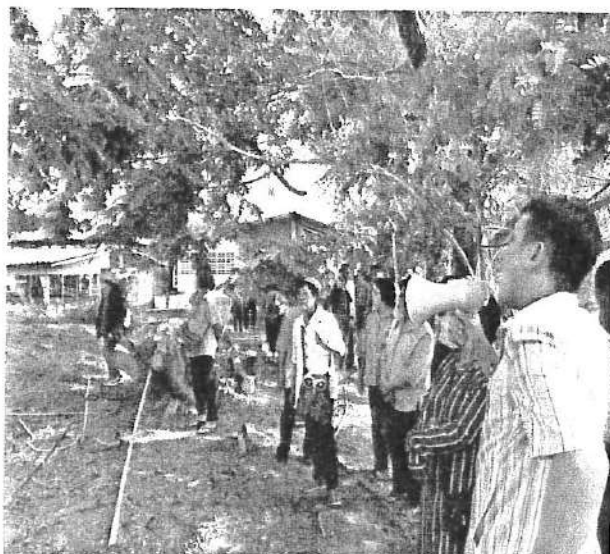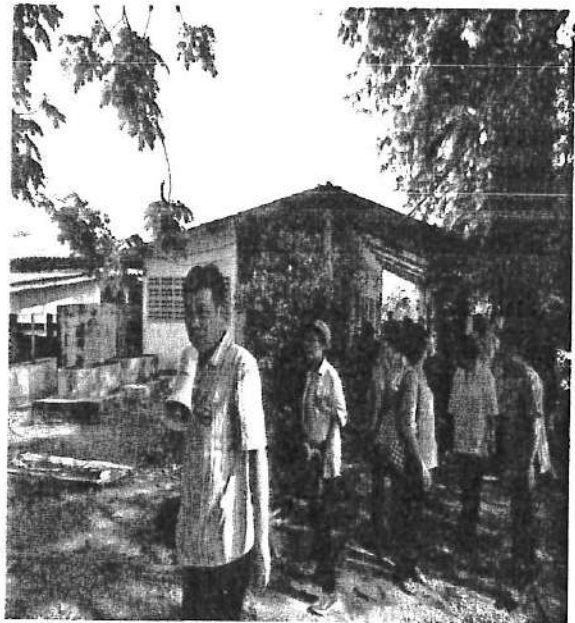

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
และ เกษตรกรผู้ปลูกผัก และจำหน่ายผักปลอดภัย นายล้นทม สุพรรณโรจน์ ๕๘/๓ หมู่ ๑๑
ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม




นายแพทย์ มนัส พงษ์สุนันท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน



วิทยากร.....นายสรณพงษ์ บัวโรย
หัวข้อ.... เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการการเกษตรตามแนวทางอริยสัจสี่



นายอาลี มูฮำหมัด
อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
หัวข้อ.....มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิต สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

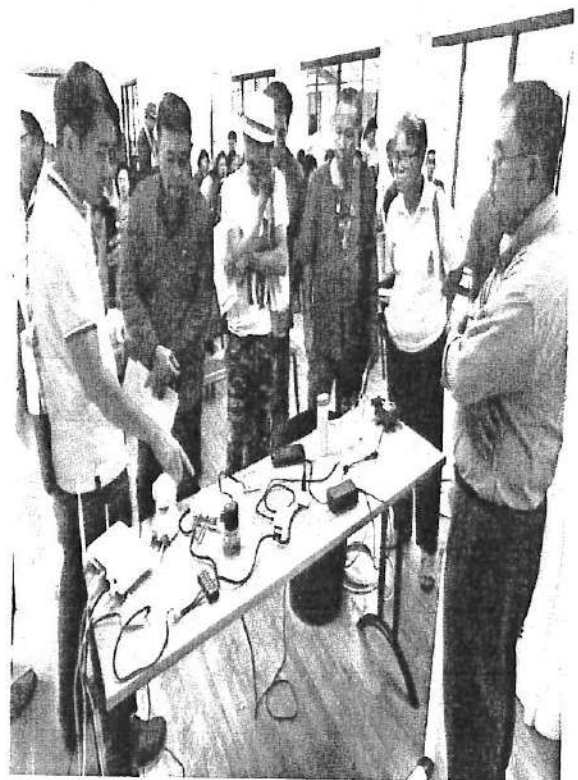



ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในตำบลคูบัว ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม



นายลันทม สุวรรณโรจน์
เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
หัวข้อ...การปลูกผักปลอดสารพิษ และอาหารปลอดภัย



ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในตำบลคูบัว ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก และจำหน่ายผักปลอดภัย นายลันทม สุพรรณโรจน์ ๕๘/๓ หมู่ ๑๑
ตำบลบ้านปรก อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

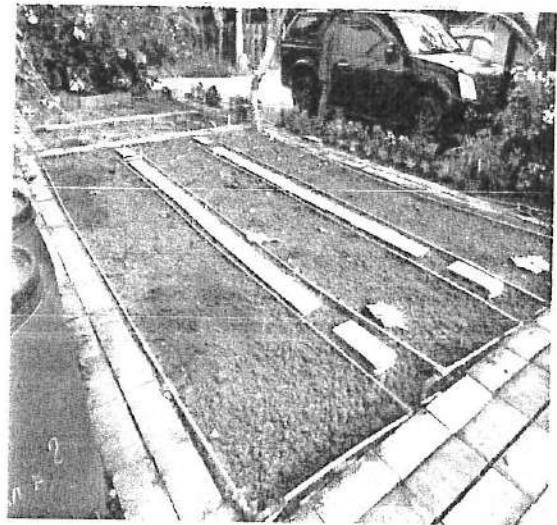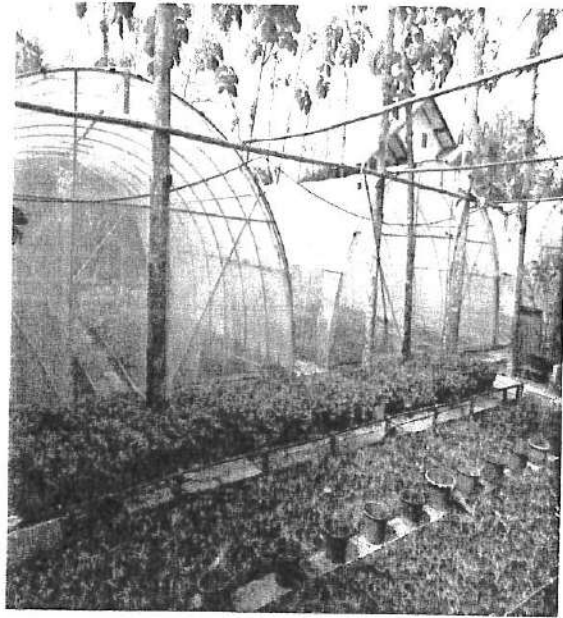

ฐานเรียนรู้

ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก และจำหน่ายผักปลอดภัย นายล้นทม สุพรรณโรจน์ ๕๘/๓ หมู่ ๑๑
ตำบลบ้านปรก อำเภอมะนัง จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ทางเกษตร ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

- ☒ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☐ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ....๒๕๖๑-๒๕๖๔.../เพิ่มเติมหน้าที่... ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่.....๒..... ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนักงานนโยบายและแผน .สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว.....

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่.....๑...สิงหาคม...๒๕๖๒...ถึง.....๑...สิงหาคม...๒๕๖๒.....

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม.....นางภัคกร แก้วมรกต และ นายสุเมธ พระแก้ว.....

สรุปรายงานเมื่อ วันที่.....๕.....เดือน.....สิงหาคม.... พ.ศ.๒๕๖๒.....

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต และการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี	√		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก
๒	เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคูบัว ให้มีผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมแก่การบริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาด	√		
๓	เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการพัฒนาการเกษตร แบบยั่งยืน	√		
๔	เพื่อฟื้นฟูดินให้ดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเกษตร และรักษาสีสิ่งแวดล้อม	√		
๕	เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในอนาคต	√		

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย /ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	ผู้นำในท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่ / เกษตรกร และ ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐ คน	✓		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☐ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

(✓) สูงกว่าเป้าหมาย () เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่ ณ ไร่รวงข้าวภูตะวัน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(✓) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ / ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันที่ดำเนินการ.....

สรุป () ดำเนินการก่อน (✓) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้๓๐,๐๐๐..... บาท

ใช้จ่ายจริง๒๓,๑๗๕..... บาท

คงเหลือ๖,๘๒๕..... บาท

ใช้เกิน..... บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(✓) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(✓) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

() ประหยัดค้ำค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

(✓) เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๖. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. <u>ขั้นเตรียมงาน (PLAN)</u> (๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน (๒) ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมให้ความรู้ (๓) ประสานงานจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรจาก สำนักงาน เกษตรจังหวัดราชบุรี และกลุ่มเกษตรกรมัยเ็นราชบุรี (๔) จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ (๕) กำหนดกิจกรรมในโครงการ/ระยะเวลาดำเนินงาน	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
๒. <u>ขั้นดำเนินการ (DO)</u> (๖) ขออนุมัติดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน (๗) ฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และกลุ่มเกษตรกรมัยเ็นราชบุรี - อบรมให้ความรู้หลักความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ , การรวมกลุ่มวิธีการจัดทำแปลง เกษตรอินทรีย์ และการเรียนรู้ระบบการ ตรวจสอบแปลงเพื่อรับรองคุณภาพ ระบบ ICS ระบบมาตรฐาน IFOAM ระบบ PGS การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ -การให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในด้าน ต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการ	
๓. <u>ขั้นตรวจสอบ (CHECK)</u> (๘) ภาพถ่าย ร่องรอยการดำเนินกิจกรรม (๙) การประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรม	
๔. <u>ขั้นรายงาน (ACTION)</u> (๑๐) สรุปข้อมูลการดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๑) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ (๑๒) รายงานผลหลังจากสิ้นสุดโครงการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น	

๖. วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. <u>ขั้นเตรียมงาน (PLAN)</u> (๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน (๒) ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมให้ความรู้ (๓) ประสานงานจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และกลุ่มเกษตรกรมัยเนินราชบุรี (๔) จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ (๕) กำหนดกิจกรรมในโครงการ/ระยะเวลาดำเนินงาน	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
๒. <u>ขั้นดำเนินการ (DO)</u> (๖) ขออนุมัติดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน (๗) ฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และกลุ่มเกษตรกรมัยเนินราชบุรี - อบรมให้ความรู้หลักความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ , การรวมกลุ่มวิธีการจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ และการเรียนรู้ระบบการตรวจสอบแปลงเพื่อรับรองคุณภาพระบบ ICS ระบบมาตรฐาน IFOAM ระบบ PGS การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ -การให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการ	
๓. <u>ขั้นตรวจสอบ (CHECK)</u> (๘) ภาพถ่าย ร่องรอยการดำเนินกิจกรรม (๙) การประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรม	
๔. <u>ขั้นรายงาน (ACTION)</u> (๑๐) สรุปข้อมูลการดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๑) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ (๑๒) รายงานผลหลังจากสิ้นสุดโครงการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น	

๖.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(☒) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๖.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (☒) พอดี () น้อยเกินไป

๖.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(☒) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(☒) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(☒) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (☒) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. ผู้นำในท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่ / เกษตรกร และประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ ประมาณ ๕๐ คน	จำนวนผู้นำในท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่ / เกษตรกร และประชาชน ผู้สนใจเข้า ร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน ๕๓ คน	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☒ สอบถาม ☐ ตรวจงาน ☒ ทดสอบ ☐ เก็บข้อมูล
๒. ผู้นำในท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่ / เกษตรกร และประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วม มีความพึงพอใจกับโครงการที่ได้ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	รายละเอียดตามแบบสรุปผลการ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม การ ประเมินความรู้และความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการแนบท้ายบันทึกนี้	

๘. ภาพรวม

๘.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ)..... เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการบริโภคและอุปโภค เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ถาวร และยั่งยืน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสังแวดล้อม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชากรเป็นสำคัญ ซึ่งระดับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในระดับท้องถิ่นยังขาดการสนับสนุนการณรงค์ให้คน ในท้องถิ่นมีความรู้ความ เข้าใจในความหมาย เกษตรอินทรีย์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ให้รู้ซึ่งถึงคุณค่าในคุณภาพและคุณประโยชน์ อย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของเศรษฐกิจ พอเพียง กระแสความนิยมด้านเกษตรกรรมยั่งยืนเริ่มกลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้งหนึ่งโดยยึดหลัก “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นเครื่องนำทางเพื่อให้ประเทศมีการ พัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหม่ หันมา ใช้สารอินทรีย์ทดแทน อย่างน้อยให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (อาหารปลอดภัย) และพัฒนาไปสู่อาหารไร้สารพิษ และเกษตรอินทรีย์ในที่สุด

- (☒) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- (☒) ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (☒) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (☒) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (☒) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (☒) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ ปัญหาและอุปสรรค

- (ระบุ).....
- () งาน/โครงการ /กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
 - () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
 - () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
- เพราะ.....
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- เพราะ.....
- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
- (โปรดระบุกิจกรรม).....
- เพราะ.....
- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ
 - () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้เงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรมล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
 - () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
- เพราะ.....
- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๘.๓ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- (ระบุ).....๑...มีการวิเคราะห์ดินในพื้นที่ของตำบล ไม่มากเท่าที่ควร
- ๒. มีการขยายวิธีการส่งเสริมการผลิตโดยใช้สารอินทรีย์ไปปฏิบัติน้อยเกินไป

๘.๔ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- (ระบุ) ...๑. ควรมีการนำดินในพื้นที่ ที่ทำการเกษตรของตำบล ไปให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ วิเคราะห์ดินให้มากกว่าเดิม เพื่อฟื้นฟูดินให้ดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเกษตร และรักษาสิ่งแวดล้อม
-๒. ควรให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิต และการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

๙. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

- (☒) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นเครื่องนำทางเพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปริมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางภัคกร แก้วมรกต)

ตำแหน่ง. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานของโครงการฯ

นางสาวจิตร์ นาราภิรมย์

(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว

(นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ยังปริมาณและแผนงาน

นายชัยวัฒน์ อธิภูมิกุล

ลงชื่อ.....

(...นายชัยวัฒน์...อธิภูมิกุล...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็นและพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ลงชื่อ.....


(นายพจภูมิธล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

...../...../.....

ภาพถ่ายผลการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ทางเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ณ ไร่รวงข้าวภูตะวัน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

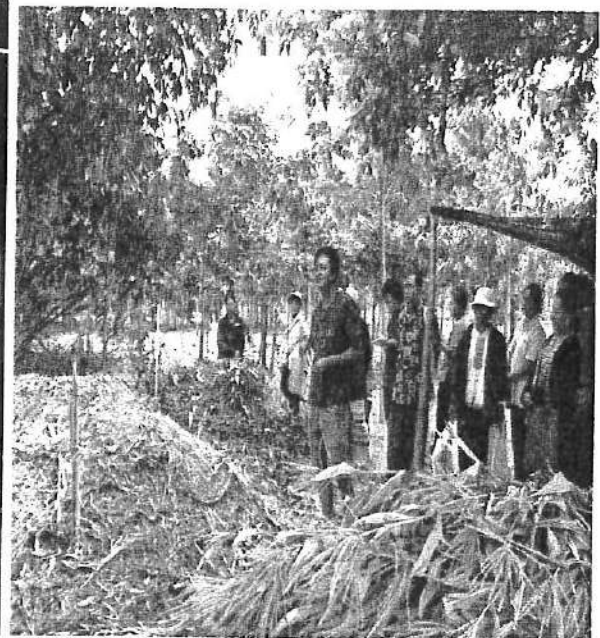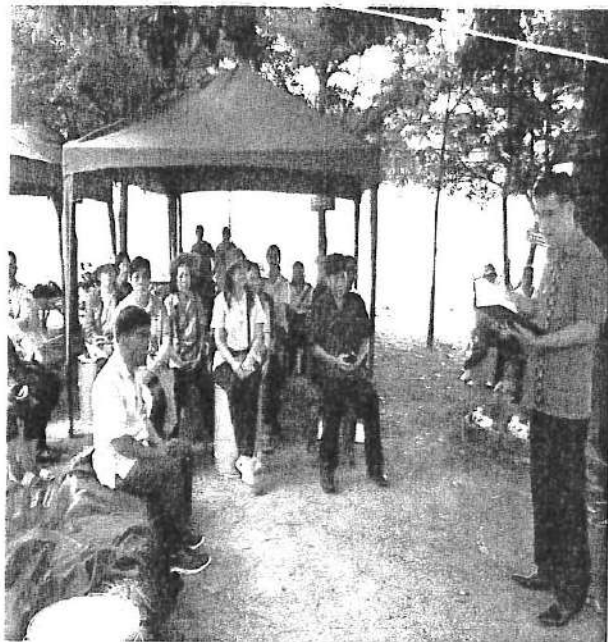

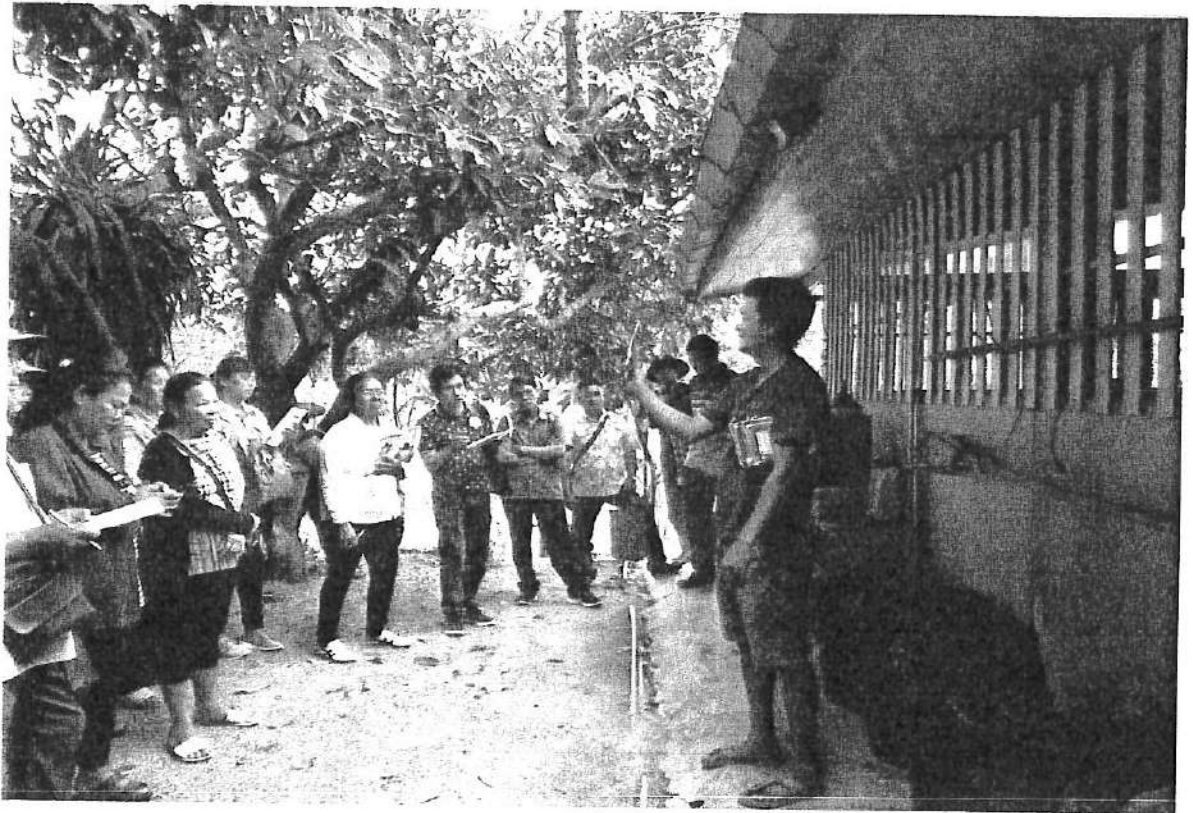

วิทยากรบรรยายโดย....กลุ่มเกษตรกรแม่เย็นราชบุรี

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการส่งเสริมการศึกษาออกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน.....

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ....๒๕๖๑-๒๕๖๔.../เพิ่มเติมหน้าที่..๑๔๒... ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่.....๓..... ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองการศึกษา ฯ.....

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่..... ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....ถึง.....๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม..... กองการศึกษา ฯ.....

สรุปรายงานเมื่อ วันที่.....๑๙.....เดือน.....เมษายน..... พ.ศ.๒๕๖๒.....

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ จากประสบการณ์จริง	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก
๒	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคีในการทำกิจกรรมกลุ่ม	/		
๓	เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง	/		
๔	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า	/		
๕	เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และคณะครู	/		

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	จำนวนเด็กระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย
๒	จำนวนผู้บริหารอบต.และเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	/		☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่วัดหนองหมี่ , นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี.....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันที่ดำเนินการ.....๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....

สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้๕๐,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง๒๘,๔๑๕..... บาท

คงเหลือ๒๑,๕๘๕..... บาท

ใช้เกิน.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความคุ้มค่า นักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ณ วัดหนองหมี่ , นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (/) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. จำนวนเด็กระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๘๐ คน)	สรุปจากใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☒ สอบถาม
๒. จำนวนผู้บริหารอบต.และเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๙ คน)	สรุปจากใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	☐ ตรวจสอบ ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สรุปจากแบบประเมินผลโครงการ พบว่า ภาพรวมการจัดโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๗.๒๕	

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพื่อน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และวิทยากรประจำแหล่งการเรียนรู้อีกด้วย.....

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

- (/) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- () ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (/) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (/) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

- (ระบุ).....-.....
-
-
- () งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
 - () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
 - () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
เพราะ.....
 - () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เพราะ.....
 - () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
(โปรดระบุกิจกรรม).....
เพราะ.....
 - () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ
 - () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรม
ล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
 - () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
 - () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- (ระบุ).....ไม่มี
-
-
-

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....ไม่มี.....
.....
.....
.....

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(.....นายฐิติพล แสงลอย.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาคำนวณการ.....

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการของหน่วยงาน

ควรดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(...นายศิณวงศ์ มาตฤช....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

เห็นควรดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญามาต พิบูลแถว....)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

[illegible]

ลงชื่อ...

(...นายชัยวัฒน์ อภิภูมณากุล...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

[illegible]

ลงชื่อ...

(...นายพจธนศล ธนิกกุล...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. สถานที่ วัดหนองหมี , นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๓. กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดหนองหมี , นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดง
พันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี



ทำกิจกรรมที่วัดหนองหมี่



ทำกิจกรรมที่วัดหนองหมี่





ทำกิจกรรมที่นิวแลนด์



ทำกิจกรรมที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง



ทำกิจกรรมที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน.....

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ....๒๕๖๑-๒๕๖๔.../เพิ่มเติมหน้าที่..๑๔๒... ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่.....๓..... ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองการศึกษา ฯ.....

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่..... ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....ถึง.....๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม..... กองการศึกษา ฯ.....

สรุปรายงานเมื่อ วันที่.....๑๙.....เดือน.....เมษายน..... พ.ศ.๒๕๖๒.....

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ จากประสบการณ์จริง	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก
๒	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคีในการทำกิจกรรมกลุ่ม	/		
๓	เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง	/		
๔	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า	/		
๕	เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และคณะครู	/		

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	จำนวนเด็กระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย
๒	จำนวนผู้บริหารอบต.และเจ้าหน้าที่ของกอง การศึกษาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	/		☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่วัดหนองหมี่ , นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่า
เขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี.....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันที่ดำเนินการ.....๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....

สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้๕๐,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง๒๘,๔๑๕..... บาท

คงเหลือ๒๑,๕๘๕..... บาท

ใช้เกิน.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความคุ้มค่า นักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ณ วัดหนองหมี่ , นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (/) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. จำนวนเด็กระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๘๐ คน)	สรุปจากใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☒ สอบถาม
๒. จำนวนผู้บริหารอบต.และเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๙ คน)	สรุปจากใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	☐ ตรวจสอบ ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สรุปจากแบบประเมินผลโครงการ พบว่า ภาพรวมการจัดโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๗.๒๕	

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพื่อน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และวิทยากรประจำแหล่งการเรียนรู้อีกด้วย.....

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

- (/) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้
- () ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก
- (/) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (/) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

- (ระบุ).....-.....
-
-
- () งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
 - () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
 - () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
เพราะ.....
 - () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เพราะ.....
 - () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
(โปรดระบุกิจกรรม).....
เพราะ.....
 - () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ
 - () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรม
ล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
 - () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
 - () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- (ระบุ).....ไม่มี
-
-
-

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....ไม่มี.....
.....
.....
.....

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(.....นายฐิติพล แสงลอย.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาคำนำถุการ.....

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการของหน่วยงาน

ควรดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(...นายศิววงศ์ มาตฤช....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญามาต พิบูลแถว....)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

Robertas: gipertenzija, šokas

ลงชื่อ...

(...นายชัยวัฒน์ อภิภูมณากุล...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ผู้จัดทำหนังสือ

ลงชื่อ...

(...นายพจจุณศล ธนิกกุล...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคืบ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. สถานที่ วัดหนองหมี , นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๓. กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดหนองหมี , นิวแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศูนย์แสดง
พันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี



ทำกิจกรรมที่วัดหนองหมี่



ทำกิจกรรมที่วัดหนองหมี่





ทำกิจกรรมที่นิวแลนด์



ทำกิจกรรมที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง



ทำกิจกรรมที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของอบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว.....

- ☐ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ...๒๕๖๑-๒๕๖๔.../เพิ่มเติมหน้าที่...๑๔๒... ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่.....๓..... ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองการศึกษา ฯ.....

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่...พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒...และ..พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๒...

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม.....กองการศึกษา ฯ.....

สรุปรายงานเมื่อ วันที่...๒๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.๒๕๖๒.....

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว ๓ แห่ง จำนวน ๑๓๒ คน	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย
๒	นักเรียนในโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน จำนวน ๕๐๐ คน	/		☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
๓				☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ
๔				☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คูบัว ๓ แห่ง และโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน.....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันที่ดำเนินการ.....พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ และ พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๒.....

สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลี่ยงแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้๑,๐๒๑,๓๔๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง๖๕๒,๐๗๓.๖๒.....บาท 954,433.50

คงเหลือ๓๖๙,๒๖๖.๓๘.....บาท (ยอด ณ เดือน ก.ค. ๖๒) 66,966.50

ใช้เกิน.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความคุ้มค่า นักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการเดือนพ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒ และ พ.ค. - ก.ย. ๖๒.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. กองการศึกษาดำเนินการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.คูบัว จำนวน ๓ แห่ง และโรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. จำนวน ๕ แห่ง	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(☒) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (☒) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑.จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามวัยเพิ่มขึ้น	สรุปจากแบบประเมินพัฒนาการเด็ก (ศพด.๐๑ - ๐๒)	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์
๒.จำนวนนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามวัยเพิ่มขึ้น	สรุปจากการสอบถามโรงเรียน	☒ สอบถาม ☐ ตรวจสอบ ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของอบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย.....

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

(☒) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้

() ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก

(☒) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (☒) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว

(☒) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(☒) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ).....ผู้ประกอบการส่งใบส่งของล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด.....

() งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา

() งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน

() ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

() ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

() ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

() กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

(โปรดระบุกิจกรรม).....

เพราะ.....

- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ
- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้เงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรมล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....
.....
.....

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....
.....
.....

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย.....

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(.....นายธิตินันท์ แสงสอย.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาชำนาญการ.....

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการของหน่วยงาน

เห็นควรดำเนินโครงการต่อไป ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรกร

ลงชื่อ.....

(...นางสาวธีรภรณ์ มากสิน...)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ทล.ค./ เพียร อภิวัฒน์ / กรรณีย์ เพื่อ ให้ วัด วัดทองท่าวังทอง ตาม ม. ๖๐ ของ ร. ๖๐๖

ลงชื่อ.....

(...นายคณวัฒน์ มาตฤช....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

- ให้อำเภอปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว....)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

ทล.ค./ อรรถาธิบาย

ลงชื่อ.....

(...นายชัยวัฒน์ อภิธรรมกุล....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทล.ค./ อภิธรรมกุล

ลงชื่อ.....

(...นายพจวนศล ธนิกกุล....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

...../...../.....

หน้าที่ ๖

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของอบต.คูบัว
และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๑ โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
๒. สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คูบัว ทั้ง ๓ แห่ง และโรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. ทั้ง ๔ แห่ง
๓. กิจกรรม การจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ป.๑ ของโรงเรียนประถมสังกัดสพฐ.
๔. เป้าหมาย เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว และเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว.....

- ☐ เป็นโครงการที่สร้างขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ....๒๕๖๑-๒๕๖๔.../เพิ่มเติมหน้าที่...๑๖๕... ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่.....๓..... ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองการศึกษา ฯ.....

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่...พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒...และ..พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๒...

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม.....กองการศึกษา ฯ.....

สรุปรายงานเมื่อ วันที่.....๒๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.๒๕๖๒.....

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ
๒	เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนทุกด้าน	/		☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย /ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	นักเรียนโรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. ๔ โรงเรียน จำนวน ๕๐๐ คน	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย
๒				☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
๓				☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
๔				☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ ☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่โรงเรียนสังกัดสพฐ. ทั้ง ๔ โรงเรียน

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ.....พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ และ พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๒.....

สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลยแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้ ๑,๖๕๒,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง๑,๖๐๐,๐๐๐..... บาท

คงเหลือ๕๒,๐๐๐..... บาท

ใช้เกิน.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ () พอดีกับงบประมาณ

(/) น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความคุ้มค่า นักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการเดือนพ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒ และ พ.ค. - ก.ย. ๖๒.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ - บรรจุโครงการในร่างข้อบัญญัติ / ประกาศใช้ข้อบัญญัติ - โรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแนบบันทึกรายการ - กองการศึกษาจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียน - โรงเรียนจัดโครงการตามแผนฯ - โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการ	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (/) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. อดทนอาหารกลางวันโรงเรียนประถม สังกัดสพฐ. ๕ โรงเรียน	สรุปจากรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน	☒ สังเกต ☐ สัมภาษณ์
๒. จำนวนนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโต ตามวัยเพิ่มขึ้น	สรุปจากการสอบถามโรงเรียนที่ได้รับ เงินอุดหนุน	☒ สอบถาม ☐ ตรวจงาน ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ.....

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

(/) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้

() ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก

(/) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (/) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว

(/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ).....

.....

- () งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญห
- () งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน
- () ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
- เพราะ.....
- () ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- เพราะ.....
- () กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
- (โปรดระบุกิจกรรม).....
- เพราะ.....
- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
- ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ
- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้เงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
- เพราะ.....
- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....

.....

.....

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....

.....

.....

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนสหจ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว ได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ.....

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(.....นายฐิติพล แสงลอย.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาชำนาญการ.....

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการของหน่วยงาน

เห็นชอบเป็นโครงการต่อไป และสนับสนุนให้โรงเรียนเพื่อจัดไว้ให้เด็กอาชีวศึกษา

ลงชื่อ.....

(...นางสาวธีราภรณ์ มากสิน...)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ทราบ/เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ลงชื่อ.....

(...นายคณิศร มาตกุล...)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ความเห็นรองปลัดฯ

- เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญาภา พิบูลแถว...)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

ทราบ/เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ลงชื่อ.....

(...นายชัยวัฒน์ อภิธรรมกุล...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทราบ/เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/ขอข้อมูลเพิ่มเติม


ลงชื่อ.....

(...นายพจวนศล ธนิกกุล...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

หน้าที่ ๖

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

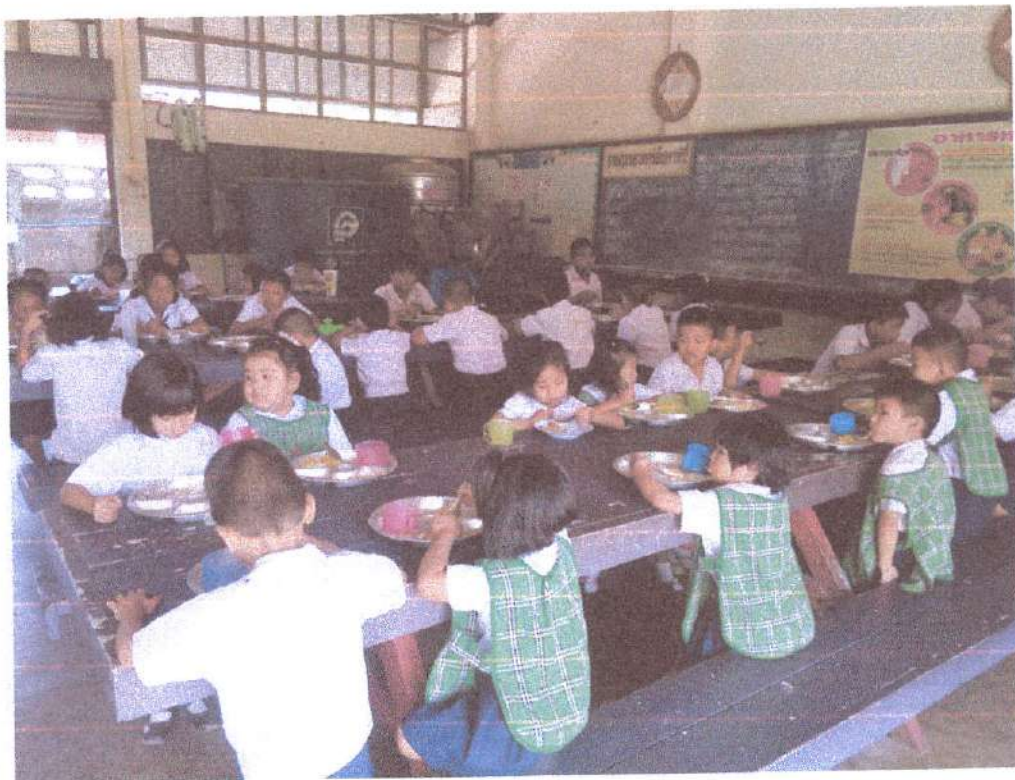

บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
๒. สถานที่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว จำนวน ๔ แห่ง
๓. กิจกรรม การอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว
จำนวน ๔ แห่ง
๔. เป้าหมาย เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว

แบบสรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมตัวเลข หรือข้อความตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑. ชื่อโครงการ / งาน.....โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว.....

- ☐ เป็นโครงการที่ดั่งขึ้นใหม่ ☒ เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
- ☒ มีในแผน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ...๒๕๖๑-๒๕๖๔.../เพิ่มเติมหน้าที่...๑๖๕... ☐ ไม่มีในแผน
- ☒ มีในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด้านที่.....๓..... ☐ มีในแผนชุมชน/หมู่บ้าน
- ☒ โครงการถูกต้องตรงกัน ในยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ อบต.
- ☒ อยู่ในอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ อบต.

กอง/สำนัก กองการศึกษา ฯ.....

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่.....กรกฎาคม.....ถึง.....กันยายน ๒๕๖๒.....

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม.....กองการศึกษา ฯ.....

สรุปรายงานเมื่อ วันที่.....๒๐.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.๒๕๖๒.....

๒. วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการหรือได้รับความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	/		☐ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางรายการ ☒ บรรลุทุกรายการ ☐ บรรลุเกินวัตถุประสงค์ ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการต้องการดำเนินงานต่อเนื่องอีก

๓. เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ของ โครงการ / กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว จำนวน ๔ แห่ง	/		☐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ☒ บรรลุเป้าหมาย ☒ ผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมาย
๒				☐ ผลผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
๓				☒ เป็นไปตามตัวชี้วัดทุกข้อ
๔				☐ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

สรุป ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (/) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. สถานที่โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว จำนวน ๔ แห่ง.....

๑. สถานที่ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

() โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถูกต้องตามที่ประชาคมเสนอ/ตรงกับความต้องการของประชาชน

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕. วันเวลาที่ดำเนินการ.....กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒.....

สรุป () ดำเนินการก่อน (/) ตรงตามแผน () เลยแผนการดำเนินงาน

๖. งบประมาณตั้งไว้๘๐,๐๐๐.....บาท

ใช้จ่ายจริง๘๐,๐๐๐..... บาท

คงเหลือ๐..... บาท

ใช้เกิน.....บาท

สรุป () มากกว่างบประมาณ (/) พอดีกับงบประมาณ

() น้อยกว่างบประมาณ () ใช้เงินอื่นๆเพิ่มเติม ระบุ.....

(/) การใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามโครงการ

() การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องเพราะ.....

(/) ประหยัดคุ้มค่ากับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในโครงการ

(/) เกิดความคุ้มค่า นักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

() เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทางอ้อม

() ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในโครงการ เพราะ.....

๗. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดโครงการวันที่กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒.....

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนกับโรงเรียนพร้อมทั้งให้โรงเรียนส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน	☒ ตามกำหนดโครงการ ☐ ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ
๒. กองการศึกษาจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียน	
๓. โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน	

๗.๑ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

(/) เป็นที่น่าพอใจมาก () เป็นที่น่าพอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๗.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงใด

() มากเกินไป (/) พอดี () น้อยเกินไป

๗.๓ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้ร่วมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๔ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๕ ความร่วมมือในการดำเนินงาน จากผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(☒) ได้รับความร่วมมือดีมาก () ได้รับความร่วมมือพอสมควร () ได้รับความร่วมมือน้อย

๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

() จำนวนมากเกินไป (☒) จำนวนพอดี () จำนวนน้อยเกินไป

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน/ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลโครงการ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	วิธีการประเมินที่วัดได้	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. อุดหนุนกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนประถมสังกัดสพฐ. ๔ โรงเรียน	สรุปจากรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน	☐ สังเกต ☐ สัมภาษณ์ ☐ สอบถาม ☐ ตรวจสอบ ☐ ทดสอบ ☒ เก็บข้อมูล

๙. ภาพรวม

๙.๑ จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการหรือได้รับความรู้จากกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เด็กมีความรู้เพิ่มมากขึ้น.....

๙.๒ สรุปจุดเด่นจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้

(☒) จุดเด่นจากการดำเนินโครงการเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้

() ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำผลงานไปขยายผลการดำเนินงานและจัดทำโครงการต่อเนื่องอีก

(☒) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (☒) มาก () เท่าที่ดำเนินการมาแล้ว () มากกว่าที่ดำเนินการมาแล้ว

(☒) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(☒) ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(ระบุ).....

() งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา

() งาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน

() ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

() ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เพราะ.....

() ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ.....

() กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

(โปรดระบุกิจกรรม).....

เพราะ.....

- () งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่นๆ
- () ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน/โครงการ/กิจกรรมล่าช้าหรือได้ไม่ครบตามที่จ่ายจริง
- () เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม(โปรดระบุ)
เพราะ.....
- () อื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ.....

๙.๔ จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....
.....
.....

๙.๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

(ระบุ).....
.....
.....

๑๐. สรุปโครงการนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว

(/) ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ....โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการ หรือได้รับความรู้จากกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เด็กมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย.....

() ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป

เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(.....นายฐิติพล แสงลอย.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษานำนาฏการ.....

ผู้รายงาน / ผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการของหน่วยงาน

เห็นควรดำเนินโครงการต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวธีราภรณ์ มากสิน...)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ทรงยศ/ เสนอความเห็นโดยครั้น คณะผู้บริหารโรงเรียน

ลงชื่อ.....

(...นายสินวงศ์ มาตเกษ....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ความเห็นรองปลัด ฯ

ศิริโชค/ เสนอความเห็นโดยครั้น คณะผู้บริหารโรงเรียน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวชญาภาศ พิบูลแถว....)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนงาน

ทรงยศ/ เสนอความเห็นโดยครั้น คณะผู้บริหารโรงเรียน

ลงชื่อ.....

(...นายชัยวัฒน์ อภิธรรมากุล....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความคิดเห็นและการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทรงยศ/ เสนอความเห็นโดยครั้น คณะผู้บริหารโรงเรียน

ลงชื่อ.....

(...นายพจวนศล ธนิกกุล....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

หน้าที่ ๖

ภาพถ่ายผลการดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บรรยายภาพ

๑. วันที่ดำเนินการ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒
๒. สถานที่ โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว จำนวน ๔ แห่ง
๓. กิจกรรม อุทฺทหนุณกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลคูบัว
๔. เป้าหมาย เด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ในเขตตำบลคูบัว

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (อาคารหลังเก่า)
(ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.คูบัว) เรื่องการประชุมในวาระเดียวกัน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ภาพการประชุมสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (อาคารหลังเก่า)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

